ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ညောင်ပင်သာကျေးရွာ၊ ဆတ္ထိုးကြီးကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၂၀ ခုနှစ်

CamScanner


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းမ ာ်ပုံများ
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-စ-၁)
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-စ-၂)
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-စ-၃)
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)
၁၂	ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၀။ ပြုစုနည်းပြပုံ

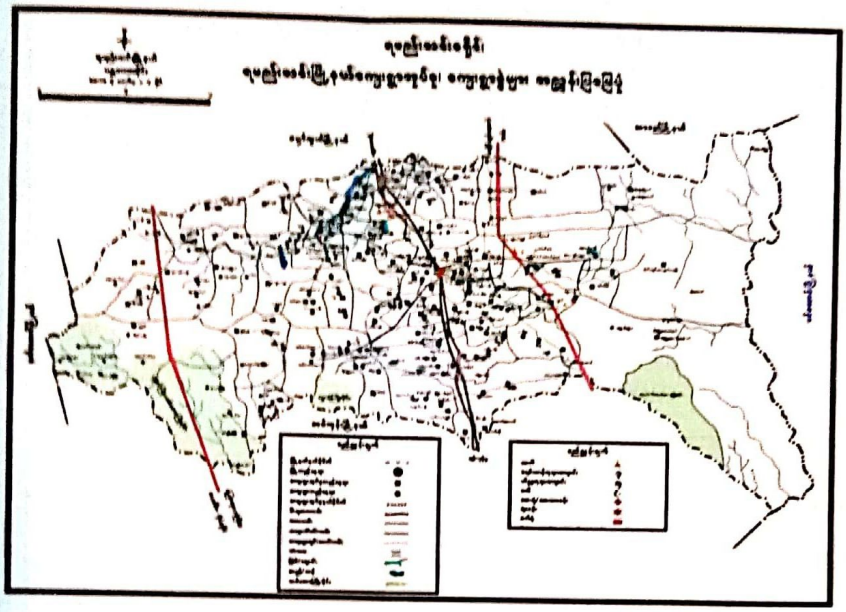

၂။ကျေးရွာအုပ်စုပြပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ

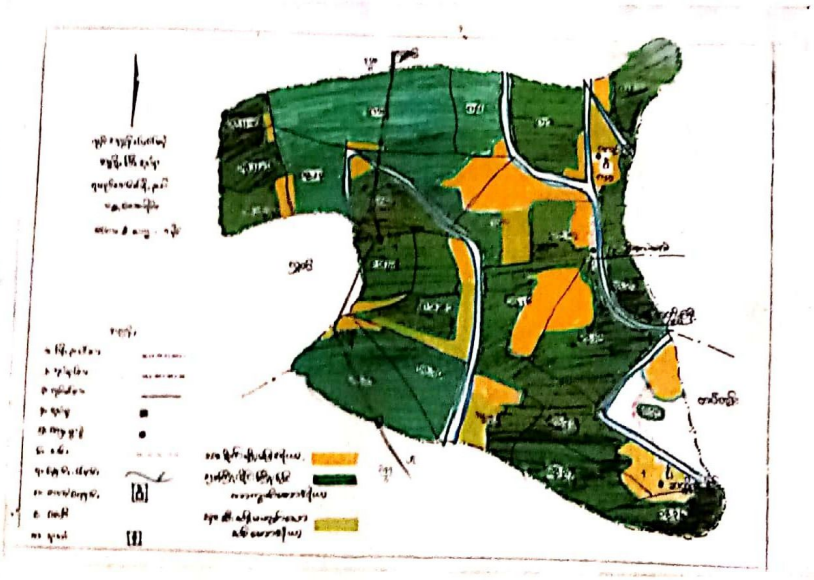

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ဆတ္ထိုးကြီး	ဆတ္ထိုးကြီး	
၂		ဆတ္ထိုးပေါက်	
၃		ညောင်ပင်သာ	
၄		ဇလုပ်ကြီး	
၅		အောင်ချမ်းသာ	
၆		မြိုင်သာယာ	
၇		ရုံးတော	
၈		ကျောက်ချော	
၉		ရွှေမေတ္တာ	
၁၀		ရွှေနတ်တောင်	
၁၁		အေးရိပ်မြိုင်	
၁၂		အေးချမ်းသာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၃၀၀	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၁၄၃၉	ကျား-၇၁၄၊ မ-၇၂၅
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ပန်းရံ၊ စက်ပြင်ဆရာ၊ ဆရာ/ဆရာမများ။	
၅	ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေအနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရယ်	မရှိ	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၄.၄.၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၁	၉	၂၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအနေ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊သစ်တောများ၊ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၄.၄.၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀	၁၀	၂၀	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်ဂုဆင့်တွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၄.၄.၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၀	၂၅	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၄.၄.၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃၀	၃၀	၆၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၄.၄.၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၅	၃၀	ရာသီဥတု၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဝင်းကားချပ်	၂၀၀၇.၀၄.၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၄	၁၄	၂၈	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော်ရွာအတွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖေါ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ဖေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၀၀၇.၀၄.၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၆	၁၀၀	၁၅၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင်ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖေါ်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၀၀၇.၀၄.၁၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၅၆	၁၀၀	၁၅၆	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖေါ်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၀၀၇.၀၄.၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၆	၁၀၀	၁၅၆	ဖေါ်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ













♥ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (CDC) ♥

ကျေးရွာ ~ ညောင်ပင်သာ　　မြို့နယ် ~ ရေမြည်းသင်း

အုပ်စု ~ ဆက္ကိုးကြီး　　တာဝန်ခံရစ်ကော်ဝန်း

စဉ်	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ကျေးရွာစီ/ထောက်ခံကွင်း	ဦးမျိုးဇော်	09-256017762
၂။	ကျေးရွာစီ/ထောက်ခံကွင်း	မေါ်ဥမ္မာသင်း	—
၃။	ဆောနာဝန်ထမ်း	ဦးကြည်မြင့်	—
၄။	ဆောနာဝန်ထမ်း	မေါ်ဆုံးကြည်	09-250912850
၅။	ဝယ်ယူရေး ခွဲကွင်း	ဦးသန်းနိုင်	09-445784668
၆။	ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ဝင်	မေါ်ဝင်းဖြိန်	09-265988416
၇။	ဝယ်ယူရေး (မှတ်တမ်း)	မေါ်တင်ဆန်း	—
၈။	သည်ပတ်တန်းသိမ်းရေး	ဦးဝင်းမျိုး	09-44678B121
၉။	သည်ပတ်တိန်းသိမ်းရေး	မေါ်တင်လှိုင်	—
၁၀။	အောက်ကြည့်ကြိုးကြပ်ရေး	ဦးမောင်မြင့်	09-45903226
၁၁။	အောင့်ကြည့်ကြိုးကြပ်ရေး	မေါ်ခင်ဝင်း	—
၁၂။	စောင့်ကြည့်ကြိုးကြပ်ရေး	မေါ်မြင့်မာဦ	09-401148067
၁၃။	ဝေယန်အကြံပြု	ဦးစံသိန်း	09-45908241
၁၄။	ဝေစန်အကြံပြု	မေါ်မာမာမော	09-258589341
၁၅။	ကျေးရွာဈေးစာရင်းကိုင်	ဦးကျော်ဝင်းအောင်	09-426878364

ကျား-၇ ၊ မ-၈ (၁၅ဦး)

ကျောင်းသား - ညောင်ပင်ပဝိသာ ဖြို့နယ် - ရေမည်းသင်း

အုပ်စု - ဆယ်တိုင်းကြီး ရက်စွဲ - 5.11.2019

လူမှုရေး အကြောင်းအရာ ပြဿနာ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း

- ခိုက်ပျိုးရေး ကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။
- အိပ်မက်များကို ဆောင်ကွဉ်း တောင်တန်း များ နှင့်ကာရံထား သည်။
- လယ်ယာစပြ များကို မိုးရာသွင်း ပဲ သီးနှံ ခိုက်ပျိုးကြသည်။
- လယ်ယာစပြ များသည် တောင်ကွဉ်း၊ တောင်တန်း ပေါ်တွင် ရှိသော ကြောင့် ခိုက်ပျိုးရသည် မှာ အဆင်မပြေ။
- ထင်ရှေးရှိကြောင်း ထောထဲသို့ သွားကျ ထင်းခုတ်ရသည်။ တစ်ချို့မှာ တစ်ခြားနေရာ သို့ သွားကြောက် လုပ်ကိုင်နေကြသည်။

အဖြေရှာပုံ

- ခိုက်ပျိုး သီးနှံ အဆင်မပြေ သောကြောင့် ထင်ရှေးရာ၊ ပါး၊ ချို ဖီသား စု အားထက်နေရေး အဆင်မပြေ ကြောင်း ဆွေးနွေးရသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးညွှန့်ထင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၁) ၊ မ (၉)

လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းမြို့နယ်

ဥစ္စာခန့်ကြေးပမာဏပုံစံပြဇယား

ဇယားရွာ- ဘုတ်ပင်ကြီး ၊ ဇယားရွာအုပ်စု- ကြီးကြီး ရက်စွဲ ၅-၁၁-၁၅

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်ရည်ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ လယ်ရေ>၁၀၀၊ အသားတင် ဘဏ္ဍာရေးအကျုံးဝင်ငွေ ၊ ပဿ<၈>၀၀၀	၂၀	၇%
အလယ်အလတ်	ကွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်<၃>၀၀၊ ပဿ<၃>၀၀၀ ၊ အလယ်တန်းဘဏ္ဍာရေးအကျုံးဝင်ငွေ	၁၀၀	၃၃%
ဆင်းရဲ	လက်လုပ်လက်စားများ ၊ ဝက်၊ ကြက်မွေးမြူရေး ယူလတ်နှင့် အထိခေတ္တဘဏ္ဍာရေးအကျုံးဝင်ငွေ	၁၆၀	၁၃%
ခိုင်ကိုးရာဖဲ့	စားဝတ်နေရေး အလက်အခဲ၊ အရေးကြီးမှုများ ရှိ	၂၀	၇%
စုစုပေါင်း		၃၀၀	၁၀၀%

ဆွေးနွေးသူ- ဦးကျော်ထင်းအောင်

ကျား<၁၀>ဦး၊ မ<၁၀>ဦး

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ချက်

ပြောင်ပင်သာကျေးရွာ
ဆက္ကိုးကြီးအုပ်စု

ဂမုဒ်းသင်းမြို့နယ်
5.11.2019


အွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

* ကျေးရွာတွင်ဝိုက်ပျို့ရေး ၊ တောင်သူလုပ်ငန်းဖြင့်သာ အဓိက မွေးမြူးကြောင်းပြုနေကြသည်။ တောင်ကုန်း၊ တောစောင်းများတွင် လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ ဝိုက်ပျို့ရေးအတွက် ရေးငွေများဖြစ်ပြီး ရာသီအလိုက် ရေးနှုန်းများ ကွာခြားနေရသည်။ နေမကောင်းဖြစ်ပါက တခြားနေရာများသို့ သွားရောက်ကုသနေကြရသည်။ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မမျှတသော ကြောင့် တိုးတက်မှုသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြရသည်။

အကျဉ်းချုပ်

ကျေးရွာတွင် အလယ်အလတ်တန်း လူဦးရေ ၊ အိမ်ထောင်စု များပြားပြီး ချမ်းသာသောသူနှင့် ဦးကို့ရာမဲ့ အိမ်ထောင်စု တန်းတူရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု မှာ ပိုမို များပြား ပြီး တခြားဒေသသို့ ဒီးပွားထွက်ခွာခြင်းဖြင့် မိသားစု စားဝတ် နေရေးကို ရပ်တည်ရပါသည်။

ဦးသောင်အွေးနွေးသူ ~ ဦးကျော်ဝင်းဖောင်
ပါဝင်အွေးနွေးသူ ~ ကျား(၁၀)ဦး ၊ မ(၁၀)ဦး

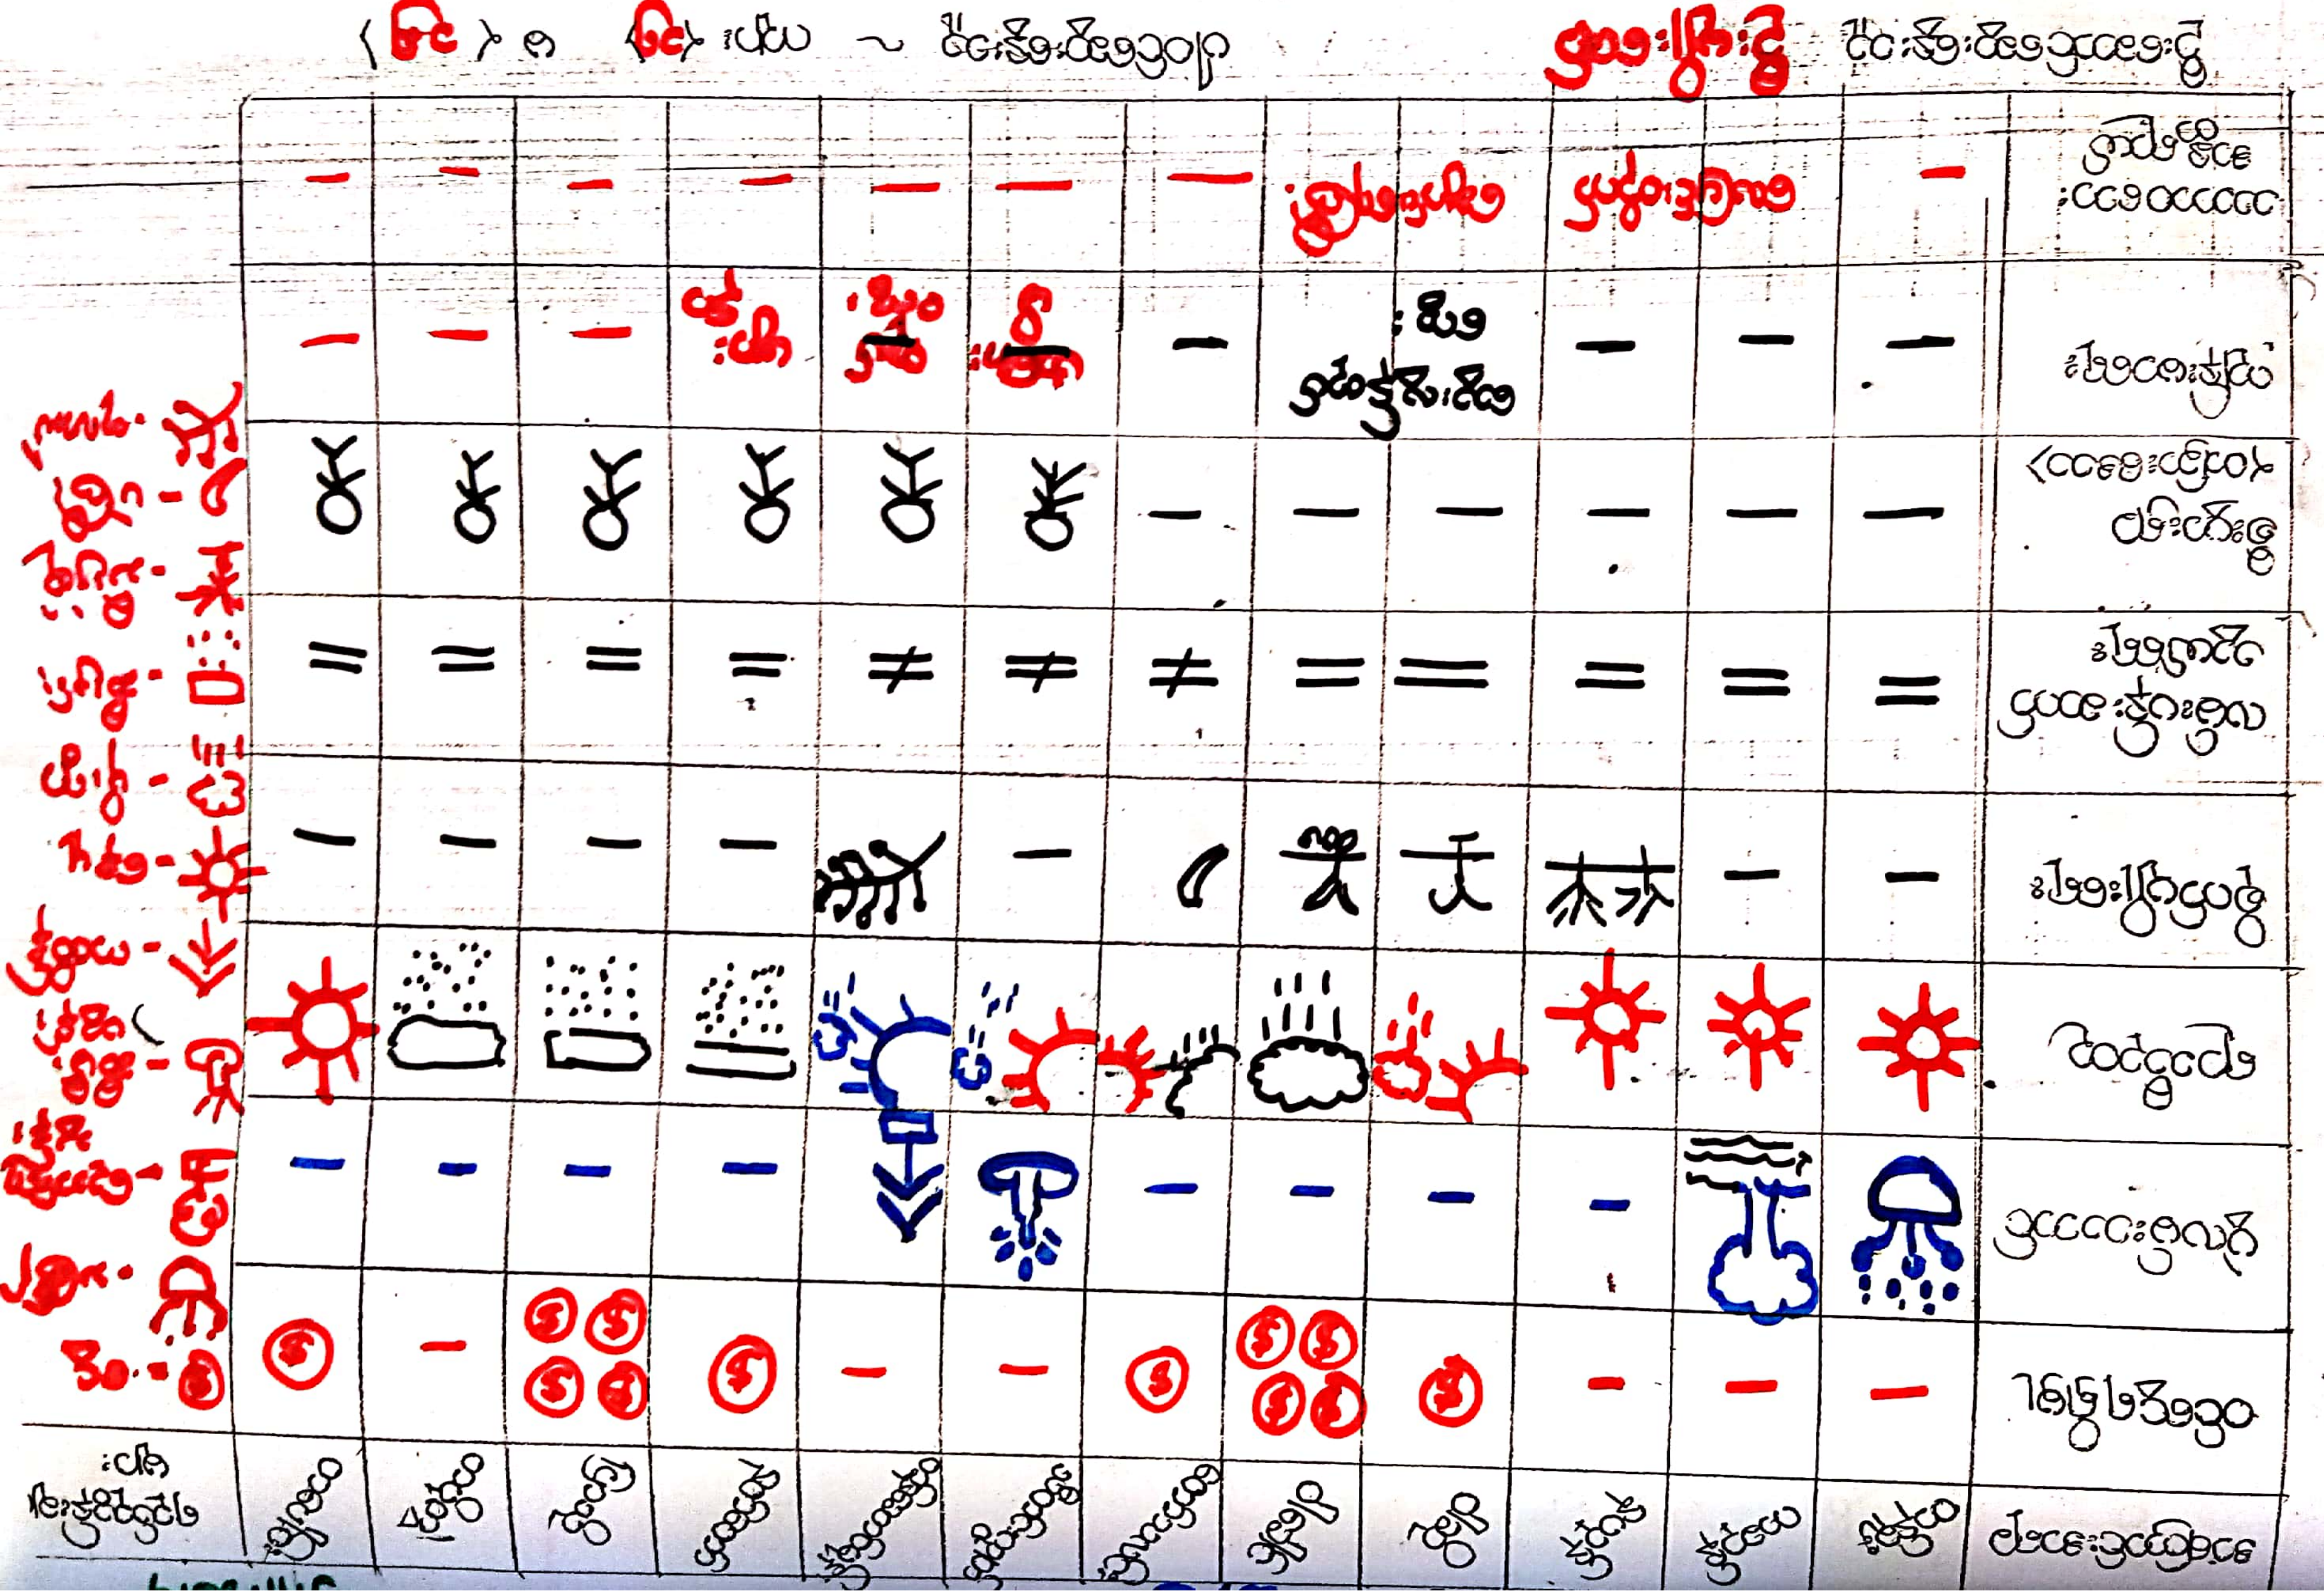

ရာသီဥတုပြ ပြကျမ်းနိုင်

ညောင်ပင်သာကျေးရွာ
ဆတ်ထိုး၊ကြီး၊ဟုပ်စု

ရမည်း၊သင်းမြို့၊နယ်
5.11.2015.

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်

- ဝါဆို ၊နှလုံတောင်တွင် ဝင်ရွေ့မှာ အသင့်စာရင်းရှိပြီး၊ ဝါခေါင်လတွင် ဝင်ရွေ့ စပါများပြီး၊ တပေါင်း ၊ တော်သလင်း တွင် ဝင်ရွေ့နှုန်းပြီး၊ ကျန်လတွင် ဝင်ရွေ့ မရှိပါ။

- နယုန် ၊ဝါခေါင် ၊နတ်တော် ၊တပို့တွဲ ရာသီမှဲ့ မရှိပါ ။ ကျန်လများတွင် ရှိပါသည်။

- သီတင်း၊ကျွတ်နောက်ပိုင်းတွင် တခြား၊ဒေသများကို အလုပ်သွား ရောက် ကြာမွေ့ကြရပါသည်။

- တပို့တွဲ ၊တပေါင်း၊ တန်ဆိုး ၊ကဆုန် ၊နယုန် ၊ရေစွာပါး ၊ ရေလယ်သောက် ရသည်။

- ဝါဆို ၊ဝါခေါင် ၊သီတင်းကျွတ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဆိုးပါသည်။

- ရာသီဥတုမှာ မုံမှုန်ရှိပါသည်။

- တန်ဆိုး၊ကဆုန် ၊နယုန်၊ဝါဆို လများတွင် တခါတရံ လေပြင်းတိုက်ခတ် မှုရှိပါသည်။

- ရာသီစွင် ဖြစ်လျှင် သီးနှံဆိုက်ဖျိုးကြပါသည်။ ကျန်လများတွင် ဆိုက်ဖျိုးလို့မရပါ။

အနှစ်ချုပ်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ညံ့၊ ဆိုက်ဖျိုးရေး အားသန်မြဲမြံ

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ~ ဦးမျိုးကော်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ~ ကဗျာဦး ၊ မဗျာဦး

ကျေးဇူး - ဒေါ်ငြိမ်းမာ


အုပ်ရေ - အင်္ဂလိပ်ဘာသာ

အပြီးသတ်ပေးသည့်သင်း

ရက်စွဲ 5.11.19

ပင်ကုန်အိမ်သုံးသပ်ခြင်း

<အာမလိုးသားအတွဲ>

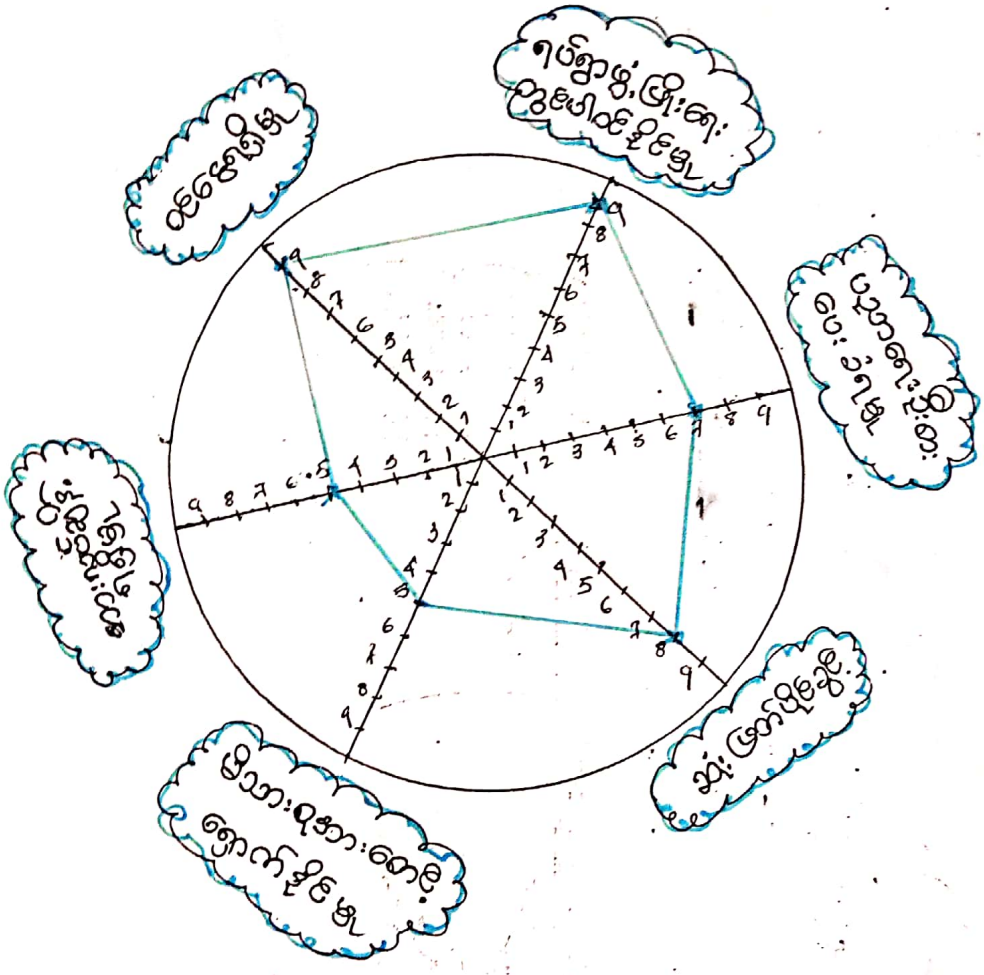

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမောင်ဖြူ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၅၀ မ ၁၆

ကျေးဇူး - ပြောပေးသော


အဖွဲ့ - အတွဲကြီး

ဖြစ်နေသည့်ရေသွားသင်း

ရက်စွဲ - 5.11.14

ပုဒ်ကူးအဓိပ္ပါယ်သုံးသပ်ခြင်း

< အမျိုးသမီးအဖွဲ့ >

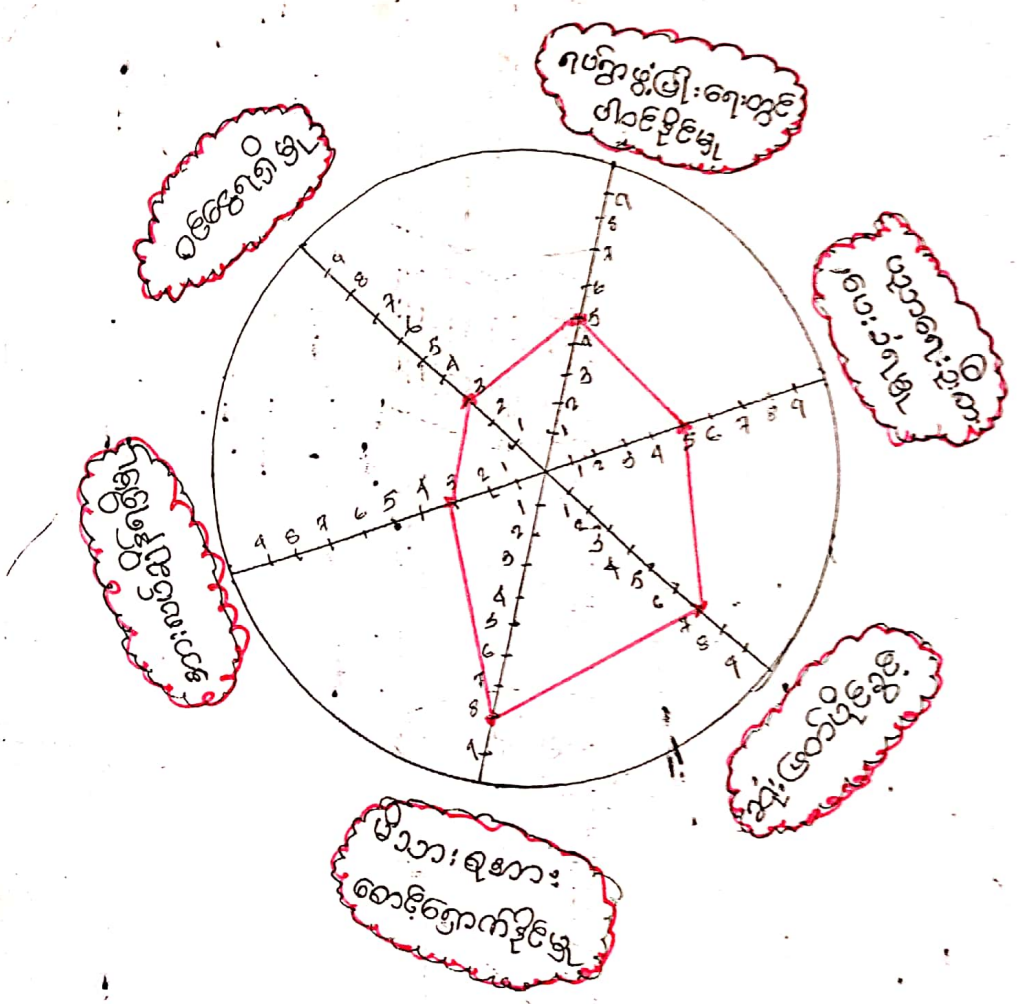

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဖေရှိဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား< >၁၈< ၅၀ >ဦး

ကျေးရွာ - ဆောင်ပင်သာ


အုပ်စု - အမျိုးကြီး

ဖြန့်ဝေသည့် ရက်စွဲ - 5.11.2019

ရက်စွဲ - 5.11.2019

ပဉ္စကဏ္ဍအကဲဖြတ်သုံးသပ်ချက်

(အကျိုးသက်ရောက်မှု + အကျိုးသင့်အမှု)

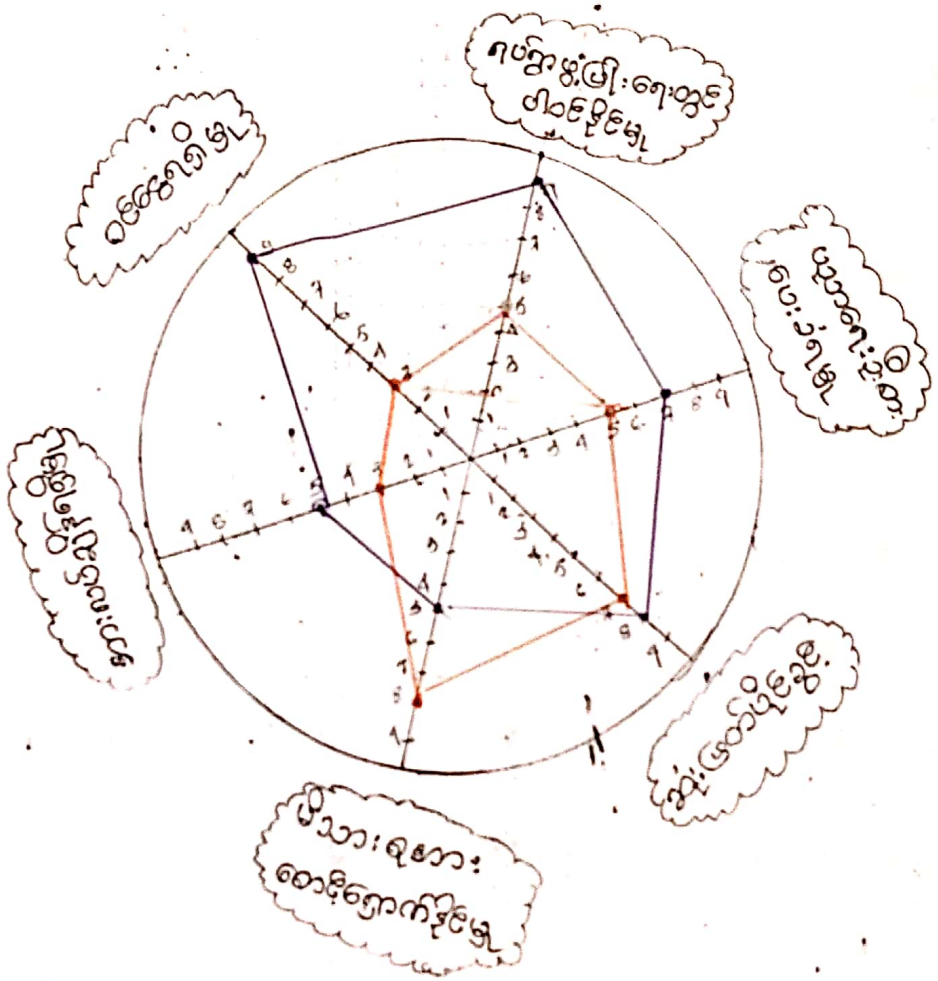

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမောင်မြင့်ဆေးရိုးတန်

ဖါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၀ + ၅၀ + ၆၀)

ကျောင်း - သောကိုယဉ်သာ ဖြို့နယ် - ပုပ္ပဲလျှံ:သစ်:

အုပ်စု - အဆို/ပါကြီး: ရက်စွဲ - 5.11.2019

ပင်ကို အိမ်သုံး သပ်ခြင်း:

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် အကျဉ်းချုပ်ခြင်း:

~ အယျိ: သား:မျက်:သည် စား:တော်ရေး ချေ: အတွက် ငှက်ဖွေ ရဲ့ ရေသောက်ကြောင့်
သီသာ:စွာ: စောင့် ကျောက် နိုင်ပြု ကား:နှင့်: ခေါ်ကြောင်: ဆို.ရ ပါသည်။

~ အယျိ: သမီ: မျက်:သည် အလုပ် အကိုင် နှင့်သ်: ပါ: ချိ သီသာ:စွာ ကား:
စောင့် ကျောက် နိုင်ပြု ပို မျက်: ။

~ အယျိ: သား:မျက်: က အုံ:ကြတ်ပိုင် ခွင့် ပို မျက်: ။

အကျဉ်းချုပ်

~ အယျိ: သား:မျက်: သည် ကိုယ်ခွေ ရဲ့ ခို ချေ: အတွက် တခြား: ရေ သည် သို့
လုပ် ကိုင်ရဲ့ ရေသောကြောင့် သီသာ:စွာ ကား: ပ စောင့် ကျောက် နိုင် ။

ပါတ်ဆွေးနွေး သူ ~ ဦး:ညွှတ်.တင်:

ဦး:စောင်းဆွေး:နွေး သူ ~ ဦး:ညွှတ်.တင်:

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ရမည်းသင်းမြို့နယ်

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ- ________ ရေသာတောင်ဘာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု- ________ ရက်စွဲ- 5.11.19

...ရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြပုံစံ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံစံ





...ကျွဲ	[illegible]အဖွဲ့	စာသင်ကျောင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း လယ်ယာ သောက်ရေကန် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	လယ်ယာ ဘုန်းကြီးကျောင်း သောက်ရေကန်	စာသင်ကျောင်း [illegible]အဖွဲ့	ကျေးလက် ဆေးပေးခန်း

...ဆွေးနွေးသူ- ဦးစိန်သန်းလွင်

...သူများ- ဘ(၁၂)ဦး ၊ မ(၈)ဦး

ကျောင်းသား - ညွှန်ကြားမှုတက်သော
အမည် - ဆက်ဆံရေးကြီး

ပြီးဆုံးသည့် ရက်စွဲ ~ 5.11.2019

မိုင်အိုင်းယုံ သုံးသပ်ခြင်း

အွန်းဆွေးခြင်း နှင့် ဆက်ဆံခြင်း

- လယ်ယာရေးပြဿနာ ၊ ကုန်းကြီးကျောင်း ၊ အသင်းကျောင်းတို့ကို အယူအသိ/အယူသမိုင်း တန်းတူ အသုံးပြုကြသည်။
- အယူအသိများသည် ကုန်းကြီး ကျောင်း ၊ အသင်းကျောင်းတို့ကို ခိုးဆောင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
- ကျွဲ ၊ နွား ၊ ရေတွင်း ၊ ရေကန် စသည်တို့ကို ကျား-ယ တန်းတူ ထိန်းသိမ်းထားသည်။

အနှစ်ချုပ်

- အယူအသိများသည် အယူအသိမှားထက် ကိန်းအား လုံးတွင် ခိုးဆောင်ပါဝင်နှုန်းကြသည်။

ခိုးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ~ ဒေါ်ဟဒုံ


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၈-၄၁၅ > ၁၄ ၄ ၁၀ >

ဗဒင်းပုံစံ

ကျေးဇူး ~ မေမေကျေးဇူးကြီး


အုပ်စု ~ နွားကွေးကြိုး

ဂဟေဆည်းဘင်းမြို့နယ်

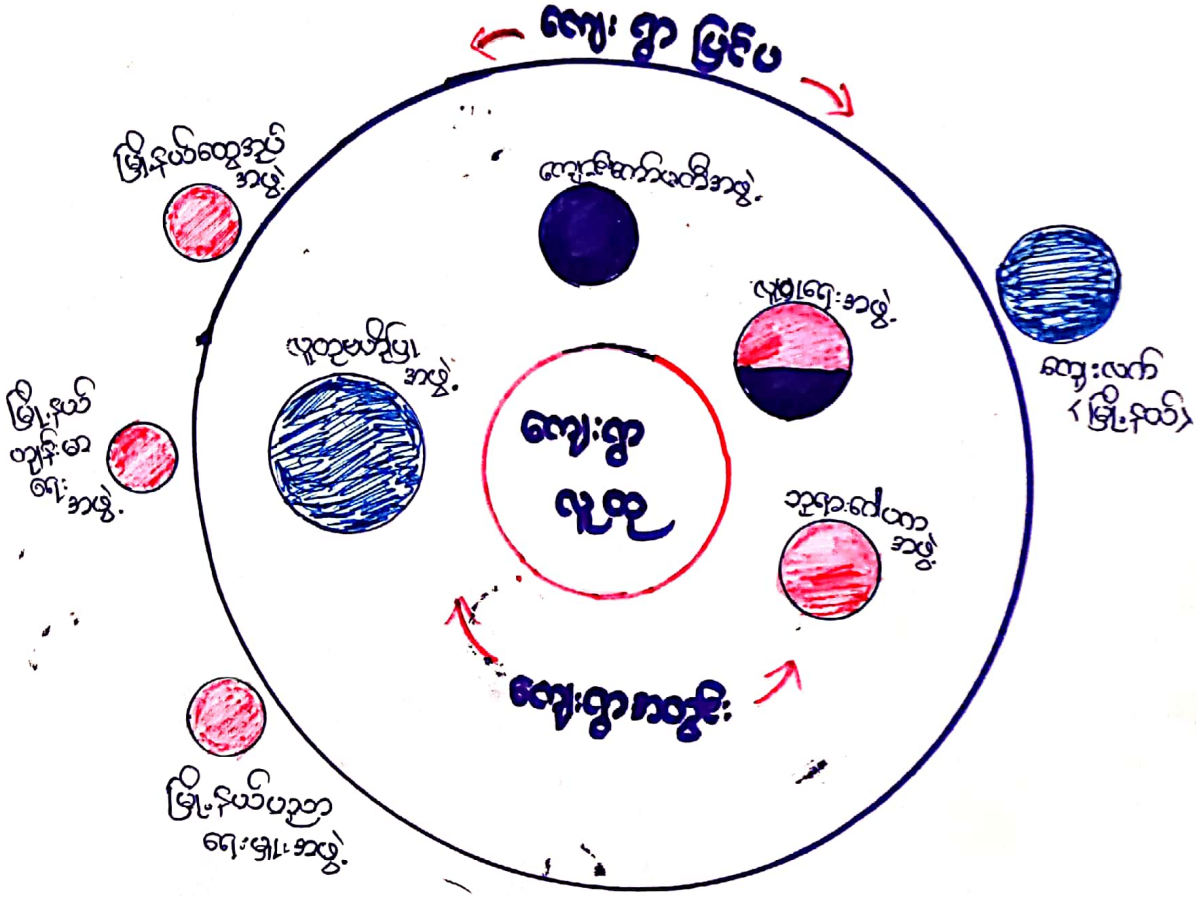

[illegible]

[illegible]

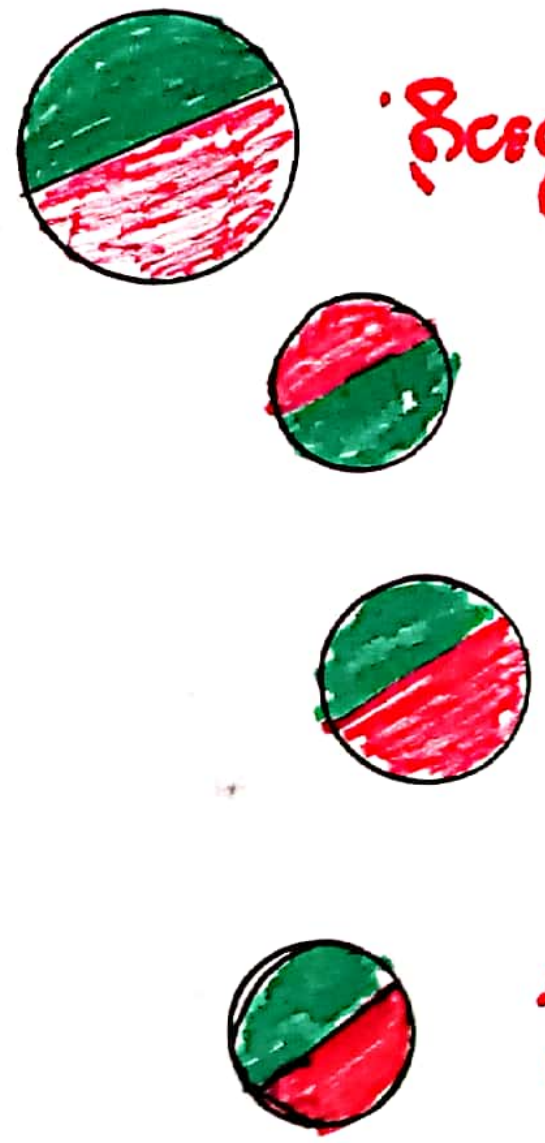


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ပြောင်းပြန်

ညောင်ပင်သာကျေးရွာ
ဆက်သွယ်ရေးကြိုးဝိုင်စု

ရုပသည်းသင်းမြို့နယ်
5.11.2019

ကျေးရွာခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

* ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများစွာရှိပါသည်။
* အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၊ ရွာအိမ်မှူး ၊ ဆယ်အိမ်မှူး ၊ နာယကအဖွဲ့ ၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ စသည့် အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အရိုးအာခံများဖွေ့ ဦးဆောင်ကူညီကြသည်။
* မီးကင်းအဖွဲ့ ၊ ပရဟိတ စသည့်အဖွဲ့များကလည်း ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို တတ်နိုင်သမျှ ဖြည့်စည်းပေးကြသည်။
* ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများအဲ့မှ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့သည် တစ်လတစ်ကြိမ် လိုအပ်သည်များကို ကူညီပေးသည်။

အနှစ်ချုပ်

* တစ်ရွာလုံးရှိ အဖွဲ့ဝင်/သမီးအားလုံးသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအလှူက် ကျရာနေရာမှ တာဝန်သိစွာဆောင်နေကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ~ ကျား ၁၄ ဦး၊ မ ၁၄ ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ~ မေသဝင်းသင်း

လေ့ကျင့်ခန်း - ကြားဆွေးနွေးတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

ဥပမာ - သင်သာကျေးရွာ
ဆည်ဖို့ကြီးအုပ်စု

5.11.2019
စတင်သွန်သင်ပို့ချခန်း

မျှော်မှန်းချက်များ	ကျား - မ ဆွေးနွေး တင်ပြသူ
* ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာမည်။	ကျား + မ
* သောက်သုံးရေ ပေါများလာမည်။	ကျား + မ
* ကျန်မာရေးဘဏ်လုံခြုံစိတ်ချလာမည်။	ကျား + မ
* လေ့ကျင့်ခန်းတွေ့ မဟာသုတများ၊ တိုးပွားလာမည်။	ကျား + မ
* လျှပ်စစ်မီးရှိလာပါက လူငယ်မျှ အဆင်တန်း မြင့်မားလာမည်။	ကျား + မ
* အသက်အရွယ်၊ဝမ်းကြောင်း ထင်တန်းများရှိလာပါက ထင်ဖွေများ ပိုမိုရှိလာမည်။	ကျား + မ

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ~ ဦးဝင်းချို / ဒေါ်မြင့်မာဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ~ ကျား ၄ ဦး (၃၀) ဦး ၊ မ (၃၅) ဦး

ကျေးဇူးတွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူး - ရောင်ပေါင်းသော ဖြိုးသည် - ဂုဏ်ပြုခြင်းသင်္ကေတ

ကုသိုလ် - အကျိုးကြီး ဂုဏ်ဖွဲ့ -

ပြီးစားရေးအတွက် ဘို့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကို ဖြည့်သူ

၁ ဘုရားတွင်းကွင်းကုစ်လမ်းသင်းဖြင်း (၇၀၀'x၁၄'x၆") ကျား + ဖ

၂ ဘုရားကြီးဂိုလ်လမ်းသို့ ဂိုတာသင်းဖြင်း (ပမိုင် ၄ တာရှည် x ၁၂'x ၉") ကျား + ဖ

၃ မှာဇာသိဆေးရေးစိုးပွားလမ်းတောက်လှပ်ဖြင်း ကျား + ဖ

(ပမိုင် x ၁၂'x ၉") ဖြစ် ၁'ဖြင်း ၉"

၄ ဆေးရေးစိုးဆောက်လုပ်ဖြင်း (၂၀'x ၄၀'x ၁၂') ကျား + ဖ

၅ စက်ချုပ်သင်တန်းများ ကျား + ဖ

ပြောင်းပြင်ယာ

အမျိုးသားများ

အခက်အခဲ ပြဿနာများ	မျှော်မှန်းချက်များ	ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ
- ရိုး ရွာသို့ဝင် လမ်းများ ပျက်စီးသဖြင့် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း	- ရွာသို့ ချောမွေ့စွာ သွားလာနိုင်စေရန်	- အုတ်ကျောက်ခင်း လမ်းခင်းခြင်း
- ရိုး ရွာသို့ ကျေးရွာလမ်းများသည် ညံ့ဖျင်းသောကြောင့် ထုတ်ကုန်များ တင်ပို့ရာတွင် ခက်ခဲ ကြန့်ကြာခြင်း	- ကျေးရွာ၏ ထုတ်ကုန်များအား တစ်နှစ်ပတ်လုံး တင်ပို့ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ တင်ပို့နိုင်စေရန်	- ကတ္တရာခင်းခြင်း
- သွားလာရေးအတွက် လမ်းများ မကောင်းသဖြင့် ကျန်းမာရေး ဖြစ်သောအခါ ဆွယ်ကုသ မကုသနိုင်ခြင်း	- သွားလာရန် လွယ်ကူ၍ ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပေါ်ပါက သက်ဆိုင်သော နေရာများ အဆင်ပြေလာစေရန်	- ဆေးပေးခန်းသွား လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း
- ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း မရှိသည့်အတွက် လူနာများ၊ ဆောင်ရွက်ရန် သိသာစွာ ခက်ခဲခြင်း	- ရွာတွင်း ဆေးပေးခန်း ရှိပါက ကျန်းမာရေး ကုသနိုင်စေရန်	- ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း
- အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင် အားလပ်ခြင်း ၊ ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း	- အမျိုးသမီးများ စက်ချုပ်သင်တန်းပေးခြင်းဖြင့် မိသားစုဝင်ငွေ တိုးပွားလာစေရန်	- စက်ချုပ်သင်တန်း

ရေသာင်ပြင်သာ

အမျိုးသမီးများ

အခက်အခဲ ပြဿနာများ	မျှော်မှန်းချက်များ	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ
- မိုးရာသီတွင် လမ်းများပျက်စီး၍ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	- ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်စေရန်	- ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်း
- မိုးရာသီ၌ ကျေးရွာလမ်းများသည် ရွံ့ဗွက်များ ပေါ်သောကြောင့် ထုတ်ကုန်များ တင်ပို့ရာတွင် မျှော်မှန်း နှေးကြန့်ကြာခြင်း	- ကျေးရွာမှ ထုတ်ကုန်များအား တစ်နှစ်ပတ်လုံး တင်ပို့ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ တင်ပို့နိုင်စေရန်	- ဂိုဓာခင်းခြင်း
- သွားလာရေးအတွက် လမ်းများ မကောင်း၍ ကျန်းမာရေး အရေးဖြစ်သောအခါ ဆေးကုသရာ မရောက်နိုင်ခြင်း	- သွားလာရန် လွယ်ကူ၍ ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပတ်သက်သော ကိစ္စများ အဆင်ပြေလာစေရန်	- ဆေးပေးခန်းသွားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း
- ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း မရှိသည့်အတွက် ကုသမှု၊ စောင့်ရှောက်မှု၊ အသိပညာ လောက်မှု နည်းပါးခြင်း	- ရွာတွင်း ဆေးပေးခန်း ရှိပါက ကျန်းမာရေး ကုသနိုင်စေရန်	- ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း
- အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင် အားနည်းခြင်း၊ ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း	- အမျိုးသမီးများ စက်ချုပ်သင်တန်းပေးခြင်းဖြင့် မိသားစုဝင်ငွေ တိုးပွားလာစေရန်	- စက်ချုပ်သင်တန်း

ပထမဒုတိယတန်းကျောင်းသားများအတွက်

အာဆည်းအားဝေးပြိုင်ပွဲ

(စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်)

ကျောင်း ~ ညောင်ပင်သာ

မြို့နယ် ~ ရေစည်းဝင်း

ရက်စွဲ ~ 5.11.2019

အာဆည်းအားဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက် ~ ကျား (၅၅) ဦး ၊ မ (၆၃) ဦး

ပထမဆုံးမေးခွန်း ။ ။ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း ၊ စိမ်ကိန်းစကဒ်နှင့် စိမ်ကိန်းတွဲက
ဘယ်လို တာဝန်ရှိသူများအကြောင်း အားလုံးသိရှိစေရန်နှင့်
ယူမှုရေး ဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်းမှ ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
ရေးဆွဲတတ်စေရန်။

ဒုတိယမေးခွန်းခွဲ (၁) ။ ။ ဆားရွာခေါင်းဆောင်တစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားဖြင့်ကြားဖြတ်
ယူဘုတ္တစည်းရုံးရေးမှူးမှ ယူဘုမဟိုပြုစိမ်ကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်
ခြင်းပြုပါသည်။ စိမ်ကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်
(၁၅) ချက်နှင့် စိမ်ကိန်းစကဒ်နှင့် အကြောင်းကိုအား ခြင်းပြုပါသည်။
မိတ်ဆက်ခြင်းတွင် စိမ်ကိန်းဘည် ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ ၊ ဒေဖန်
အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေခြင်းရေးစနစ် ၊ ဆက်ဆက်ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊
ရံပုံငွေ စီးဆင်းပုံများ ၊ ပြုပြင်တိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အကောအကွယ်များ
စသည်တို့ ပါဝင်ကြောင်း ခြင်းလင်းရှင်းပြကြားသည်။ စိမ်ကိန်းလုပ်ငန်း
ခွဲများအား ယူဘုကိုယ်တိုင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်
ချမှတ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်၍ အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်ရသော စိမ်ကိန်းဖြစ်ကြောင်း ၊ အများပဆောတူဆန္ဒ
ဖြင့် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ခြင်းလင်းရှင်းပြကြား
ပါသည်။

...ဆွေးနွေးချက် ‹၂› ။ ။ ကျေးရွာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးချယ်မှုတွင် အခက်အခဲများအား ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

...ဖြတ်ချက် ။ ။ ကျေးရွာလူထုအားလုံးသည် အများသဘောတူဆန္ဒဖြင့်သာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြပြီး အများသဘောတူဆန္ဒဖြင့် ဦး[illegible] ကြည်မြင့်နှင့် ဒေါ်ဆုံးကြည် တို့အား စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြသည်။

...သဘောတူညီချက် ။ ။ အများသဘောတူ ဆန္ဒဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်မှုအား ကျေးရွာလူထုများမှ သဘောတူညီကြသည်။

...ဆုံးချက် ‹၃› ။ ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲသတ်မှတ်ရန် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၆) ခုအား အဖွဲ့ဖွဲ့၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ဥဿဘာဒအုပ်စုမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ~ ဍောဂါဗဝပဘော စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

အုပ်စု ~ ကျွန်းကြီး

မြို့နယ် ~ ရမည်းသင်း

ရက်စွဲ ~ 5.12.2019

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အရေအတွက် ~ ကျား (၅၅) ဦး၊ မ (၆၃) ဦး

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရန်နှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ ။ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများကို ဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာလူထုမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရန် ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ယခင်နှစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အား ချပြဆွေးနွေးပြီး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ဖြည့်သွင်းလိုလျှင် ထပ်မံဖြည့်သွင်းနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေး ပြောကြားသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) ။ ။ ကျေးရွာလူထုသည် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား အများသဘောတူ သဘောဖြင့်သာ ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

အတည်ပြုချက် ။ ။ အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း သဘောတူရွေးချယ်ခဲ့ကြရာ

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း အတွက်

ဦးစားပေး အဆင့် (၁) အဖြစ် ရွေးချယ်ကြသည်။ ထို့နောက်ကျန်ရှိလုပ်ငန်း ခွဲများကိုလည်း အသီးသီးဦးစားပေး အဆင့်လိုက် ရွေးချယ်ကြသည်။

ဝတ္ထုညွှန့်စုစောင်ပြုရန်အညွှန်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ —

၁။ ရွာသူ၏ ရိုးရာလမ်းခင်းခြင်း
၂။ စက်ရုံလွှမ်း ၊ရေမြောင်းကောင်း
၃။ စာကြည့်တိုက်
၄။ ရွာချင်းဆက်လမ်း

နှုံးချက်(၂) ။ ။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ပြီးနောက် ကျေးရွာစီ/တောင်ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာဥ်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။

ကျေးရွာစီ/တောင်ကော်မတီ မရွေးချယ်မီ တာဝန်ဝတ္တရားများ ကော်မတီ အကြောင်းအရာ ဖြန့်လည်ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဝန်ဆောင်မှု ကျေးရွာ လူထု၏ သဘောတူဆန္ဒဖြင့်သာ ကော်မတီရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ ကျေးရွာလူထု သဘောတူဆန္ဒဖြင့် ကော်မတီဝင် ပြောင်းလဲလိုလျှင် ပြောင်းလဲနိုင်ရှိကြောင်း ထပ်မံပြောကြားသည်။

တ်ချက်(၂) ။ ။ ကျေးရွာလူထုသည် ကျေးရွာစီ/တောင်ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင် အများသဘောတူဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်စေလိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

တူညီချက် ။ ။ အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ကျေးရွာစီ/တောင်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှလည်း သဘောတူညီကြသည်။

| | | |


	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၇၂၅	၇၅၀	၁၄၇၅
လူမျိုးစု (၁)---------- ဗမာ	၇၂၅	၇၅၀	၁၄၇၅
လူမျိုးစု (၂)----------	—	—	—
လူမျိုးစု (၃)----------	—	—	—
အခြား	—	—	—
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၈၀	၄၀	၃၂၀

(၈)အဝေြပဲအဝထောက်အအုံ အသုံးအဝထောင်များ

စာသင်ဝကျောင်း	အမှတ်ပြဝပါ	ကျန်းမာဝရေး	အမှတ်ပြဝပါ	ဘာသာဝရေးအဝထောက်အအုံများ	အမှတ်ပြဝပါ
အထက်တန်းဝကျောင်း	☐	ဝဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းဝကျောင်း	☑	ကျန်းမာဝရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးဝကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာဝရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဝဆေးဝပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဝလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဝကျေးရွာတွင်ဝနထိုင်ဝသော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာဝရောက်ဝသောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ဝကျောင်း	(၂)ကျန်းမာဝရေး	(၃) လက်မှုပညာရှင်

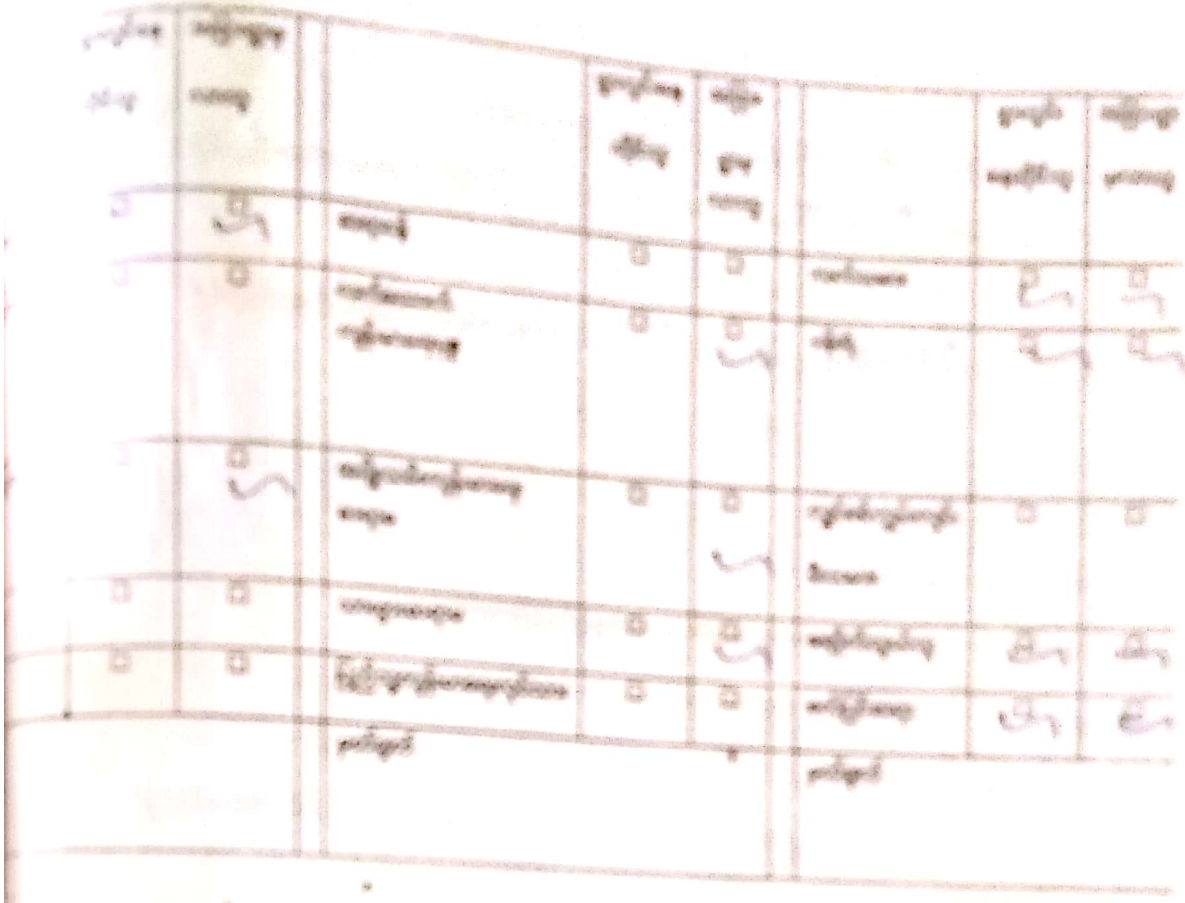

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝင်ဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅၀ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား၊

☒ရှိပါ၏ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

သူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမကိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား၊

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အဝတွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အဝတွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား၊

☒ရှိပါ၏ □ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်မောဝေ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၆.၁၂.၂၀၁၄

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဆဲလင်းဇောင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃.၁၂.၂၀၁၄

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးပန်ထမ်း အမည် - ဦးဝေလင်းခေါင် / ဦးဘာဘင်ဆက်

နေ့စွဲ ၅.၁၁.၂၀၁၄		စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း (၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ရေဖဉ်းသင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဆက်ကို့ကြီး	ကျေးရွာ ဥဘင်ပင်သာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၁၁.၂၀၁၄	၅.၁၁.၂၀၁၄	၇၅	၆၃	၁၆၈	၁၆၈ | ဗမာ	၃၁၀	၅၄%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၅.၁၁.၂၀၁၄	၅.၁၁.၂၀၁၄	၇၅	၆၃	၁၆၈	၁၆၈ | ဗမာ	၃၁၀	၅၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၆.၁၁.၂၀၁၄	၆.၁၁.၂၀၁၄	၂၃	၅	၂၈	၂၈ | ဗမာ		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို		

CamScanner

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						-		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-		
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-		
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						-		
						-		

၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						၊		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						၊		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						၊		

CamScanner

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဦးဆေလင်းခေဘင်

နေ့စွဲ ၅-၁၁-၂၀၂၃	စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (၇) □စက်ပန်း (၀) □စက်ပန်း (၂) □စက်ပန်း (၃) ☑စက်ပန်း (၄)

မြို့နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ရေစကြိုးဝင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဆက္ကြို၊ ကြီး	ကျေးရွာ ဥဘင်ကြီးဝေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း – ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာဆွင်းလမ်းများကောင်းမွန်မှု မရှိသောကြောင့် သွားရေ၊ လာရေ ခက်ခဲမှုရှိခြင်း။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ရေရှားပါးသောကြောင့် တံခြားလယ်ရာများမှာ ဝပင်သောကာလရှည်ခြင်း။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
အေးဆေးခန်း မရှိသောကြောင့် တံခြားဒေသများဘို့ သွားရောက် ကုသခံရရှိခြင်း။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ဘုရားစင်မြိ မရှိသောကြောင့် လူငယ်များ အာဆင်တန်း နှံမရဘူး ရခြင်း။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ

	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

၈။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာမည်။	□ ကျား □မ ၁၀ကျား+ မ
မာဖြန်လမ်းဘို့ ဆက်သွယ်တာဝန်ခံတော် လမ်းကောင်းမွန်လာမည်။	□ ကျား □မ ၁၀ကျား+ မ
ကျွဲနွားမောရေးအသင်းကို လုံခြုံစိတ်ချလာမည်။	□ ကျား □မ ၁၀ကျား+ မ
ဗျပ်စင်အမြင့်ရှိလာပါက ယုန်ရေမျှောဆည်တန်း မြင့်မားလာမည်။	□ ကျား □မ ၁၀ကျား+ မ
အာဆာမွေးမြူခြင်းကြောင့် သတ်တောင်းများရှိလာပါက ဝင်ငွေများပိုမို ရရှိလာမည်။	□ ကျား □မ ၁၀ကျား+ မ
	□ ကျား □မ ၁ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာမှ - အပြင်လမ်း သို့ ဘုရားကွယ်မီး ရောက်ခရီးခြင်း	ကျား+မ	လမ်း/တံတား	၁၀၀၀၀၀၀/-	၇၅၅	၇၅၀	၁၄၇၅
၂	ရွာတွင်း ရိုစာလမ်းခရီးခြင်း	ကျား+မ	လမ်း/တံတား	၇၀၀၀၀၀/-	၇၂၅	၇၂၀	၁၄၇၅
၃	ရာတွင်း၊ ရေဖြောင်းကန် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	ရေပေးရေး	၇၀၀၀၀၀/-	၇၂၅	၇၂၀	၁၄၇၅
၄	ဆေးပေးခန်းတည် ဆောက် ခြင်း	ကျား+မ	ကျန်းမာရေး	၁၉၀၀၀၀၀/-	၇၂၅	၇၂၀	၁၄၇၅
၅							

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အာသာကိုးဝမ်းရေကြည်း သစ်တောဆုံး ၃ တိုင် / စက်ချုပ်ပါ	ကျား+မ	အာသာကိုးမွေးဝမ်းရေကြည်း
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမျိုးရေခြ် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၅.၁၁.၂၀၂၃

ဒေါ်ခင်မာသစ် သင်း ၅.၁၁.၂၀၂၃

ဘုရားရှိခိုးကြိုး ကျေးရွာ ~ သောင်ပင်သာ မြို့နယ် ~ ရေမည်းသင်း

လူဦးဖဟိုဂြုံစိမ်းကြိုး၊ စတုတ္ထအဆင့်

ကလေးအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ အမှန်ခြစ်ရန်			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား/မ			
အခြေခံအဆောက်အဦးကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေကိုင်ရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာမှ - ဘုရားရှိခိုးကြိုးသွားရာလမ်း			✓	၂၀၂၀	CDD	
	၂	ရိုးရာဆင်းခြင်း			✓			
	၃	ရွာတွင်းရေတာလမ်း ခင်းခြင်း			✓			
	၄	ရေတွင်း/ရေစင်/ဆပ်ကပ်ပိုက်ရေ			✓			
	၅							
လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အထောက်အကူပြုအဆောက်အဦးများနှင့် ထိုသို့ဖွင့်လှစ်ခြင်း)	၁	ဆေးလေးဘီးတာဥာဏ်ဆာကျွန်ုပ်ခြင်း			✓			
	၂	ပျားစည် ဆေးပေး ခန်း သွား	✓					
	၃	လမ်း ပြုပြင်ခြင်း						
	၄	ရွာတွင်း လမ်း ကွန်ကရစ် လမ်း ခင်းခြင်း			✓			
	၅	ရွာမှ အမြှောက်လမ်း သွား ကွန်ကရစ် လမ်း ခင်းခြင်း			✓	၂၀၂၂-၂၃	VDP	
အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်များ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အထောက်အကူပြုအဆောက်အဦးများနှင့် ထိုသို့ဖွင့်လှစ်ခြင်း)	၁	ဘာသာကြွေးဟမ်း ကြောင်းသစ်			✓			
	၂	တံခါး ၄ ချပ်ရိုး/စက်ချုပ်)						
	၃	ရွာ ဓမ္မာဖြန့်လမ်း သို့ ရိုးမာင်းခြင်း			✓	၂၃-၂၄		
	၄	ပျားစည် ဆေးပေး သွား လမ်း ဆောက်ခြင်း			✓	၂၄-၂၅		
	၅	ဆေး ပေး ခန်း အောက်လုပ်ခြင်း			✓	၂၅-၂၆		
ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း			✓	၂၆-၂၇		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (ကလေးသူငယ်များ၏ ဘဝအရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
