ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမ နှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပေါင်မြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ ရင်းငြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

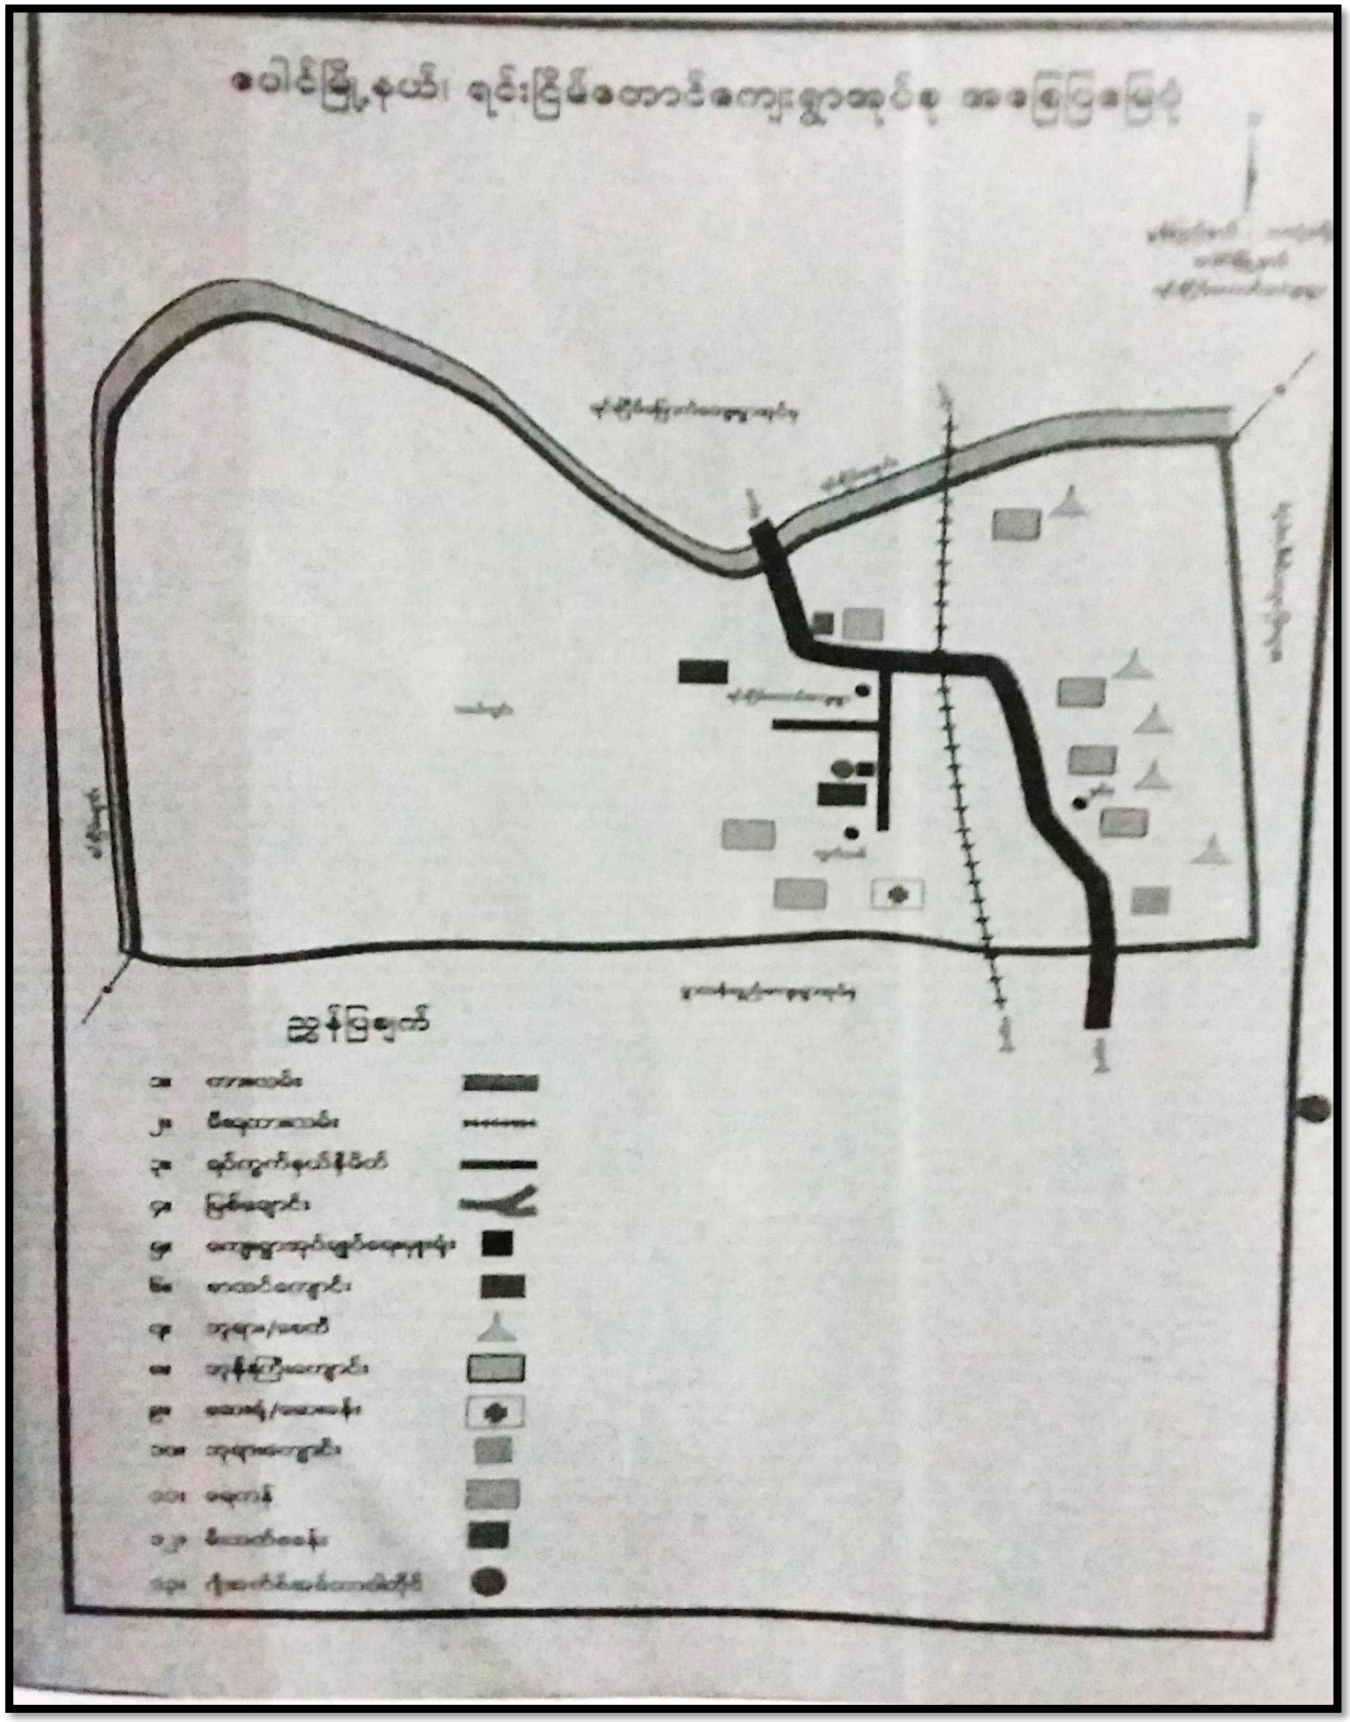

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်


၃။ ရင်းငြိမ်းတောင်အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ ရင်းငြိမ်းတောင်ကျေးရွာ

၂။ ကွက်သစ် ကျေးရွာ

၃။မွန်စုကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

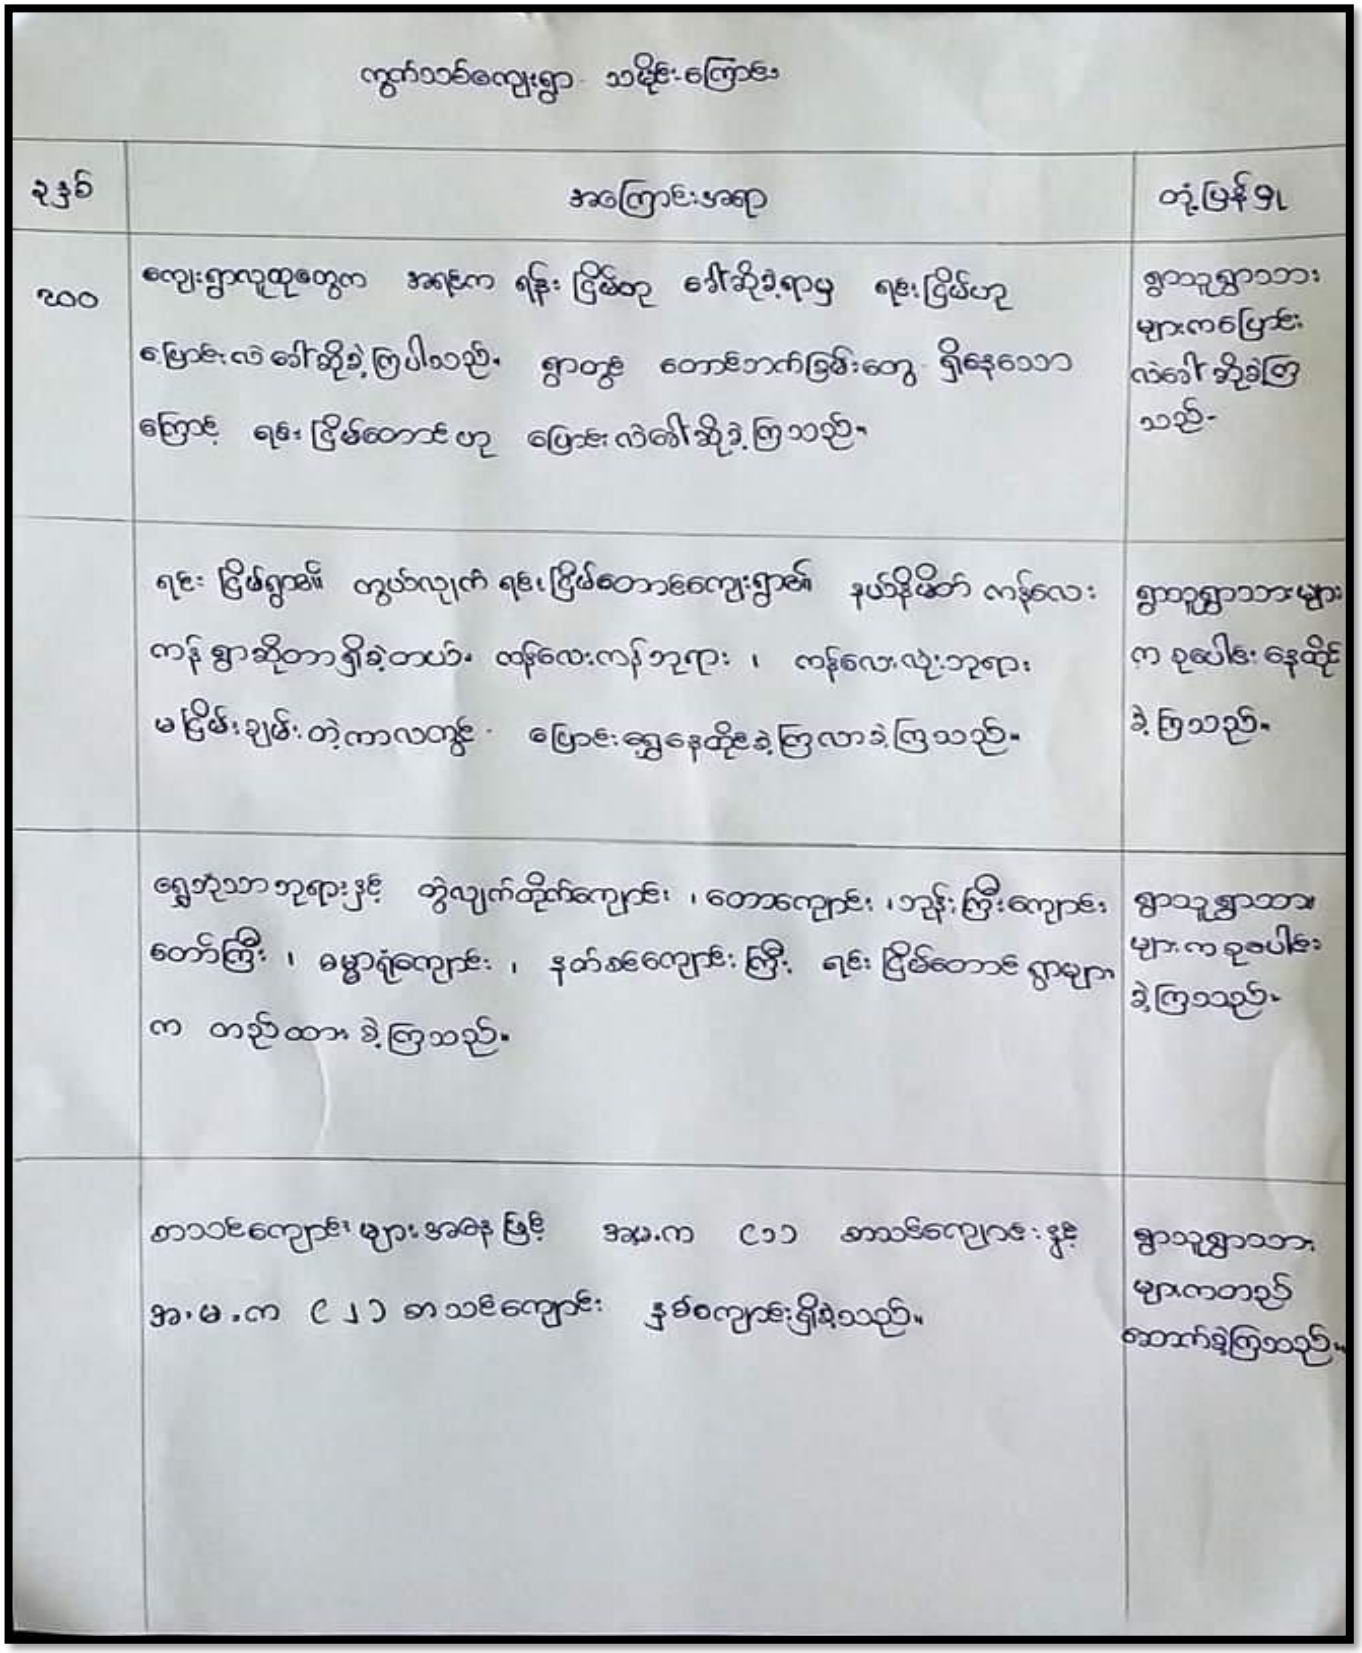

ကွက်သစ်ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

နှစ်	အကြောင်းအရာ	တုံ့ပြန်ချက်
၁၀၀	ကျေးရွာလူထုတွေက အရင်က ရန်းငြိမ်တဲ့ နေရာမှာ ရှေးငြိမ်ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ရွာတွင် တောင်ဘက်ခြမ်းတွေ ရှိနေသော ကြောင့် ရှေးငြိမ်တောင်ဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။	ရွာသူရွာသား များက ပြောင်း လဲခေါ်ဆိုခဲ့ကြ သည်။
	ရှေးငြိမ်ရွာ၏ တွယ်သူက ရှေးငြိမ်တောကျေးရွာ၏ နယ်နိမိတ် ကန့်လန်း ကန် ရွာဆိုတာရှိခဲ့တယ်။ ထန့်လေးကန်ဘူးကား ၊ ကန်လေးလုံးဘူးကား မငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာလတွင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြလာခဲ့ကြသည်။	ရွာသူရွာသား များက ခုမေါ်ခေး နေထိုင် ခဲ့ကြသည်။
	ရွှေဘုံသာဘုရားနှင့် တွဲလျက်တည်ရှိကျောင်း ၊ တောကျောင်း ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း တော်ကြီး ၊ ဓမ္မာရုံကျောင်း ၊ နတ်ဆင်းကျောင်းကြီး ရှေးငြိမ်တောင်ရွာမှာ က တည်ထား ခဲ့ကြသည်။	ရွာသူရွာသား များက ခုမေါ်ခေး ခဲ့ကြသည်။
	ဘာသင်ကျောင်းမှာ အရင်နေ ရပ်ရှိ အမ.က ၄၁၁ ဘာသင်ကျောင်းနှင့် အ.မ.က ၄၂၁ ဘာသင်ကျောင်း နှစ်ခုကျောင်းရှိခဲ့သည်။	ရွာသူရွာသား များကတည် ဆောက်ခဲ့ကြသည်။

၅။ ကွက်သစ်လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)


PRA အကျဉ်ချုပ်ပြဇယား

(တတိယနှစ်စက်ဝန်း) ကွက်သစ်ကျေးရွာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	အနှစ်ချုပ်
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂.၉.၁၈	၅၀	၆၅	ကျေးရွာမြေပုံအားကြည့်၍ကျေးရွာရှိအရင်းအမြစ်များသိရှိနိုင်သည်အပြင်ကျေးရွာလို အပ်ချက်များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂.၉.၁၈	၅၀	၆၅	ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မူတည်၍ကျေးရွာလူထု၏စီပွားရေးအခြေအနေ၊လူနေမှုအဆင့်အတန်းများကိုသိရှိနိုင်သည်။
၃။	အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၂.၉.၁၈	၅၀	၆၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသားအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်၊အမျိုးသမီးသုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်များကိုသိရှိနိုင်ပြီးမည်သည်အရင်းအမြစ်များပေါ်များကြောင်းသိရှိနိုင်သည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂.၉.၁၈	၅၀	၆၅	ကျေးရွာတစ်ရွာ၏ဝင်ငွေအများဆုံးအချိန်၊ထွက်ငွေအများဆုံးချိန်ကိုသိရှိပြီး၊ကျေးရွာတစ်ရွာ၏အသွင်အပြင်များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂.၉.၁၈	၅၀	၆၅	အမျိုးသမီးများ၏နေထိုင်မှုအခြေအနေ၊အမျိုးသားများ၏နေထိုင်အခြေအနေသိရှိပြီနိုင်ယှဉ်နိုင်သည်။
၆။	အဖွဲ့အစည်းရှိတ်ဆက်မှု	၂.၉.၁၈	၅၀	၆၅	အဖွဲ့အစည်းများ၏ရှိတ်ဆက်မှု၊ကျေးရွာလူထုအပေါ်အကျိုးပြုမှုများကိုသိရှိနိုင်သည်။

၆။ ကွက်သစ်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ


၁။ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ

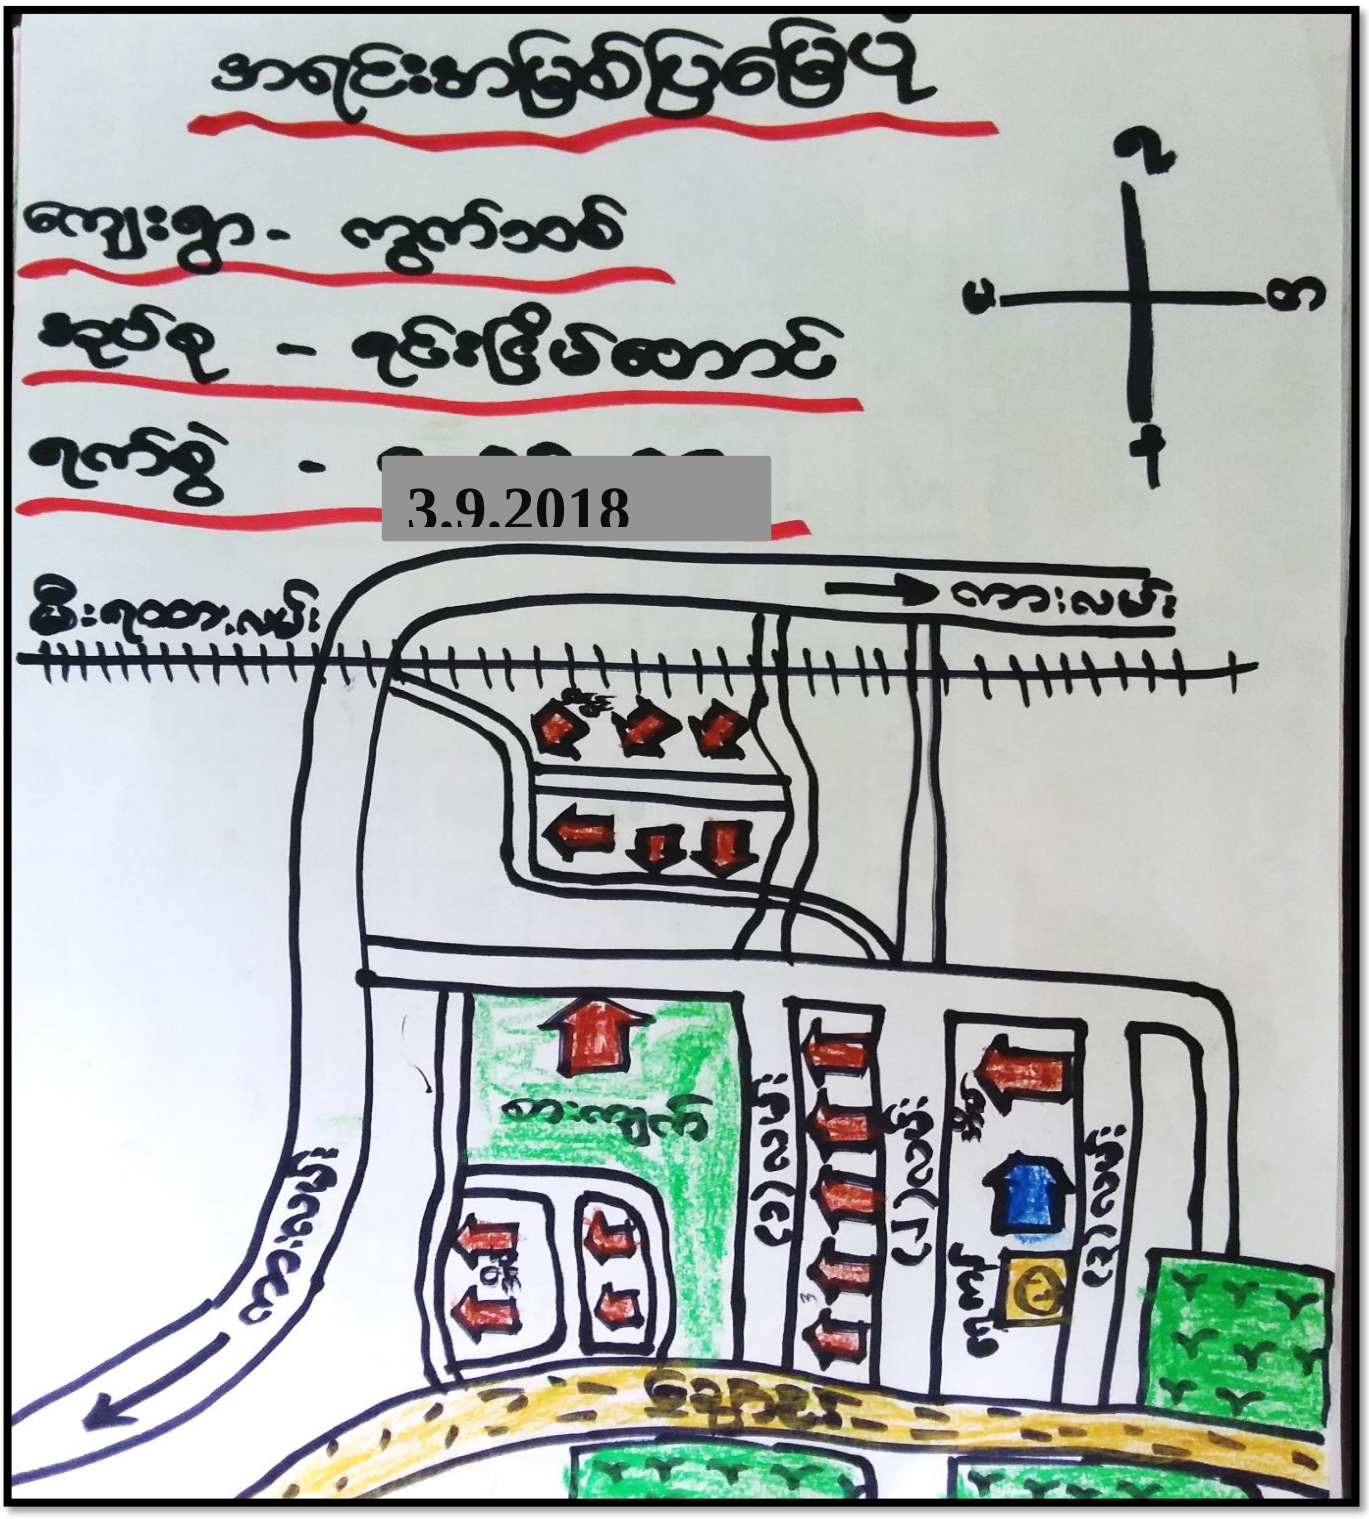


၁။ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

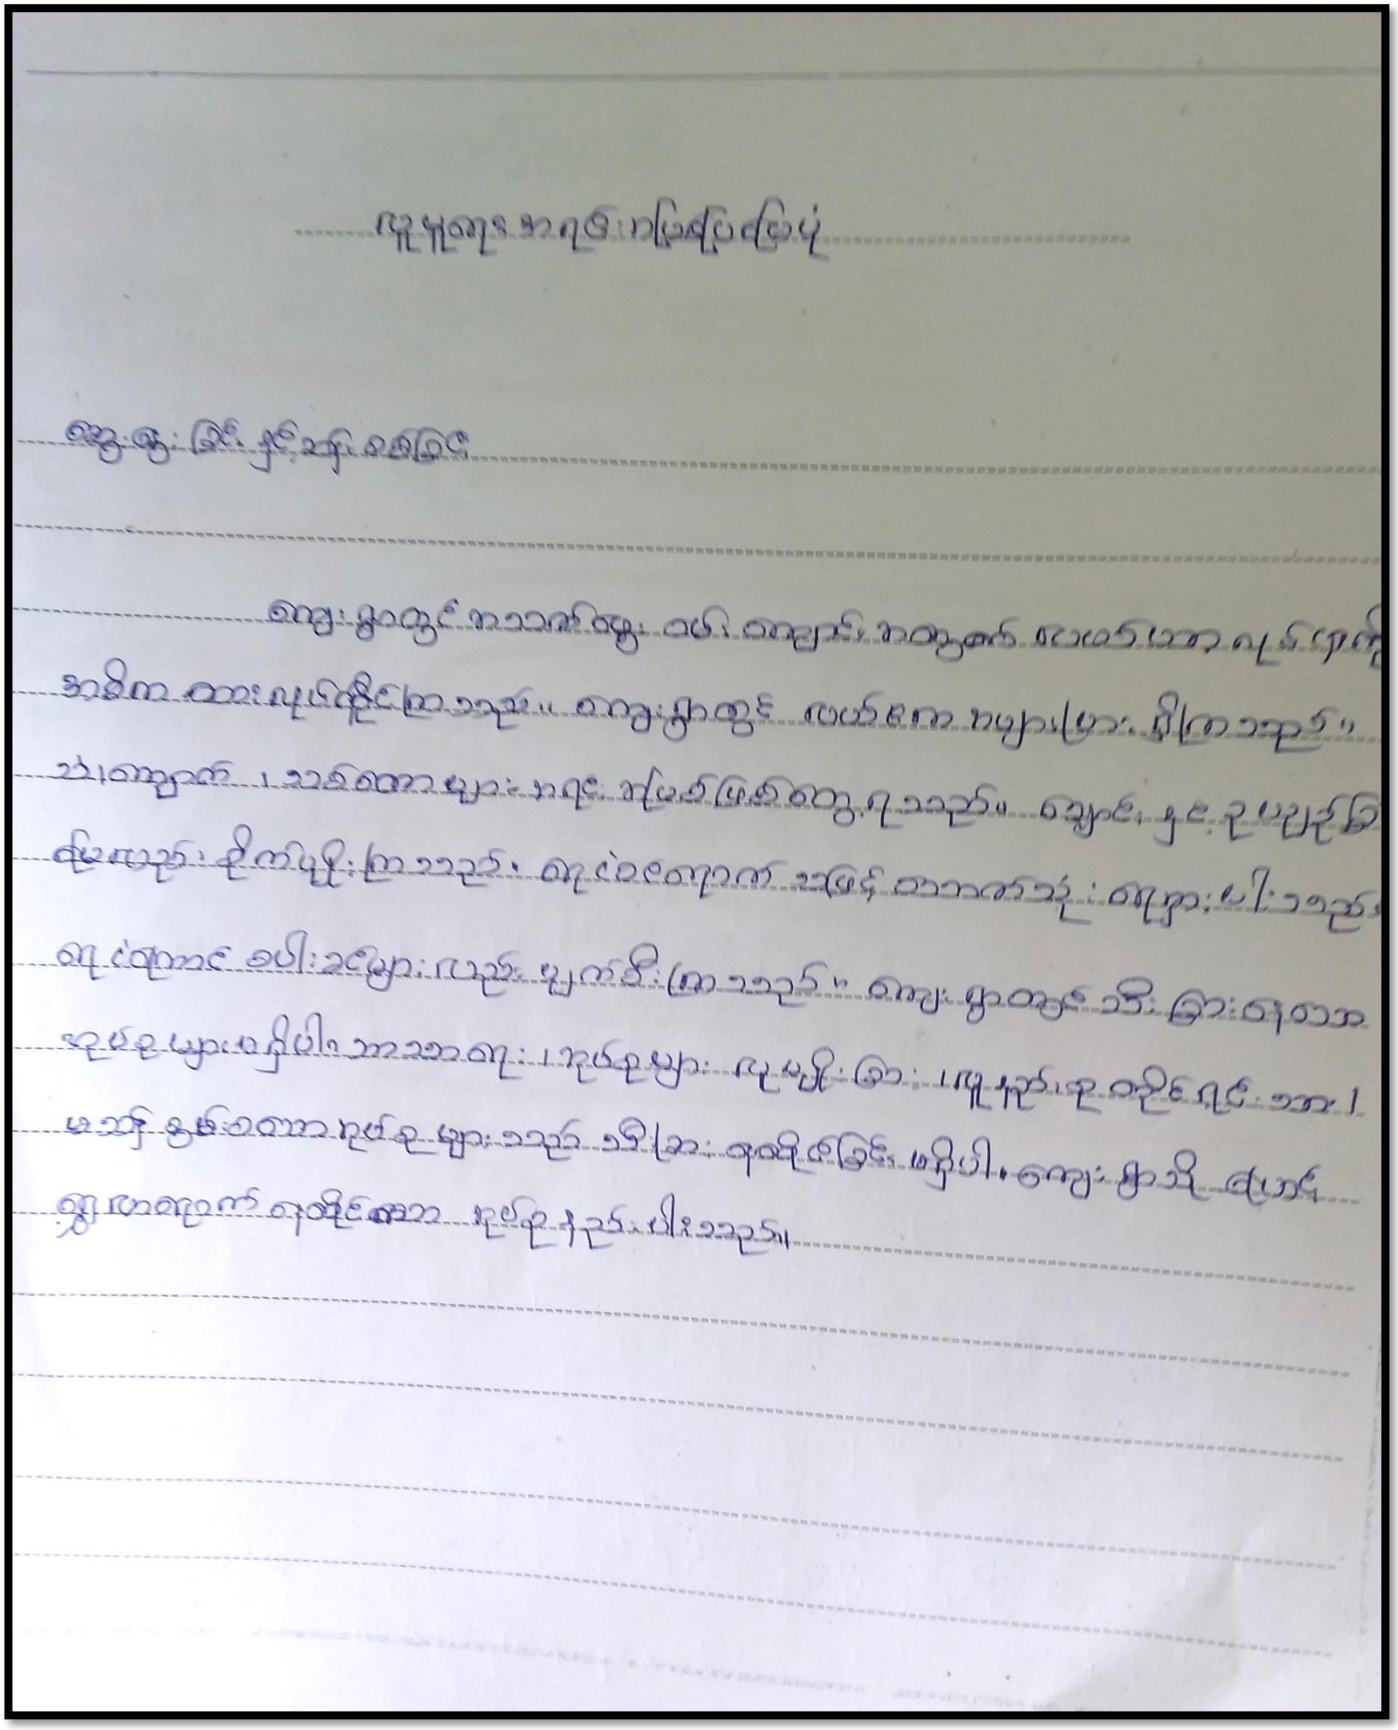


၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

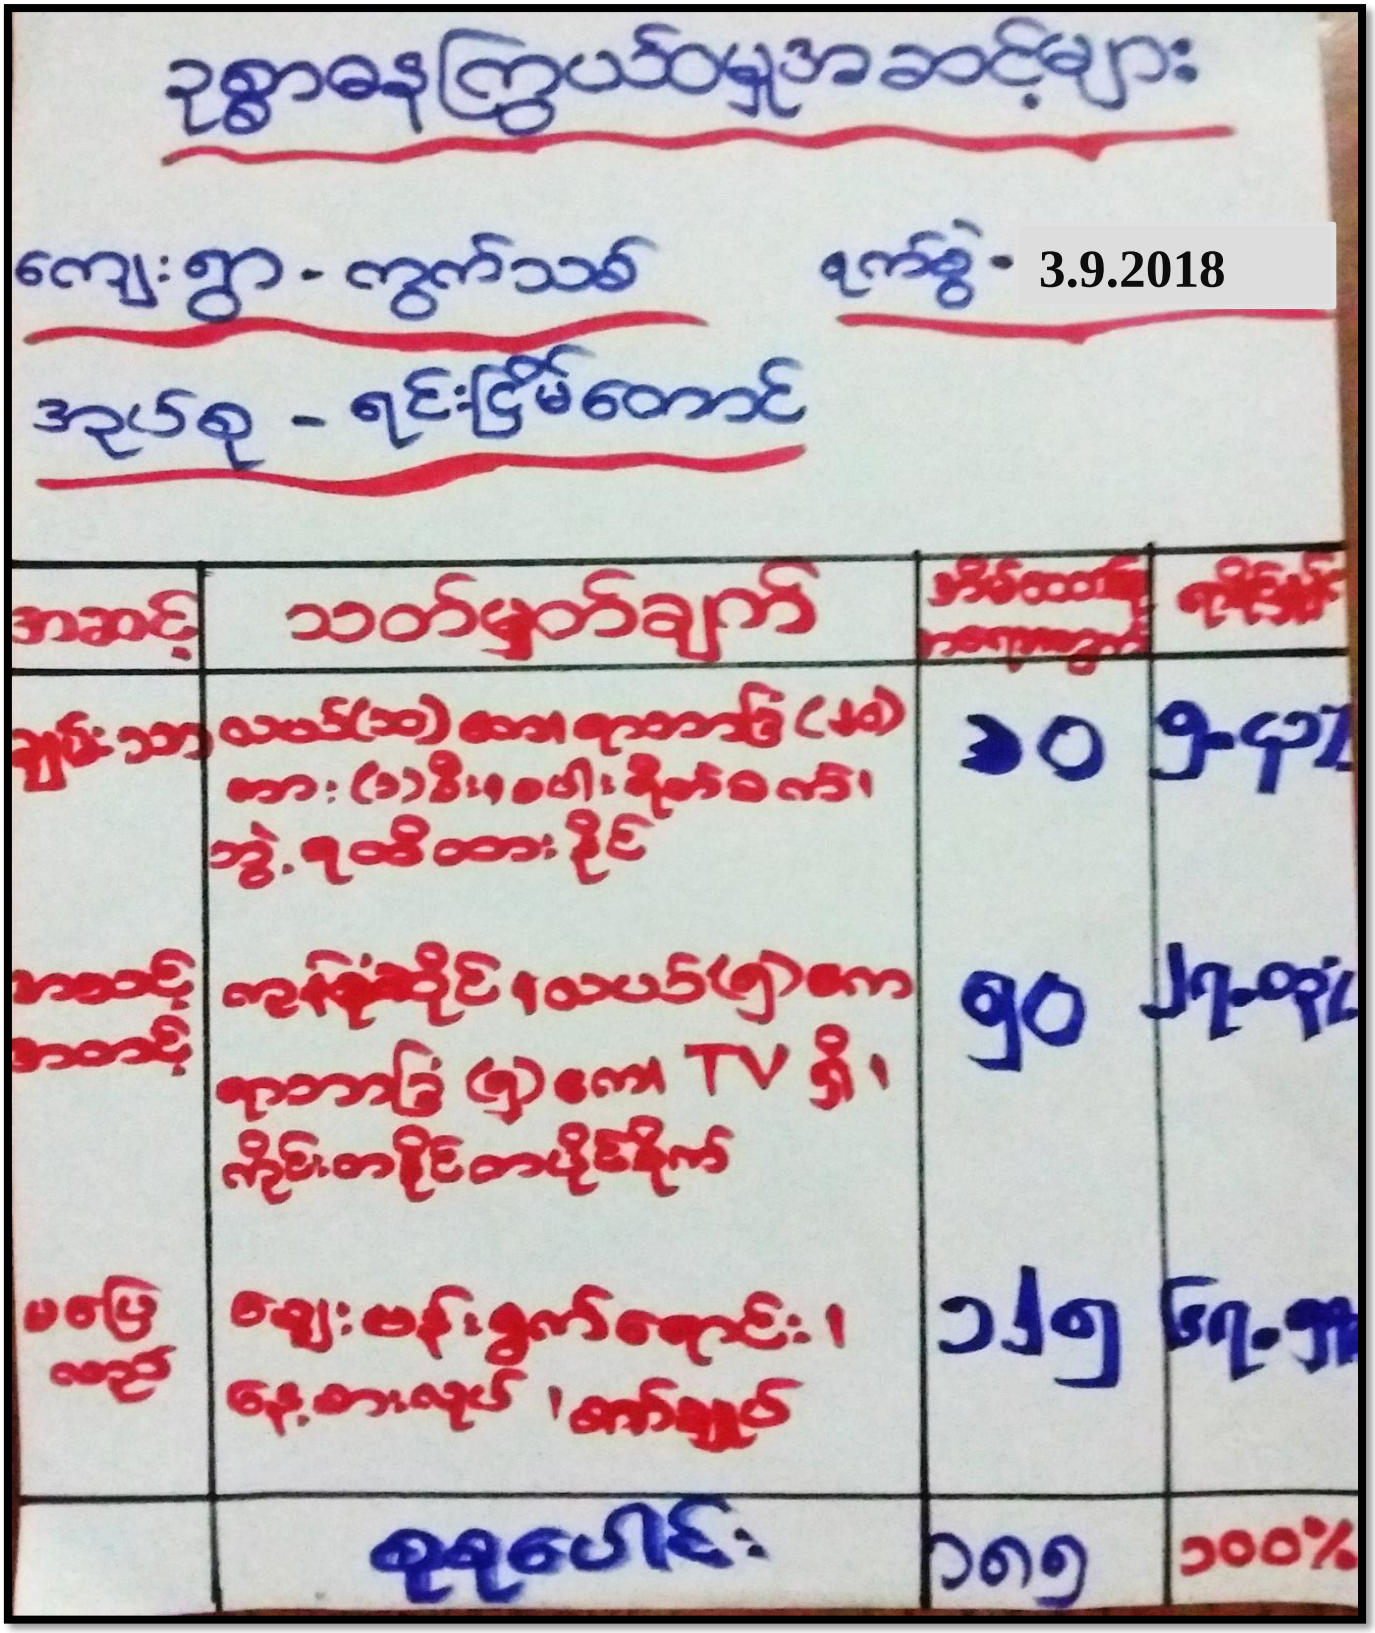


၂။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

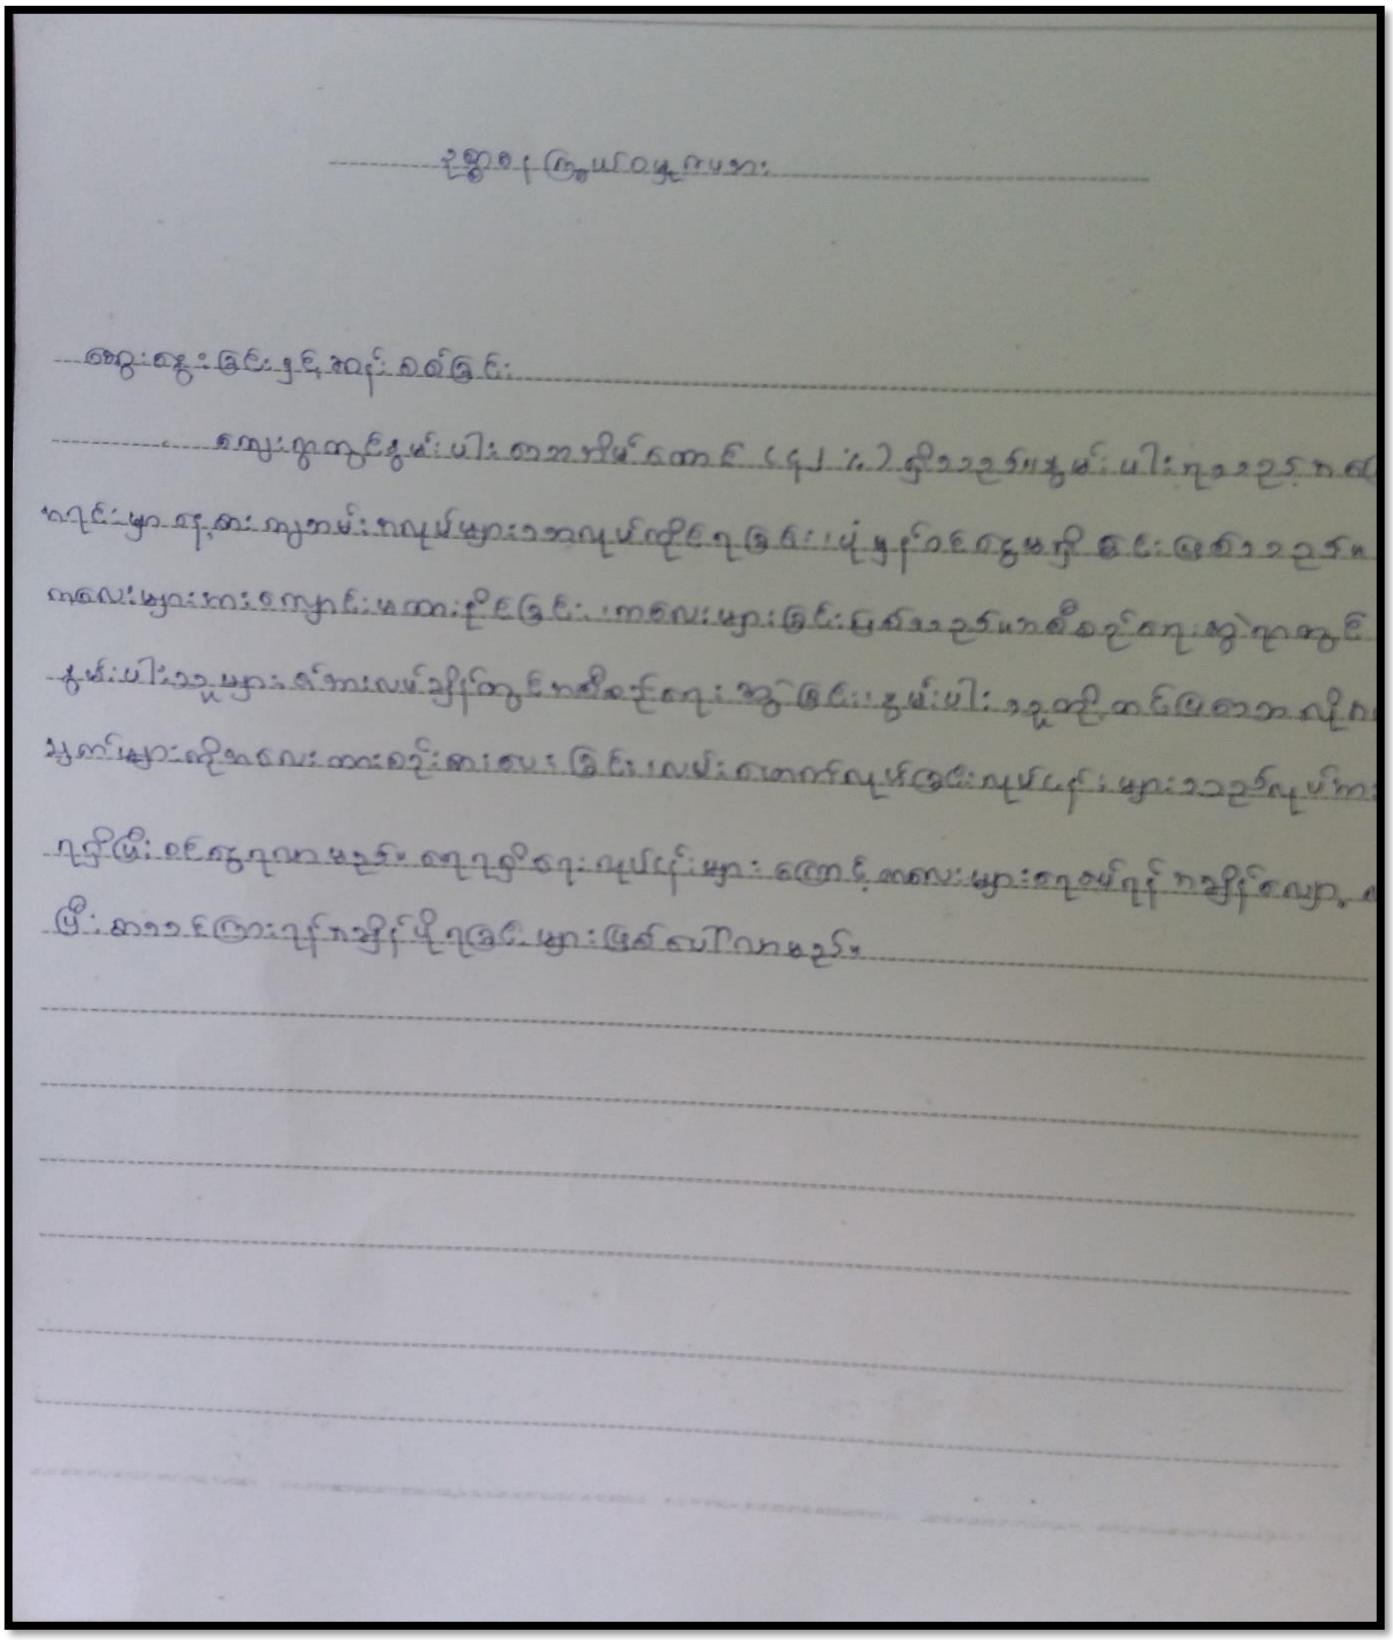


၃။ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

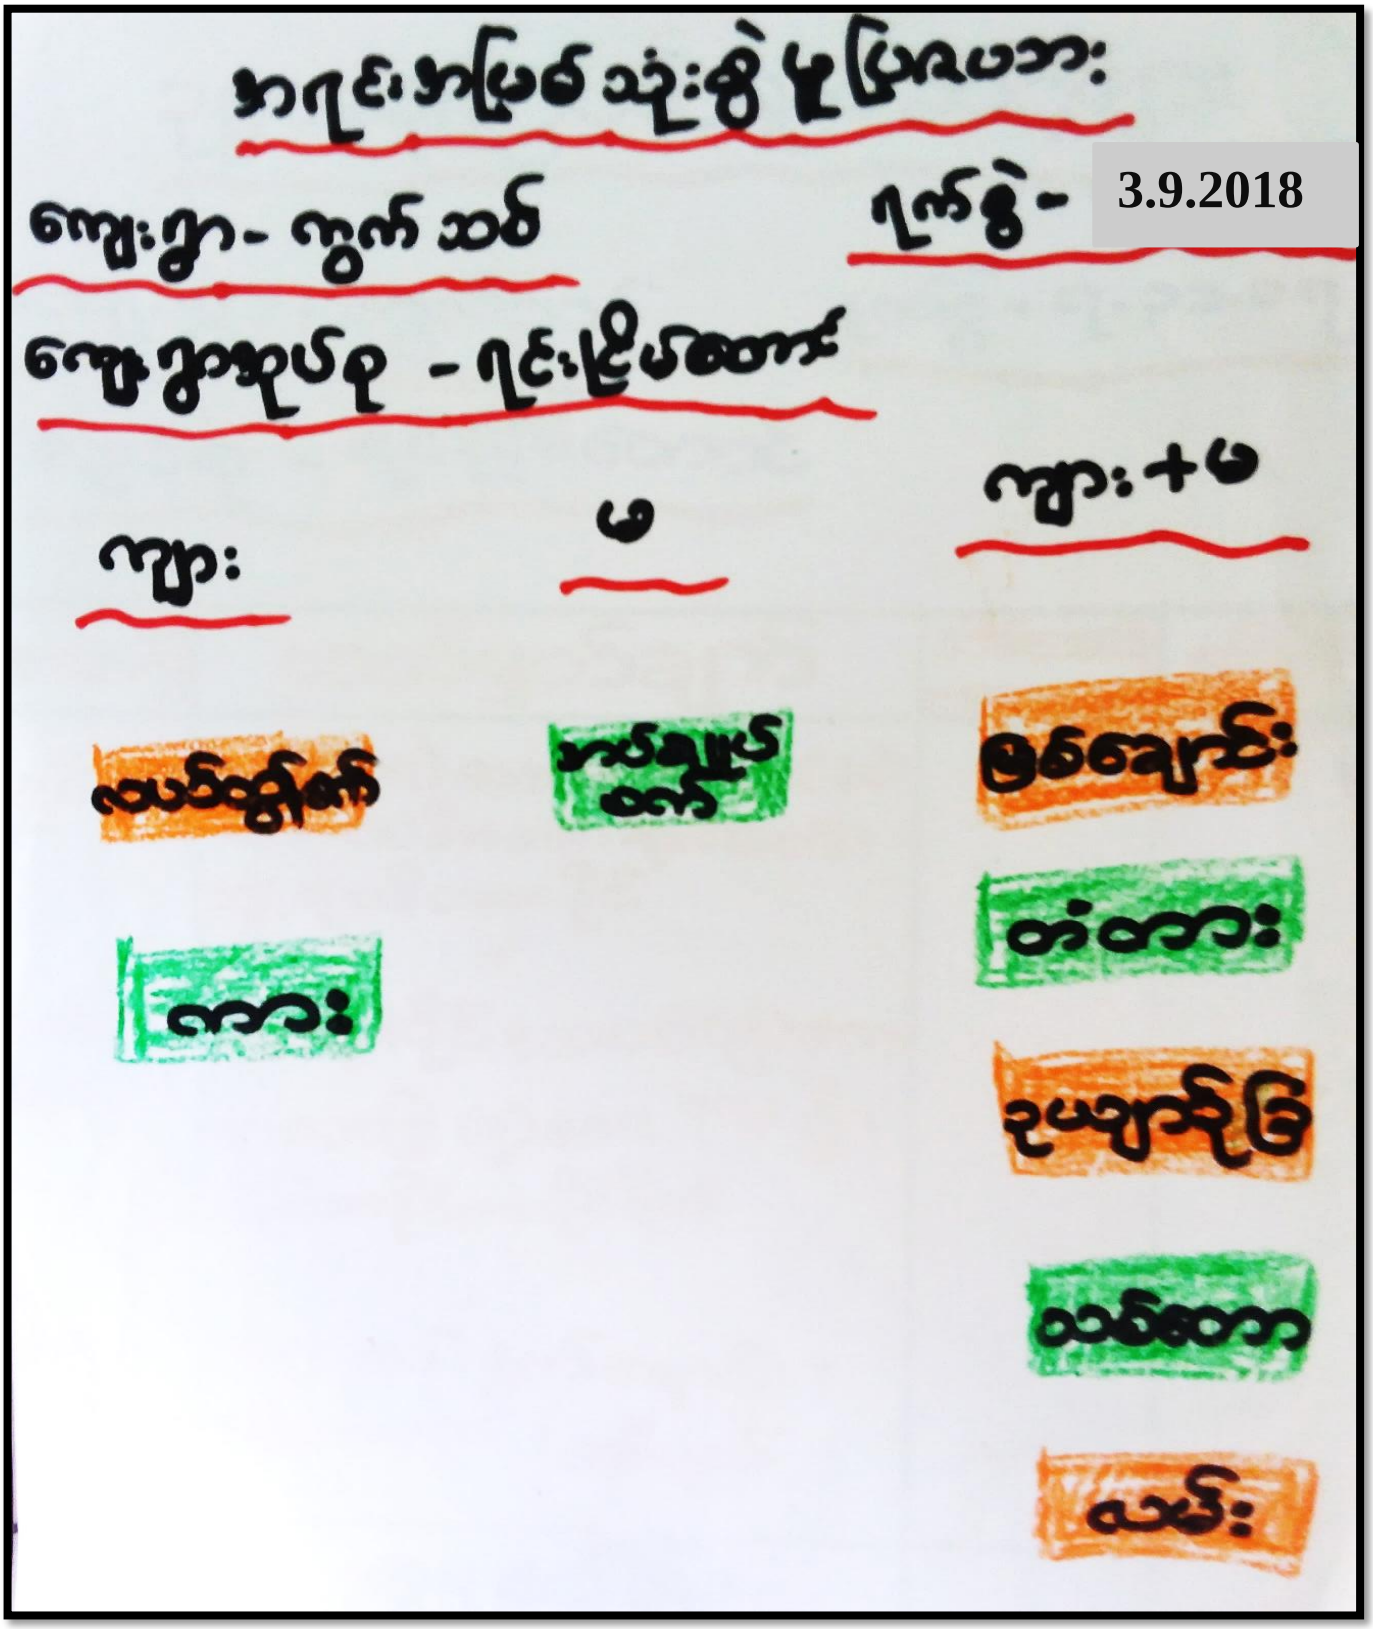


ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

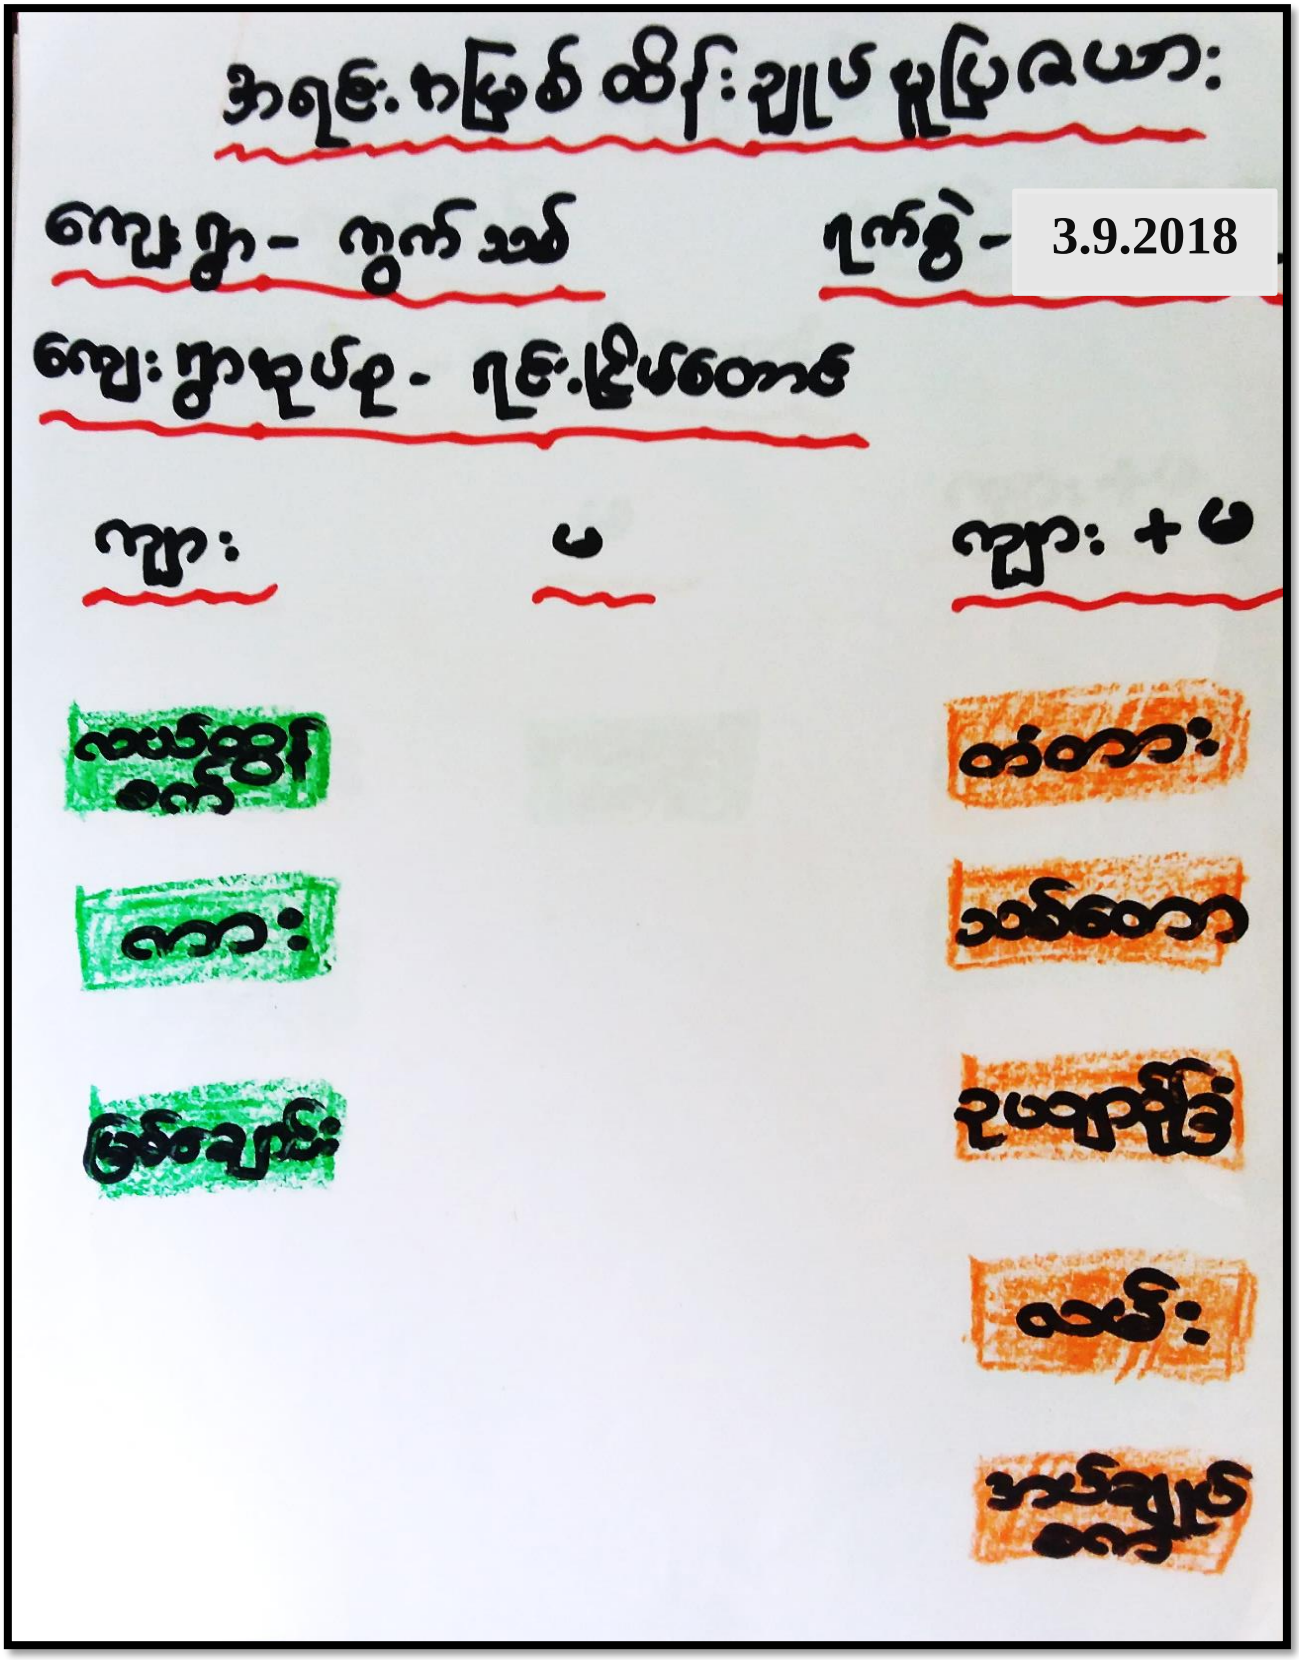
အရေးကြီးစကားလုံးများ
ကျေးဇူး - ကွက်သစ်
ရက်စွဲ - 3.9.2018
ပြီးသွားတဲ့အပတ် - ရုံးပြိုကြတော့
ကျား
ပ
ကျား + ပ
ကောင်လေး
ကား
ဖြစ်ချင်း
တံတား
သစ်တော
ဥယျာဉ်ပြင်
သင်း
အပ်ချုပ်ဆိုင်

၃။ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

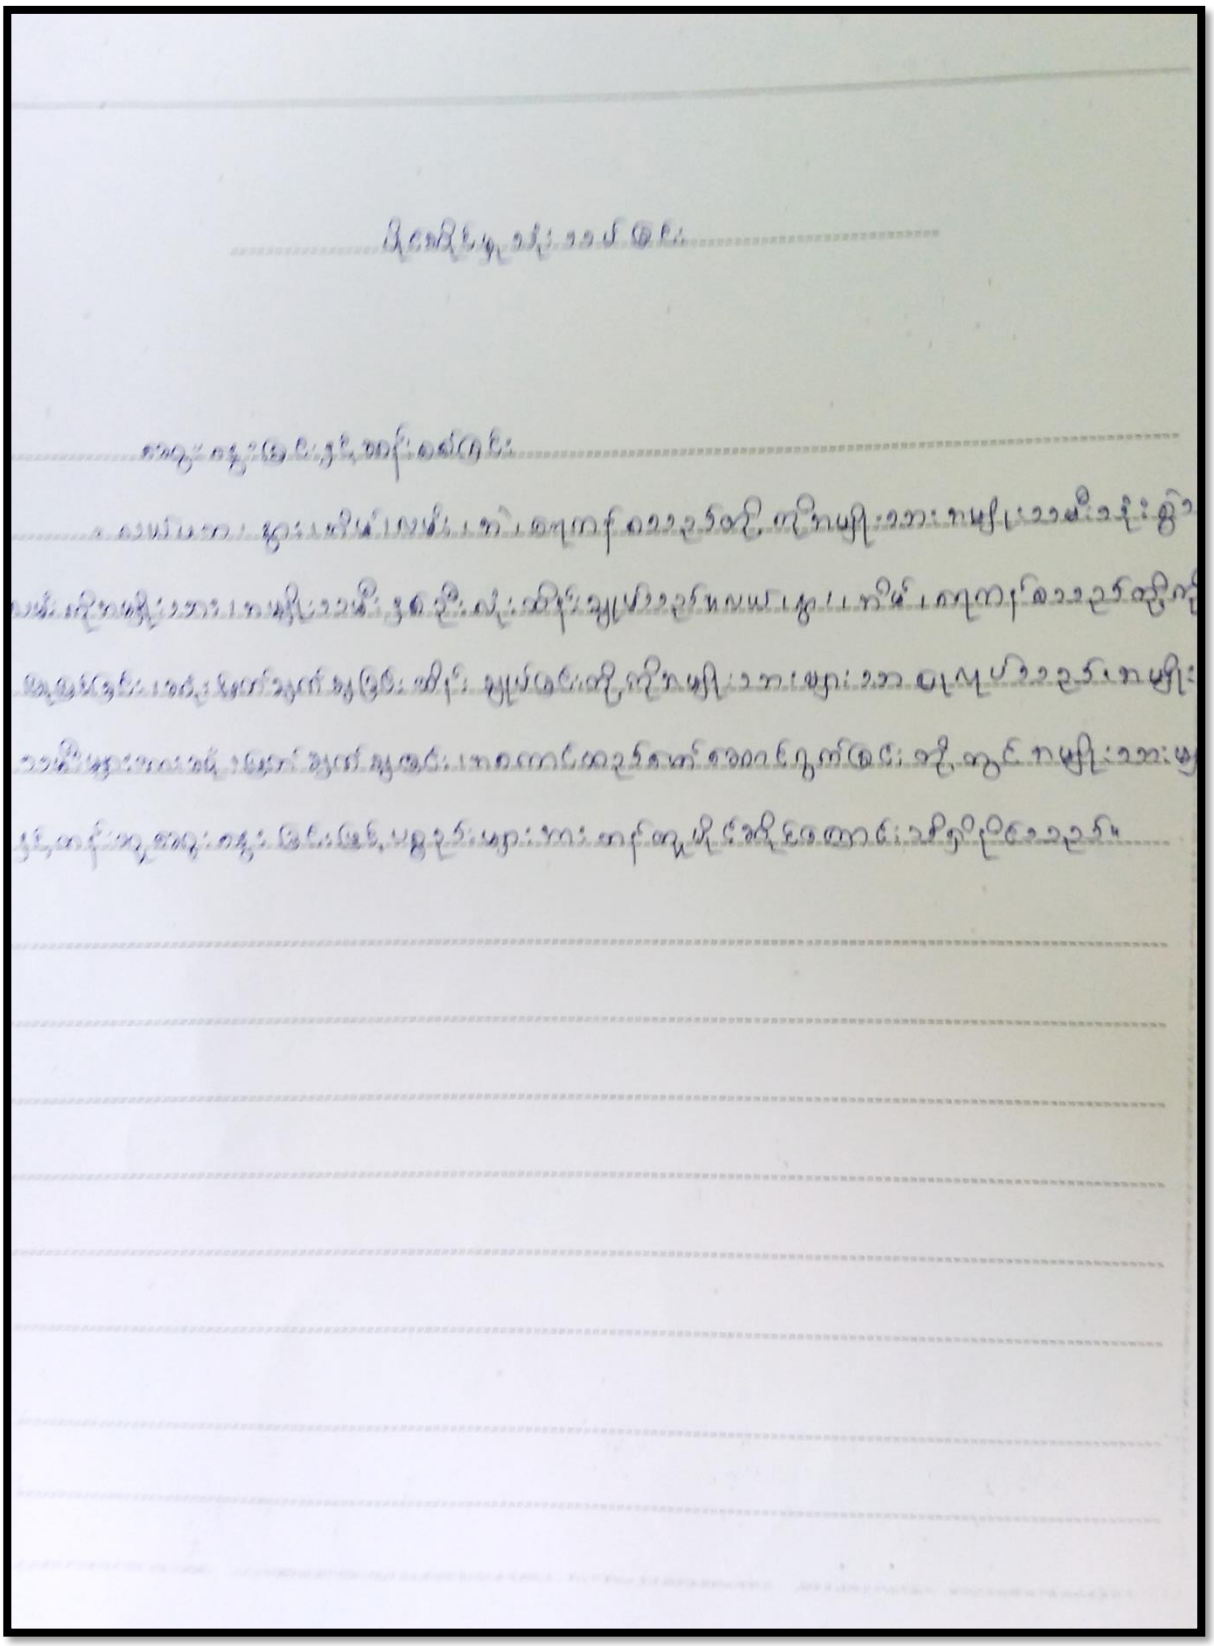


၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်

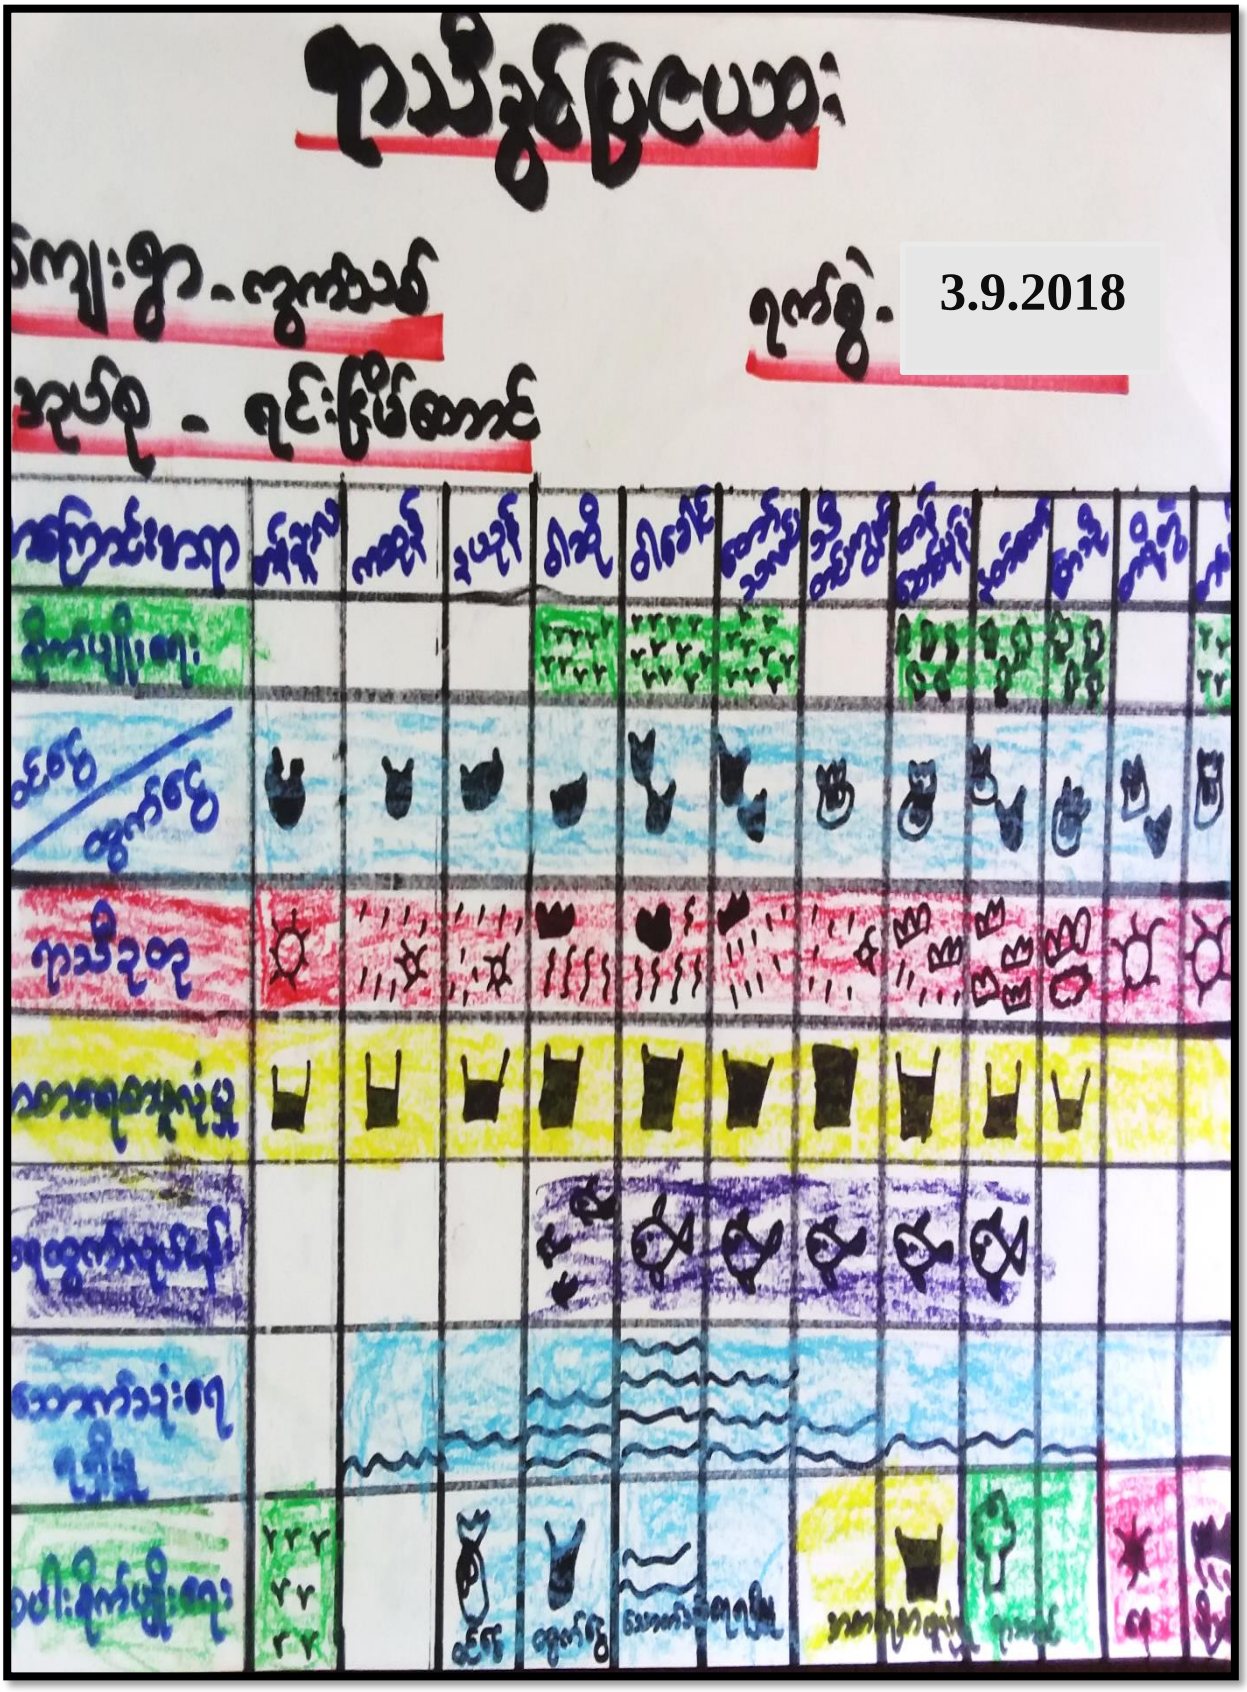

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

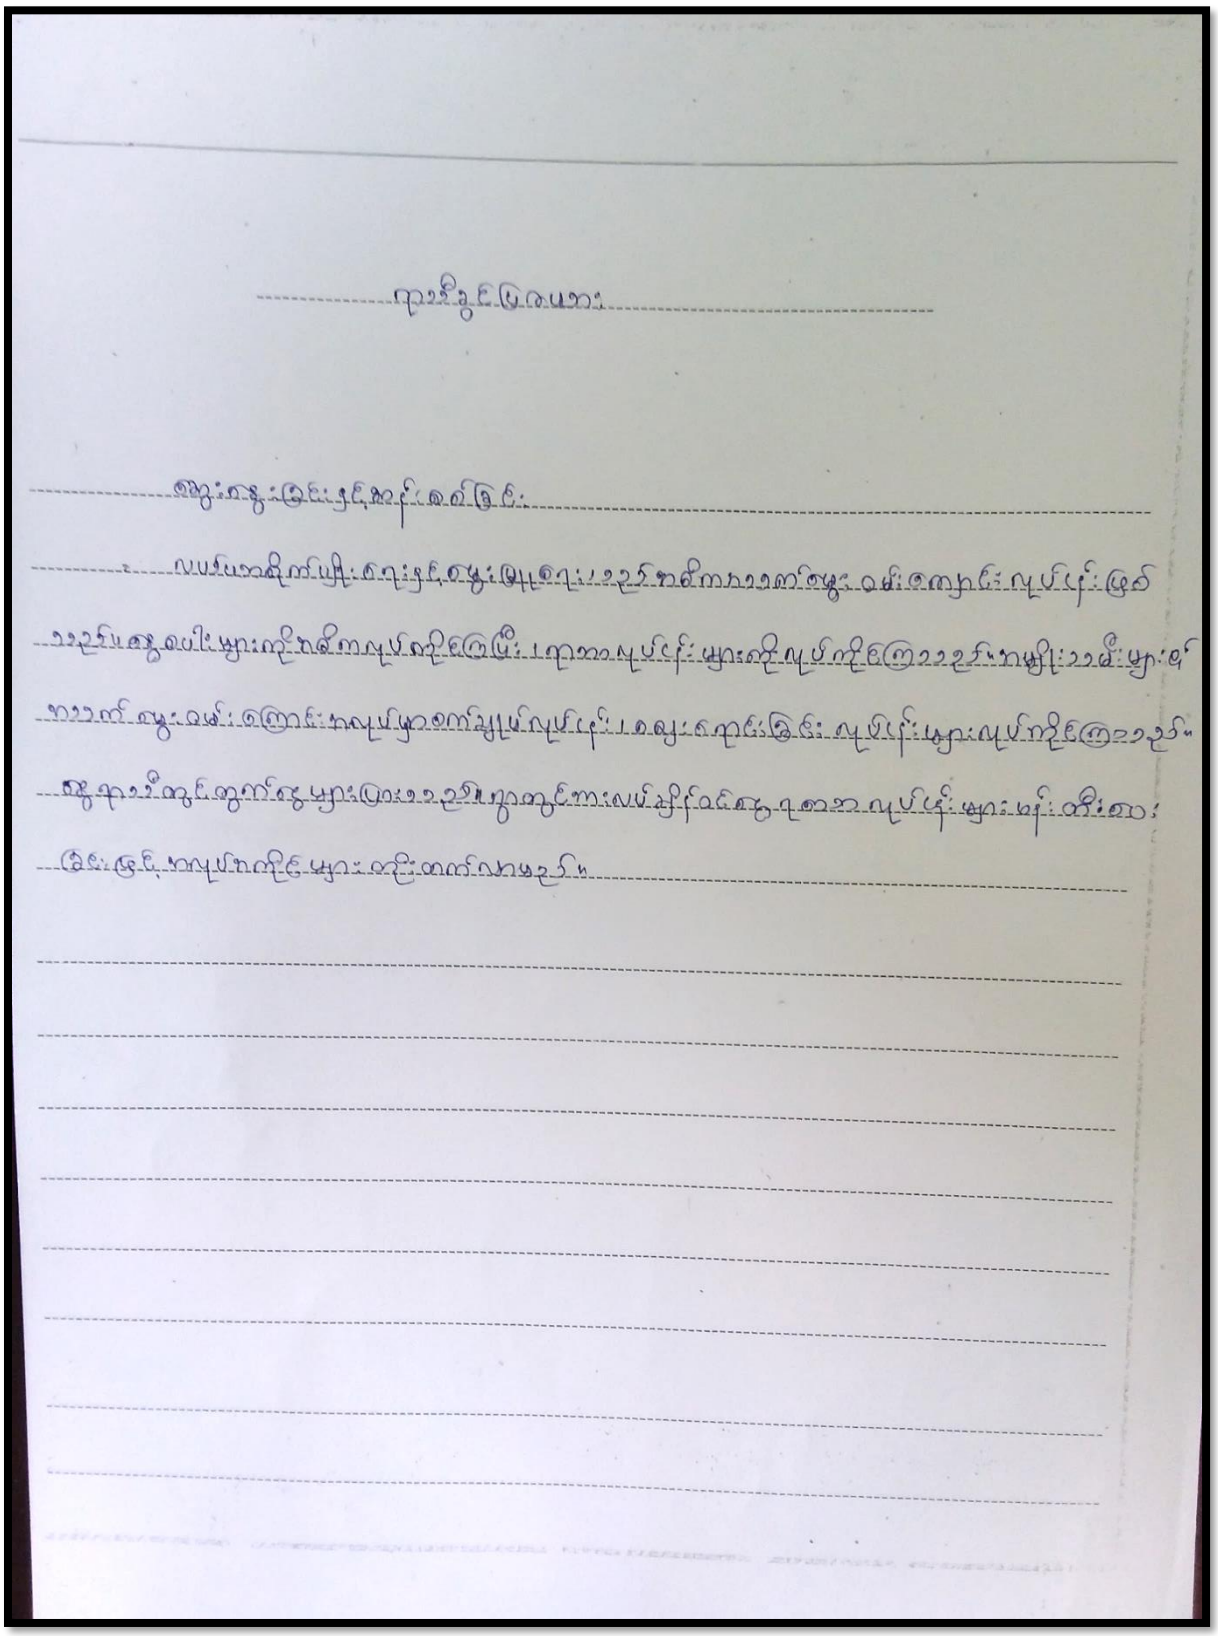

၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်




ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

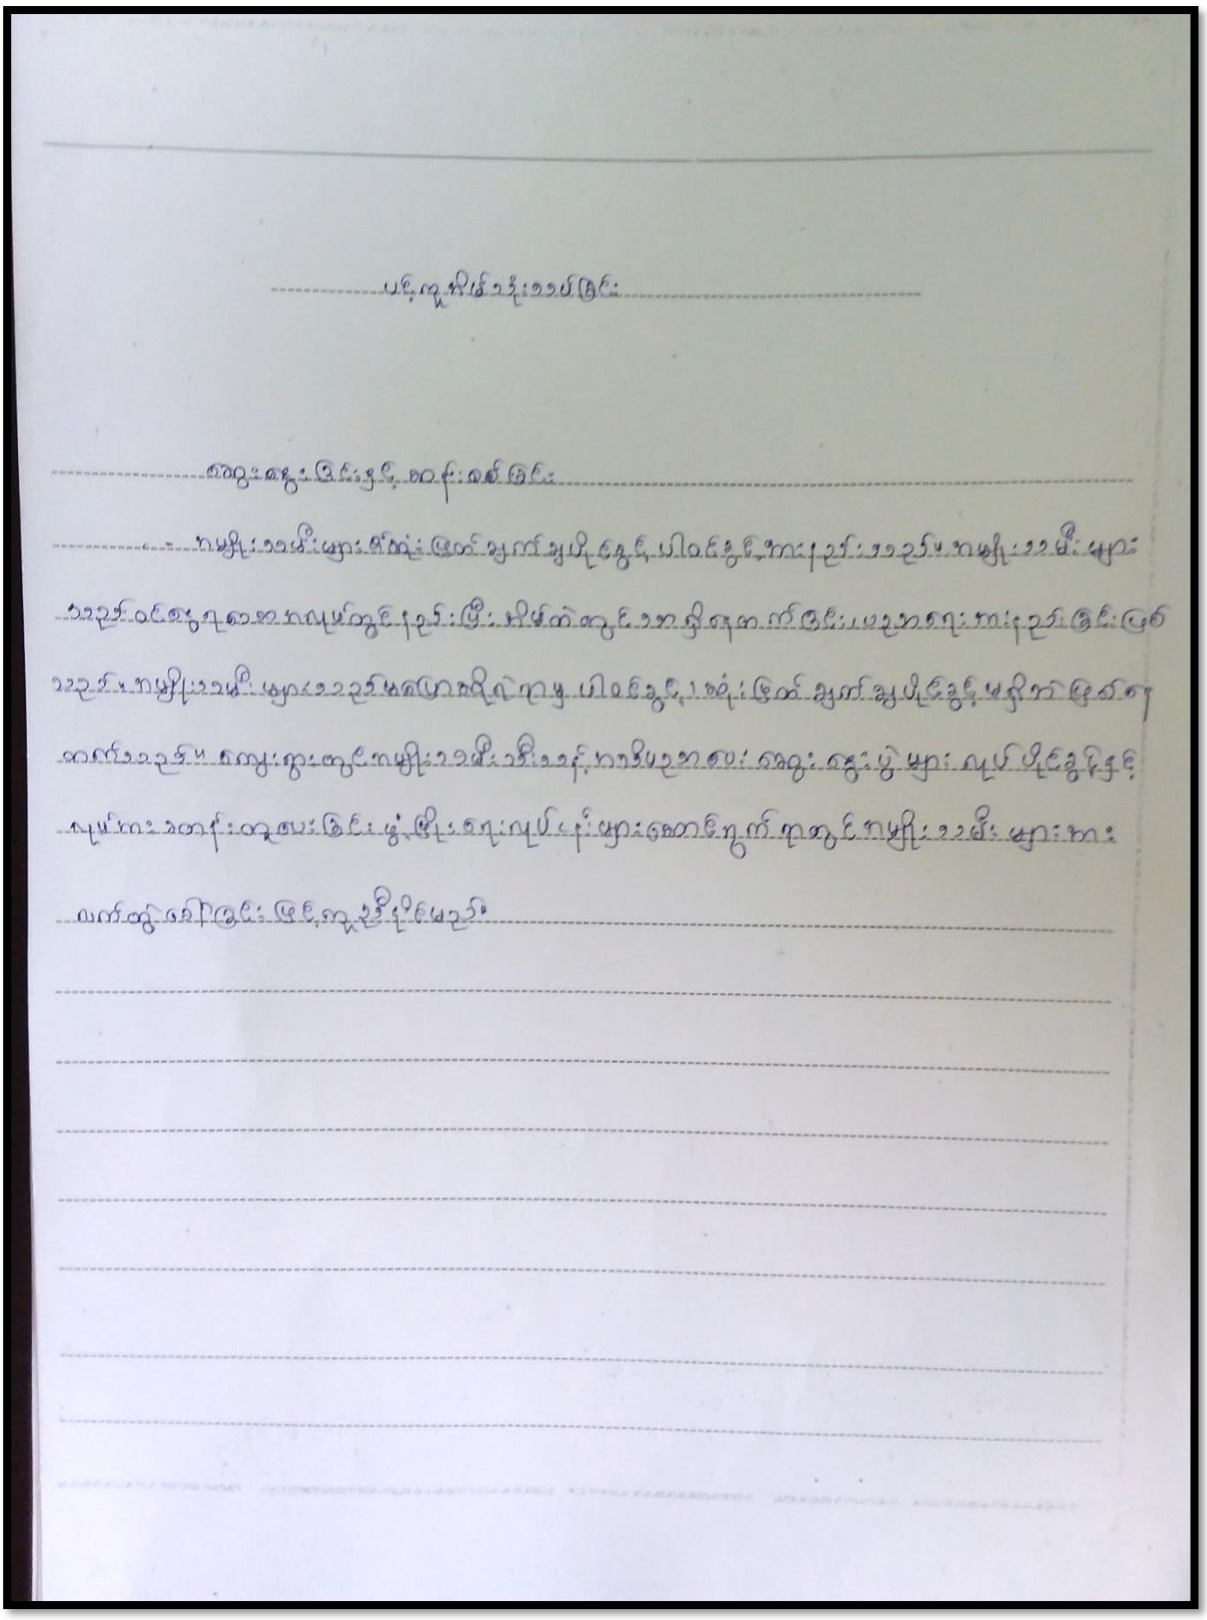

၆။ဖင်းပုံစံ

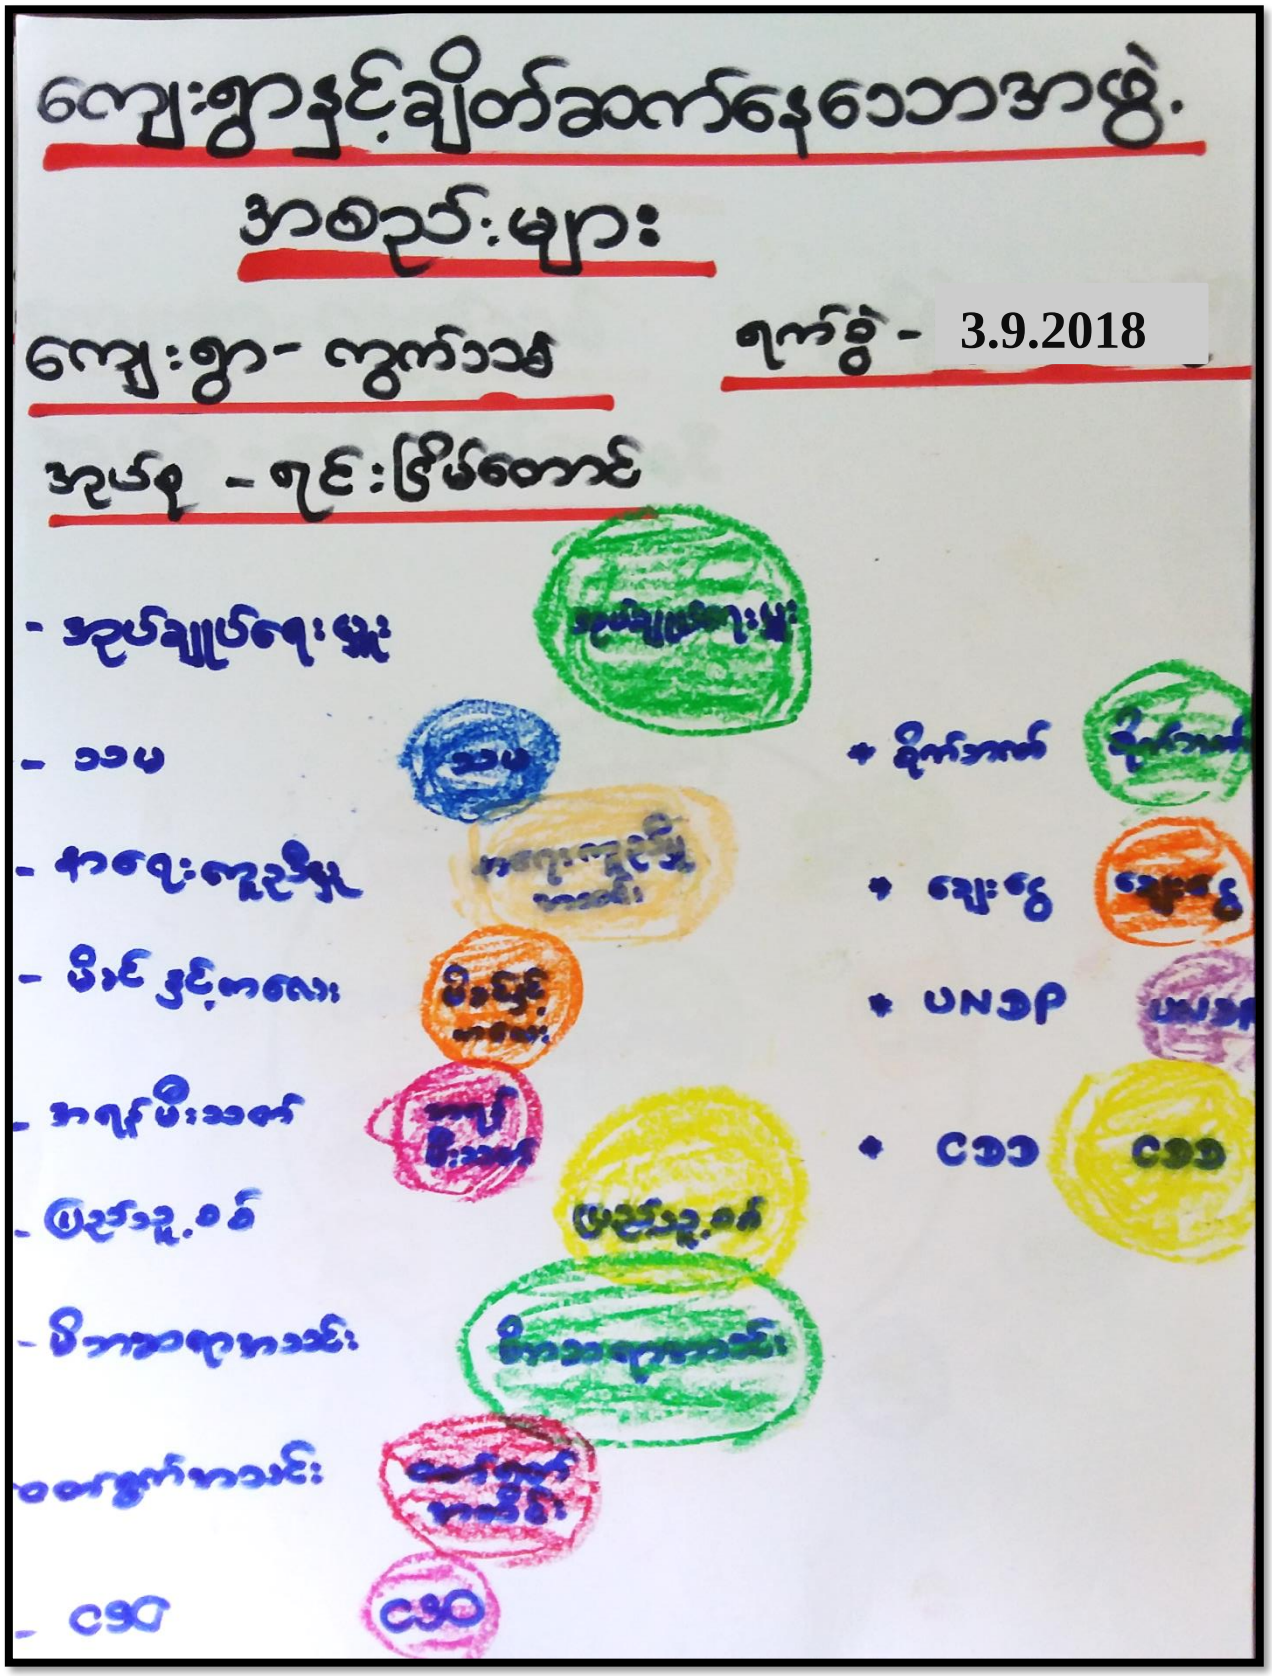
ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်နေသောအဖွဲ့
အစည်းများ
ကျေးရွာ- ကွက်သစ်
ရက်စွဲ - 3.9.2018
အုပ်စု - ၅၉း ဖြိုမ်တောင်
- အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
- သာမ
- နာရေးကူညီရေး
- မိန်းနှင့်ကလေး
- အရွယ်မီးသတ်
- ပြည်သူ့စစ်
- မိဘအစားထိုးအသင်း
- စောင့်ကြပ်အသင်း
- CSO
+ ဦးကြီးအတွက်
+ ဘုန်းတော်
+ UNDP
+ CSO

ပတ်ပုံစံ


ကျေးရွာ၊ကွက်သစ် ရက်စွဲ - 3.9.2018

အုပ်စု - ရင်းပြိုမ်တောင်



ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ရင်းပြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

၆။ ဗင်းပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

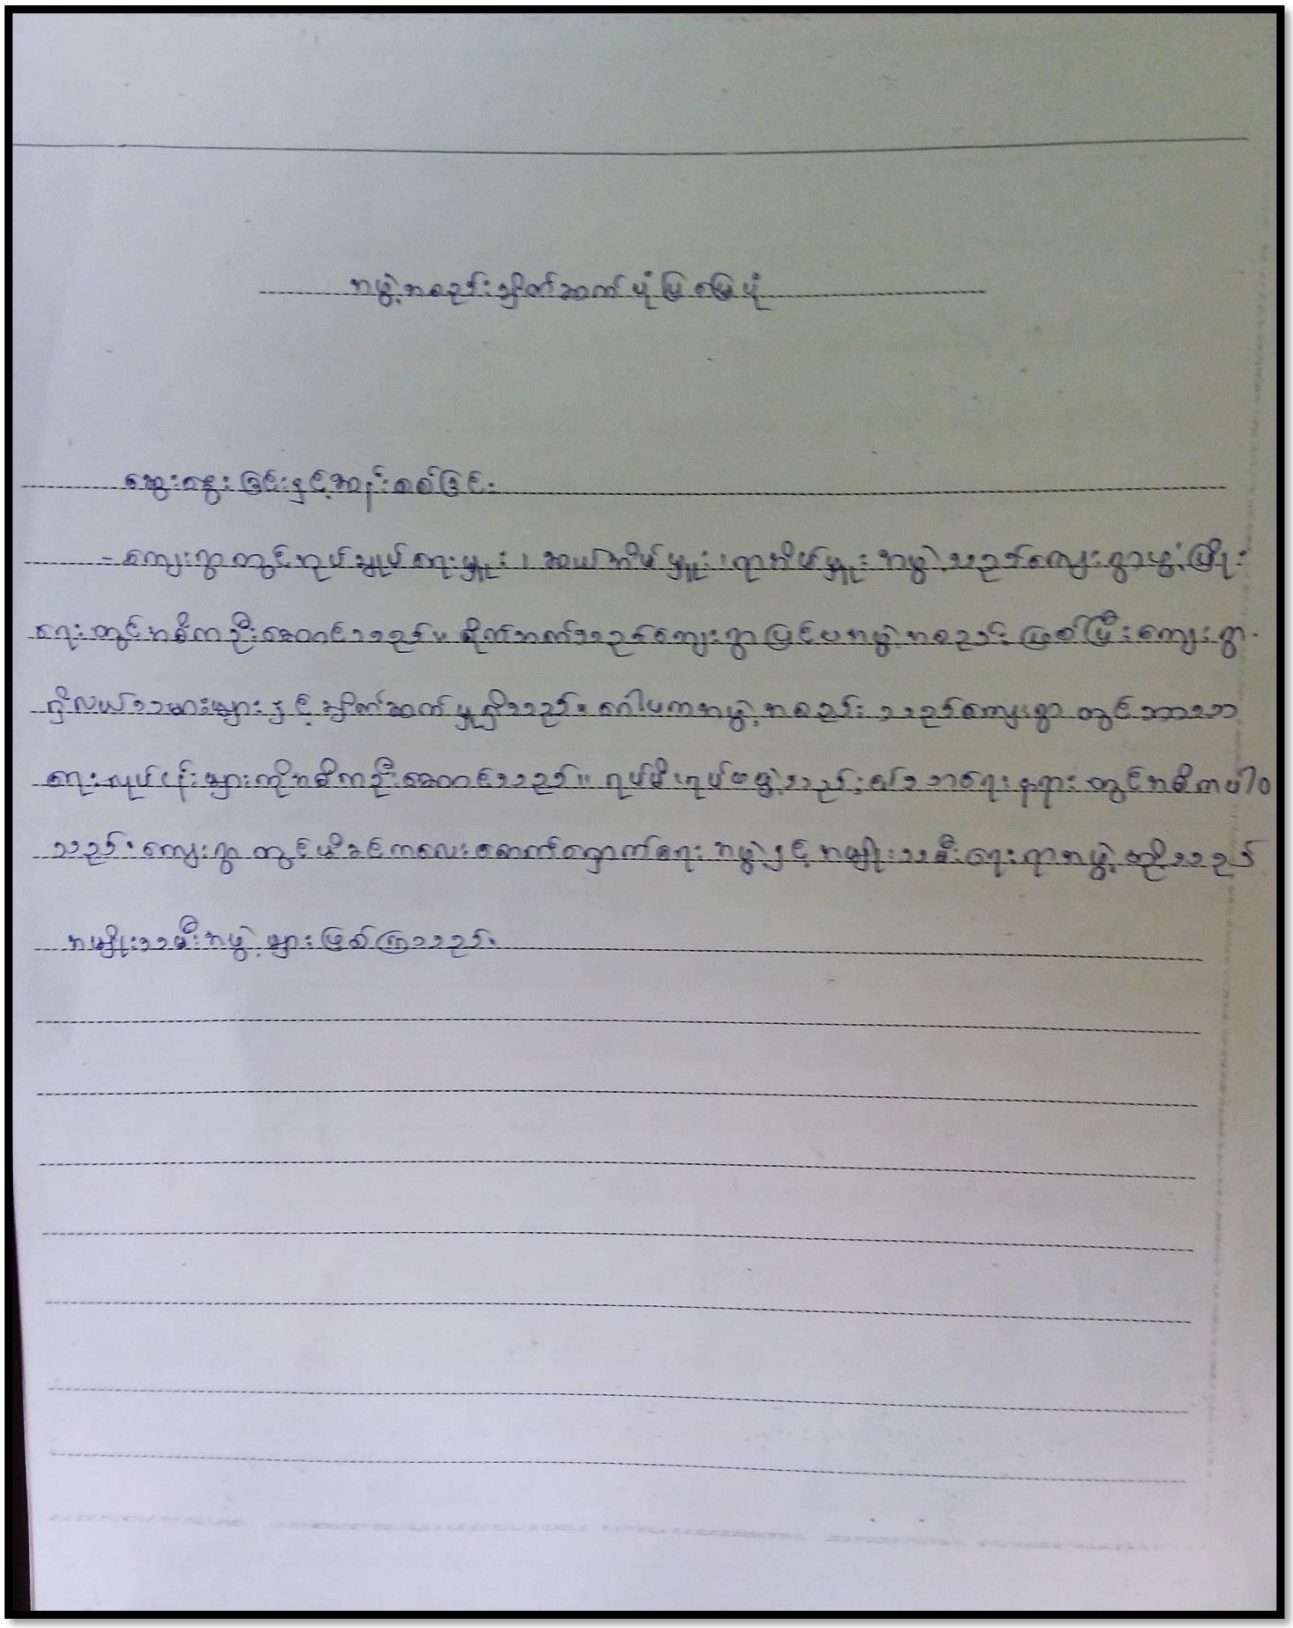


၇။ ကော်မတီဂင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

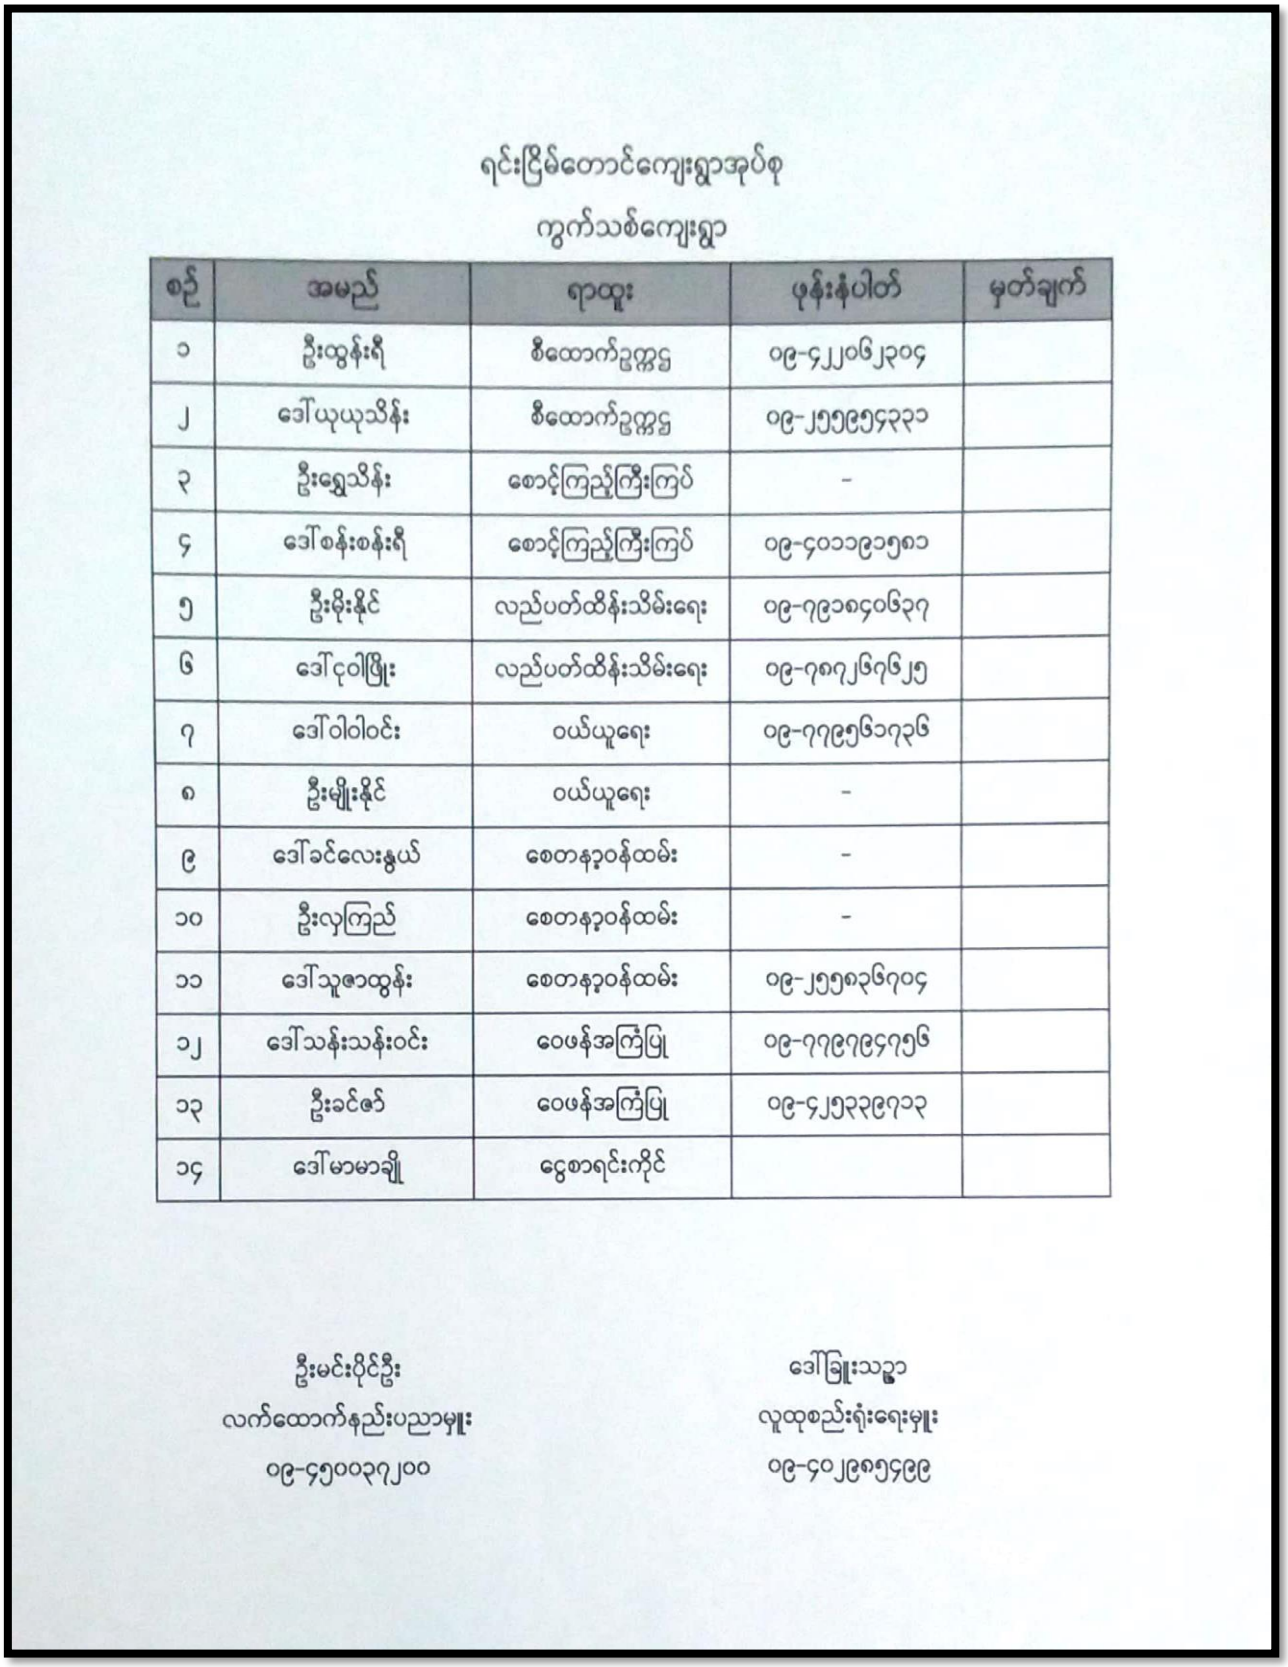

ရင်းငြိမ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု

ကွက်သစ်ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးထွန်းရီ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၄၂၂၀၆၂၃၀၄	
၂	ဒေါ်ယုယုသိန်း	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၂၅၅၉၅၄၃၁၁	
၃	ဦးရွှေသိန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	-	
၄	ဒေါ်စန်းစန်းရီ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၀၉-၄၀၁၁၉၁၅၈၁	
၅	ဦးမိုးနိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၇၉၁၈၄၀၆၃၇၇	
၆	ဒေါ်ဝါဖြိုး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၇၈၇၂၆၇၆၂၅	
၇	ဒေါ်ဝါဝါဝင်း	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၇၇၉၅၆၁၇၃၆	
၈	ဦးမျိုးနိုင်	ဝယ်ယူရေး	-	
၉	ဒေါ်ခင်လေးနွယ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	-	
၁၀	ဦးလှကြည်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	-	
၁၁	ဒေါ်သူဇာထွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၂၅၅၈၃၆၇၀၄	
၁၂	ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း	ဝေဖန်အကဲဖြတ်	၀၉-၇၇၉၇၉၄၇၅၆	
၁၃	ဦးခင်ဇော်	ဝေဖန်အကဲဖြတ်	၀၉-၄၂၅၃၃၉၇၁၃	
၁၄	ဒေါ်မာမာချို	ငွေစာရင်းကိုင်		

ဦးမင်းဝိုင်ဦး
လက်ထောက်နည်းပညာမှူး
၀၉-၄၅၀၀၃၇၂၀၀

ဒေါ်ခြူးသဥ္ဇာ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
၀၉-၄၀၂၉၈၅၄၉၉

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

၈။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ






ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

ကွက်သစ်ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးနိုင်နိုင်ဦး	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၆၁၇၁၄၄၁	
၂	ဦးညီညီထွေး	အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၂၆၂၀၈၂၆၅၅	
၃	ဒေါ်ဝါဝါဝင်း	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-၇၇၉၅၆၁၇၃၆	
၄	ဦးတင်ညွန့်	စာရင်းကိုင်	၀၉-၄၂၅၃၀၄၆၀	
၅	ဦးမောင်ထွေး	သော့ကိုင်-၁	၀၉-၄၂၅၃၃၉၆၉၁	
၆	ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ချို	သော့ကိုင်-၂	၀၉-၆၆၁၈၇၄၄၂	
၇	ဒေါ်ခင်လေးနွယ်	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၂၅၅၈၃၆၆၁၇	

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

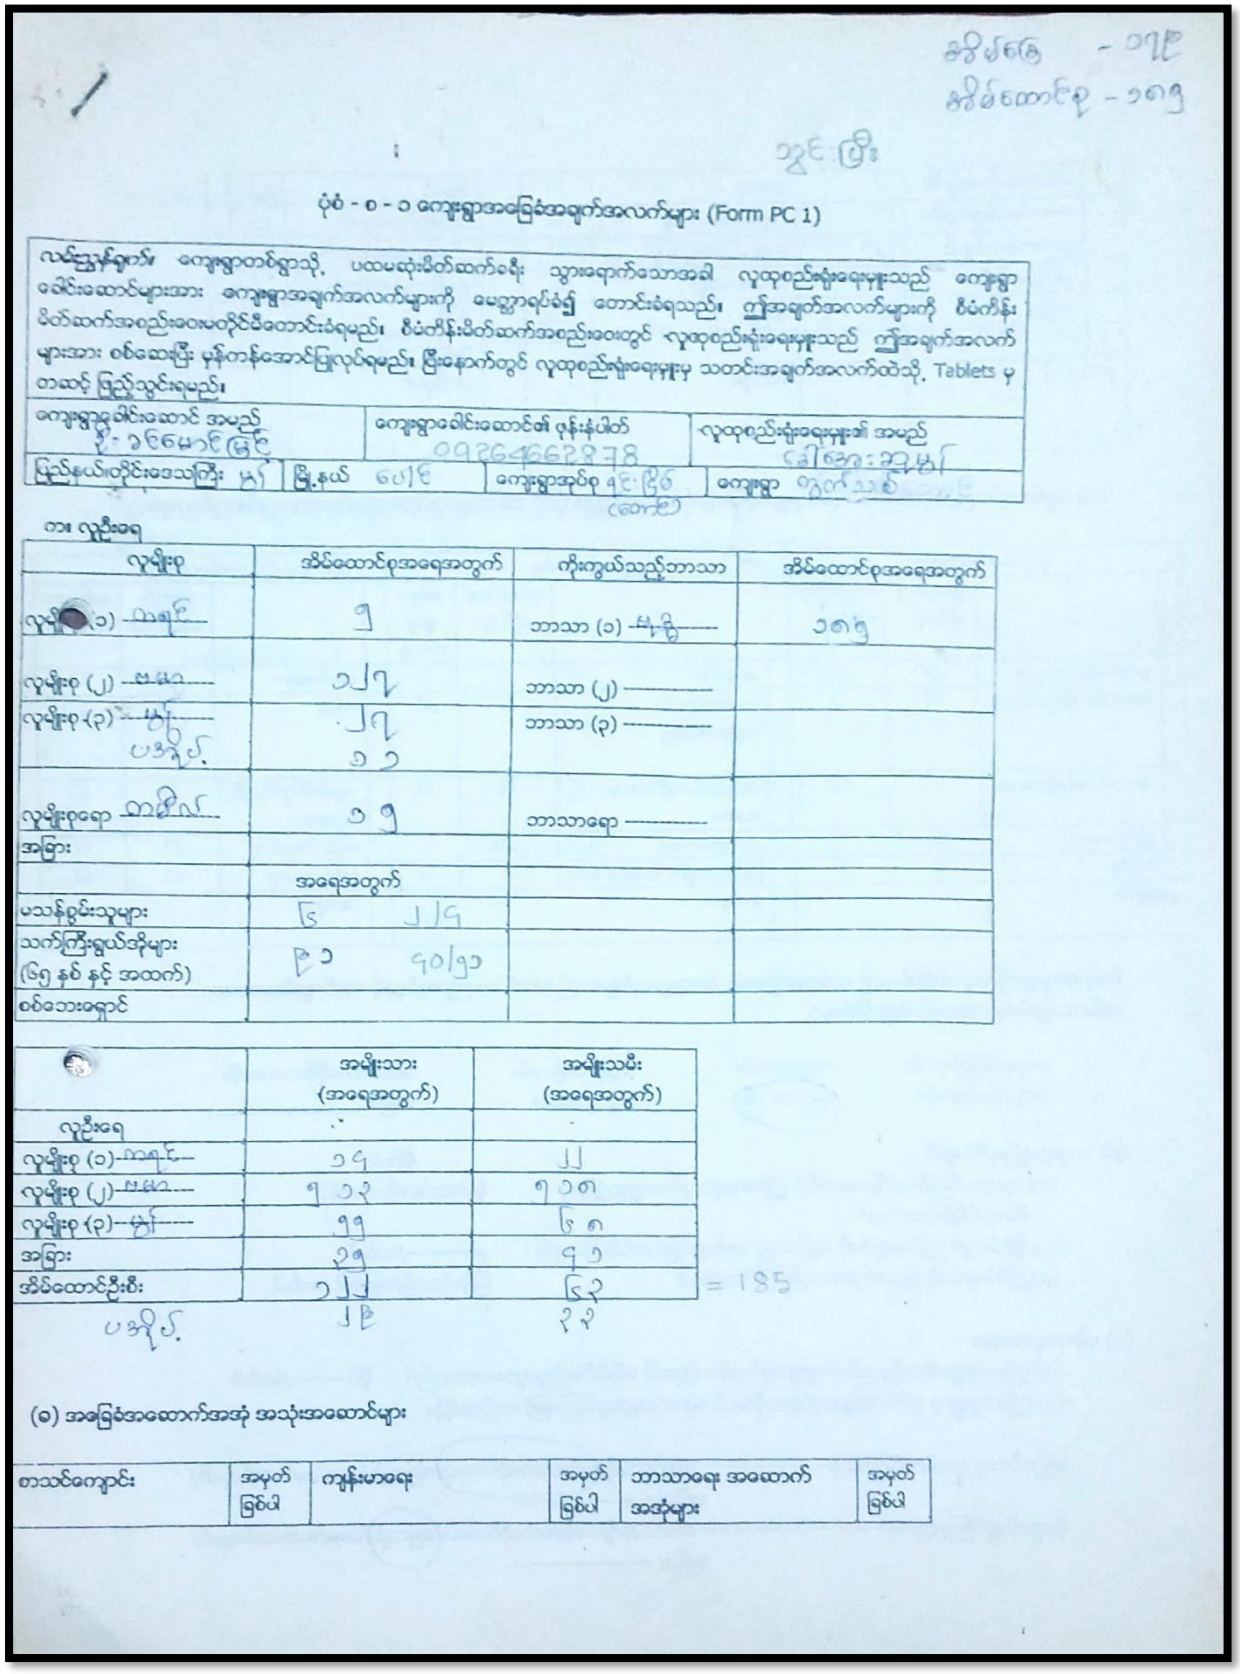

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးနှစ်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဲရိုး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရပ်ခဲ့၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ/ခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရင်းခြေ (ဆောင်)	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)	၅	ဘာသာ (၁)	၁၈၅
လူမျိုးစု (၂)	၁၂၇	ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)	၂၇	ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော	၁၅	ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆ ၂၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၁ ၇၀/၅၁		
စစ်ဘေးဒဏ်ရှာင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)	၁၄	၂၂
လူမျိုးစု (၂)	၅၁၃	၅၁၈
လူမျိုးစု (၃)	၅၅	၆၈
အခြား	၃၅	၄၁
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၂၂	၆၃ = 185

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		ဓလေ့	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကွန်မြူနတီစင်တာ	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကွန်မြူနတီစင်တာနဲ့ဆို	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးခန်းခန်း	☐		ရေစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဂလီ	☐
							အခြား	☐
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	မြင်သွေးကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

	ဝိုင်းပါ
(၁) လူထုတပ်ဦးပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?	ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?	နှစ်-------/မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?	ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓလေ့အကျင့်အဓေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? နိုင်-------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဘုံးပြ

(၂) ရိုက်ဘက်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေA ပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ✓ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် A မည် ဦး ခင်မောင်ဖြစ်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 19.2.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး A မည် ဒေါ်အေး အုပ်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 19.2.2017

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

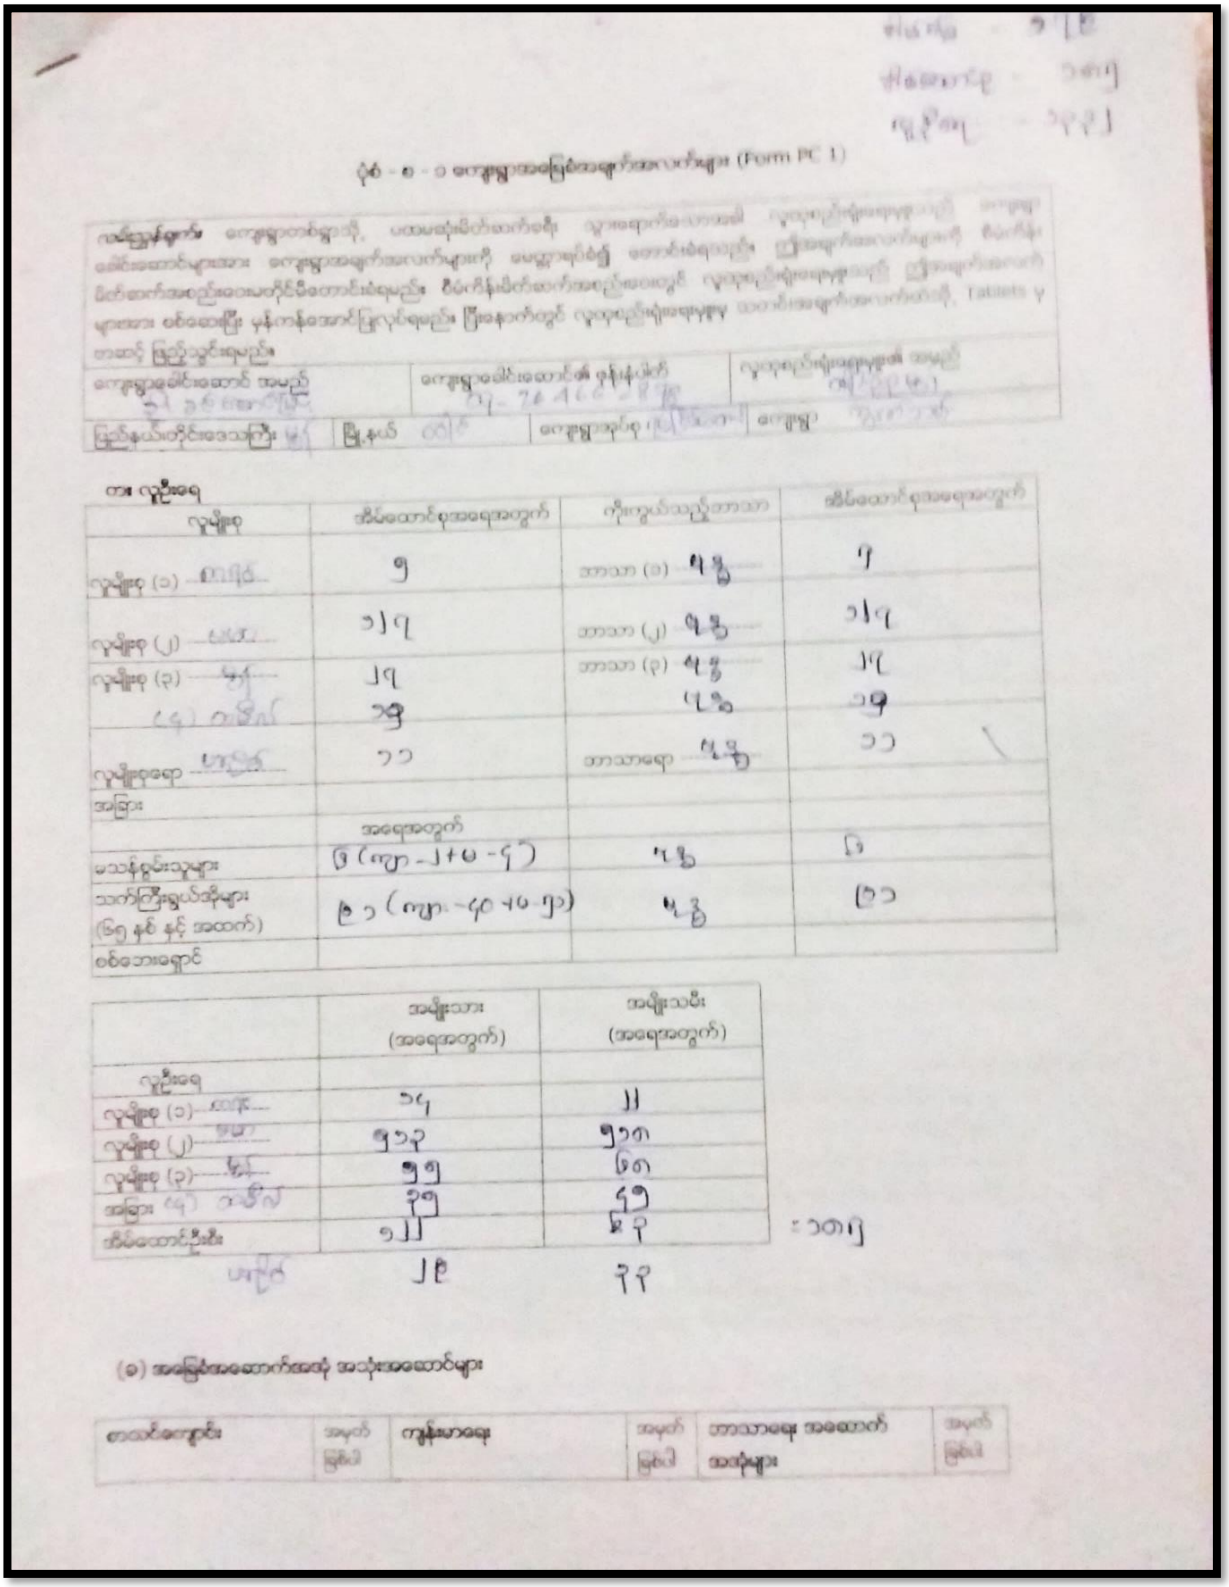

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာမိခင်းဆောင် အမည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်

လူဦးရေ

ကျေးရွာ

အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်


အမျိုးသား (အရေအတွက်)

အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကျန်းမာရေး

အာသာရေး အဆောက်အအုံများ

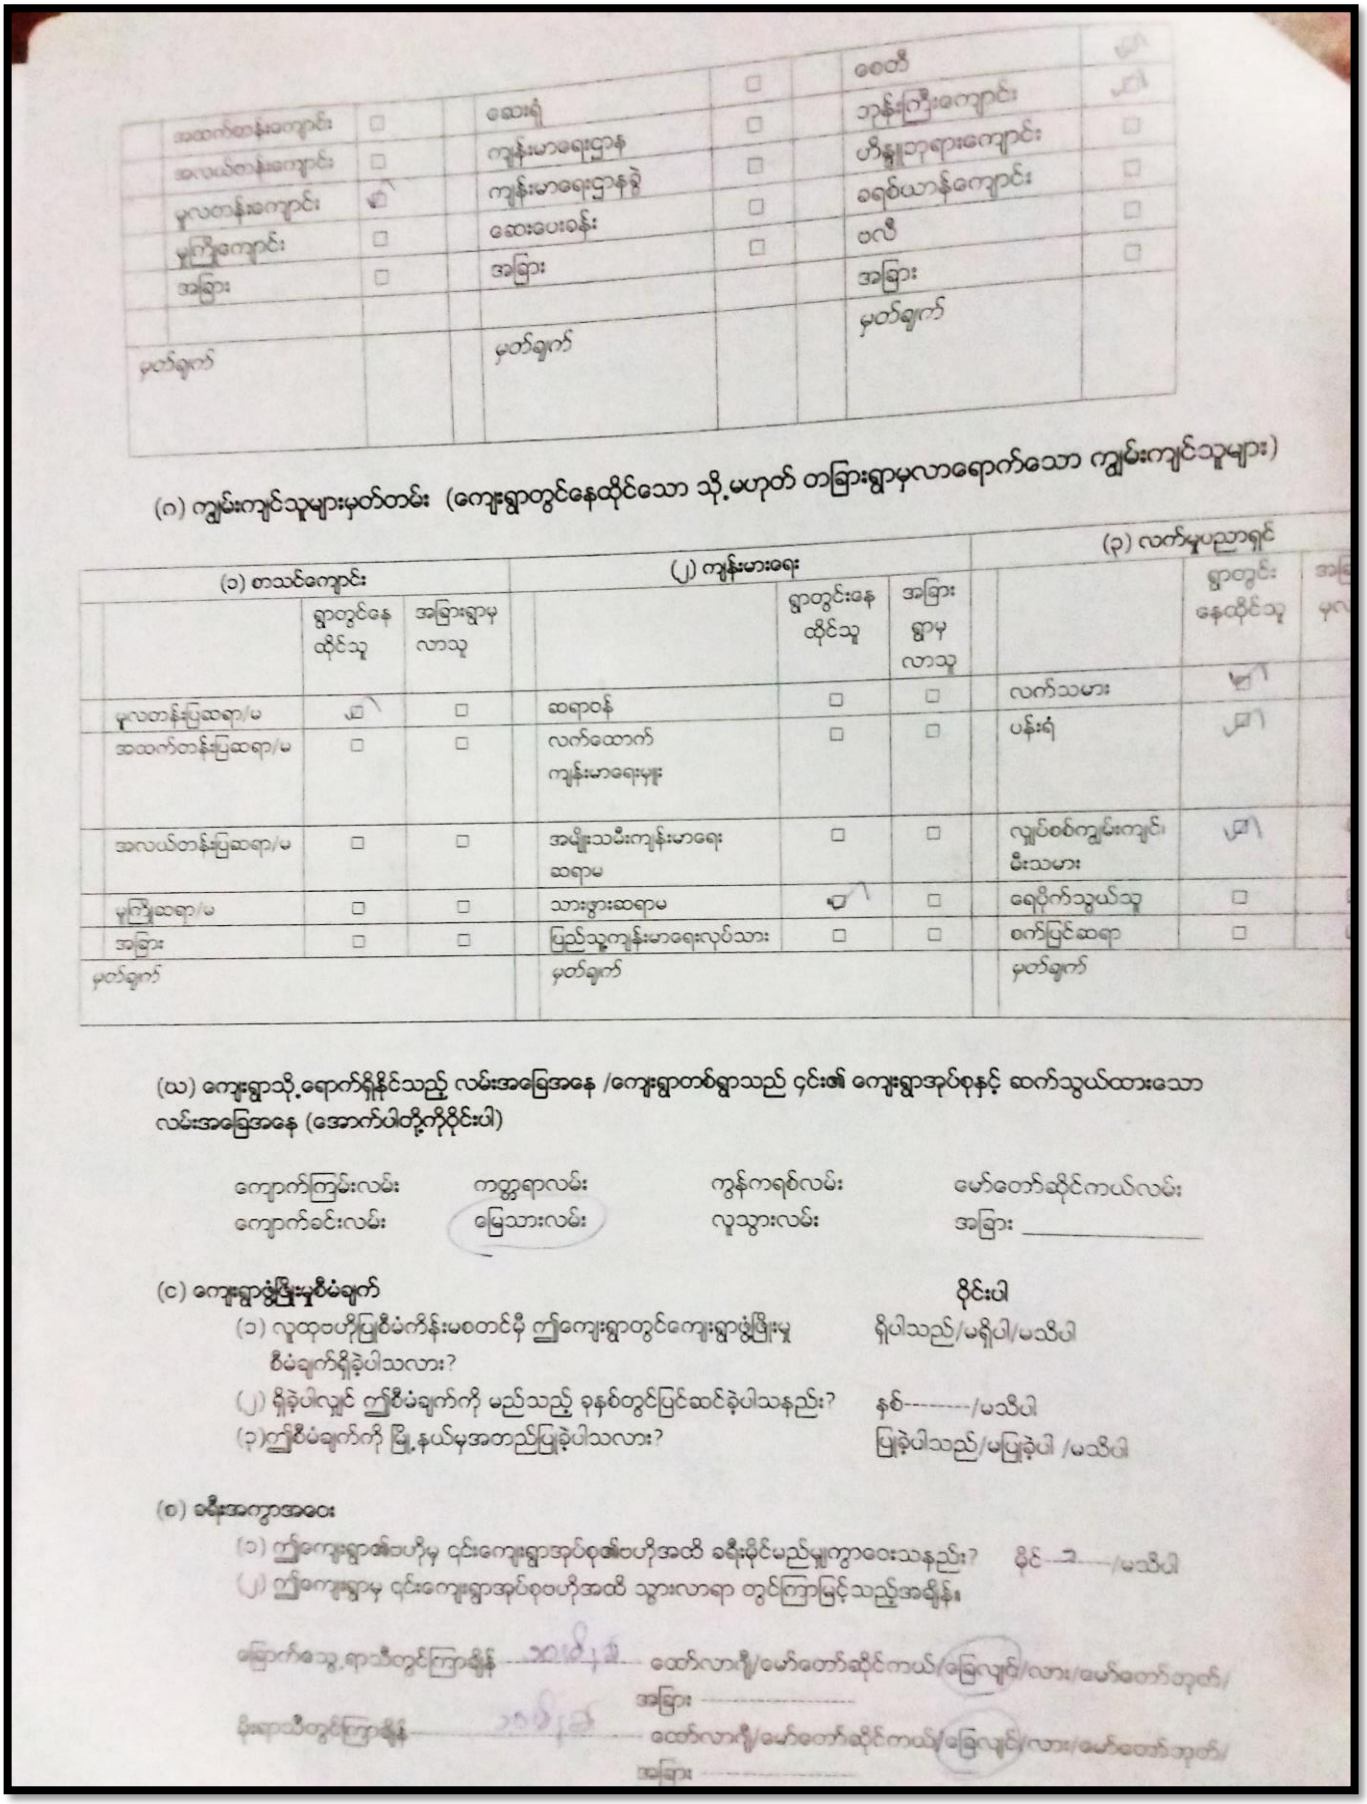

အထက်တန်းကျောင်း	□	ဆေးရုံ	□	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
မူကြိုကျောင်း	□	ဆေးခန်း	□	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
အခြား	□	အခြား	□	ဗလီ	□
				အခြား	□
မတ်ချက်		မတ်ချက်		မတ်ချက်	

(ဂ) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားမှ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	□	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျမ်းကျင်၊ မီးသမား	✓	
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာမ	✓	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	□	
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	□	
မတ်ချက်			မတ်ချက်			မတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟို/ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) စီမံးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟို မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ စီမံးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း

ခြေလျင်စသွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀၀ မိနစ် ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅၀ မိနစ် ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ .....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဘဝ.....

(၂) ရည်ကုန်းဘုရား.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

(ဒေါ်မောင်မြင့်)
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
(ရုံးပြဋ္ဌာနတော်)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ပေါင်းကြီး

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်


လက်မှတ် နေ့စွဲ ၇.၁၁.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဝင့်မှာ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၇.၁၁.၁၇

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

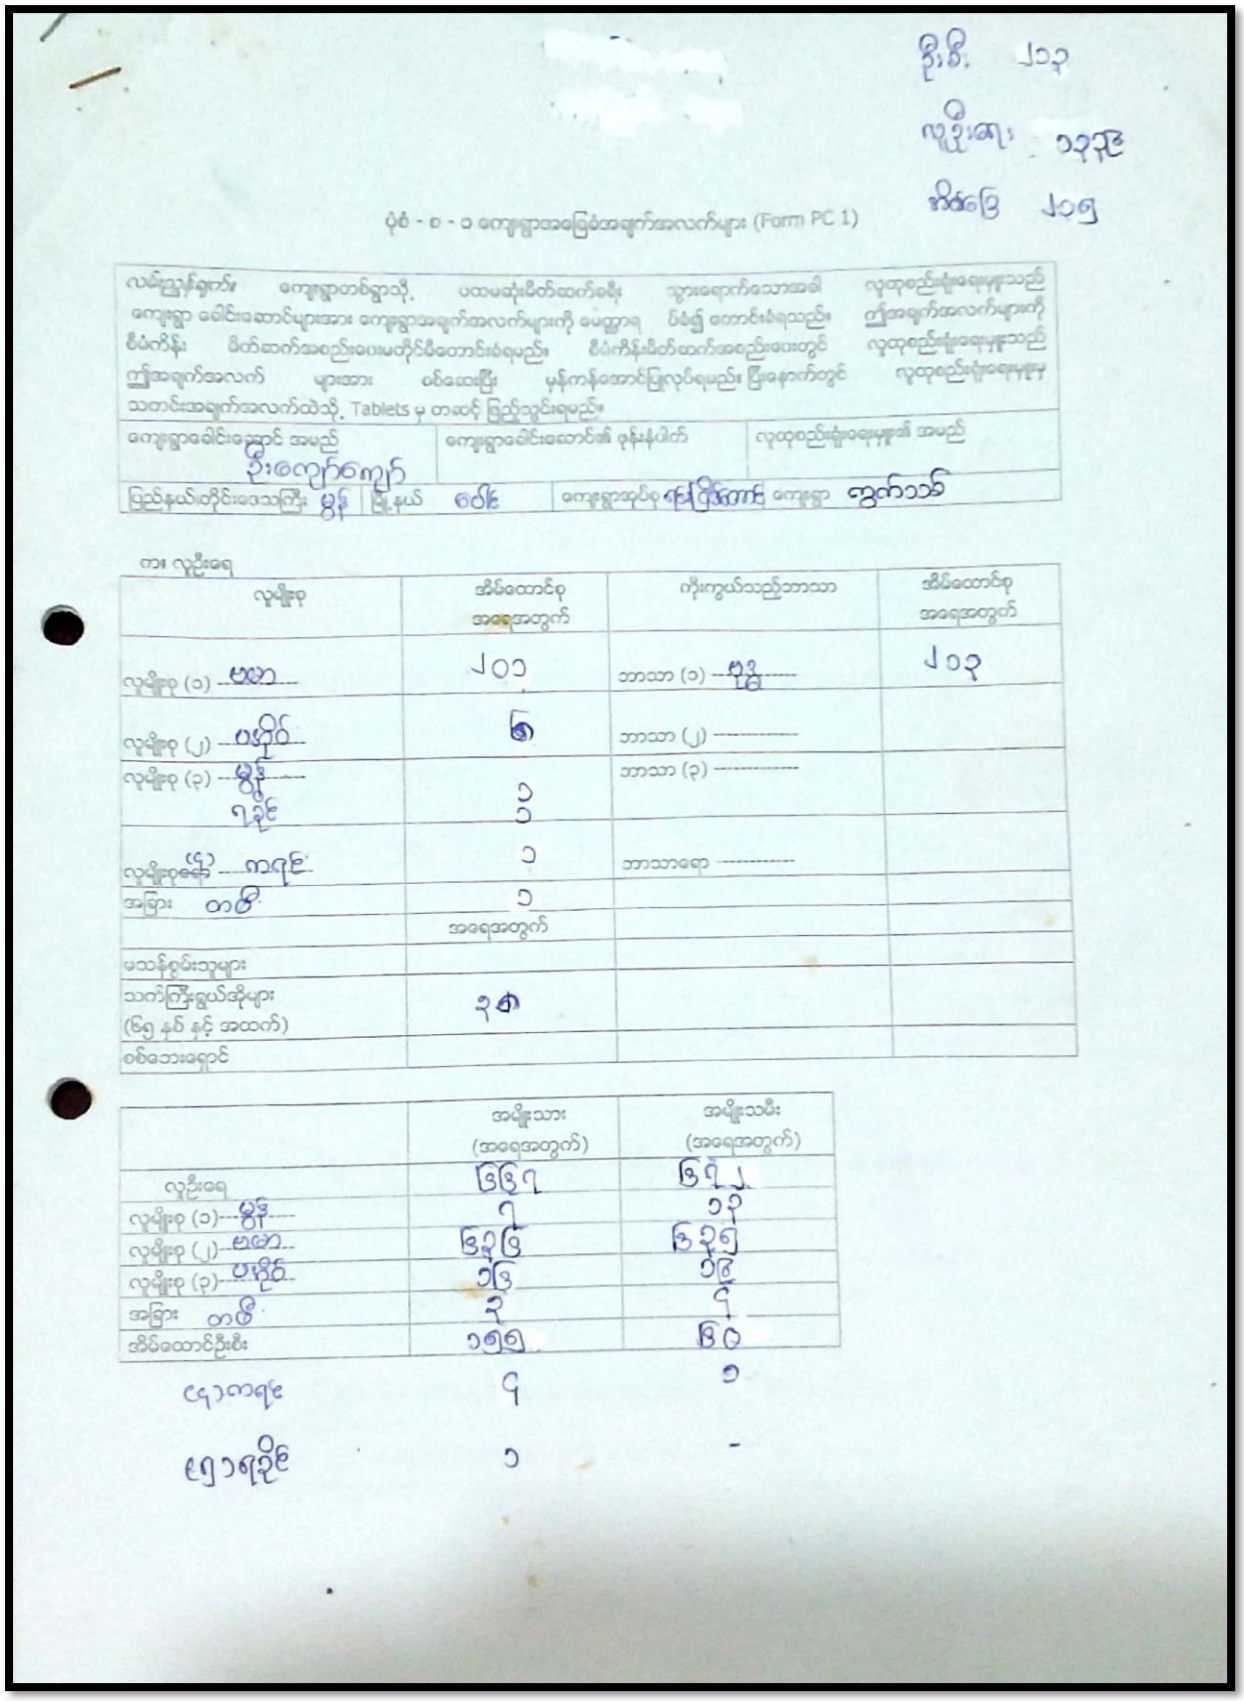

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဲးစီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ် ပံ့ပိုး ကောင်းစဲးရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းစဲးရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးစကျာ်ကျော်		

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မွန် ခြံနယ် ၀၁၆ ကျေးရွာအုပ်စု ရန်ပြိုအောက် ကျေးရွာ ကွက်သစ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မဟာ	၂၀၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၀၃
လူမျိုးစု (၂) ပအိုဝ်	၆	ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃) မွန် ရခိုင်	၁	ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုခြေ ကရင်	၁	ဘာသာရေး	
အခြား တဖို	၁		
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၈		
စစ်ဘေးဒုက္ခသင့်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၆၇	၆၇၂
လူမျိုးစု (၁) မွန်	၇	၁၃
လူမျိုးစု (၂) မဟာ	၆၃၆	၆၃၅
လူမျိုးစု (၃) ပအိုဝ်	၁၆	၁၉
အခြား တဖို	၃	၄
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၅၅	၆၀
ငရဲကရင်	၄	၁
ရှာရဲရှိဝ်	၁	-

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

(၈) အခြေခံအဆောက်အတုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဂလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၇) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အဖျားသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☑	မြေသွေးလမ်းပြ	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝင်ပါဝင်မှုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၀.၀၀/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---- ၀ ---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ၁၀း၀၀

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---- ၀ ---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ၁၀း၀၀

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ ရှိပါသည် □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမဝိုင်ဒီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) သမဝါဒိုက်ကာကော်

(၂) ပါမောက္ခ စပါး

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ကျော် ၀၆၁၁၁၀၀၀၀၃

လက်မှတ် နေ့ ၉.၅.၁၉ (ထ၊၁၁၁၁၁၅)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခြားဝါဝိုင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၉.၅.၂၀၁၈

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

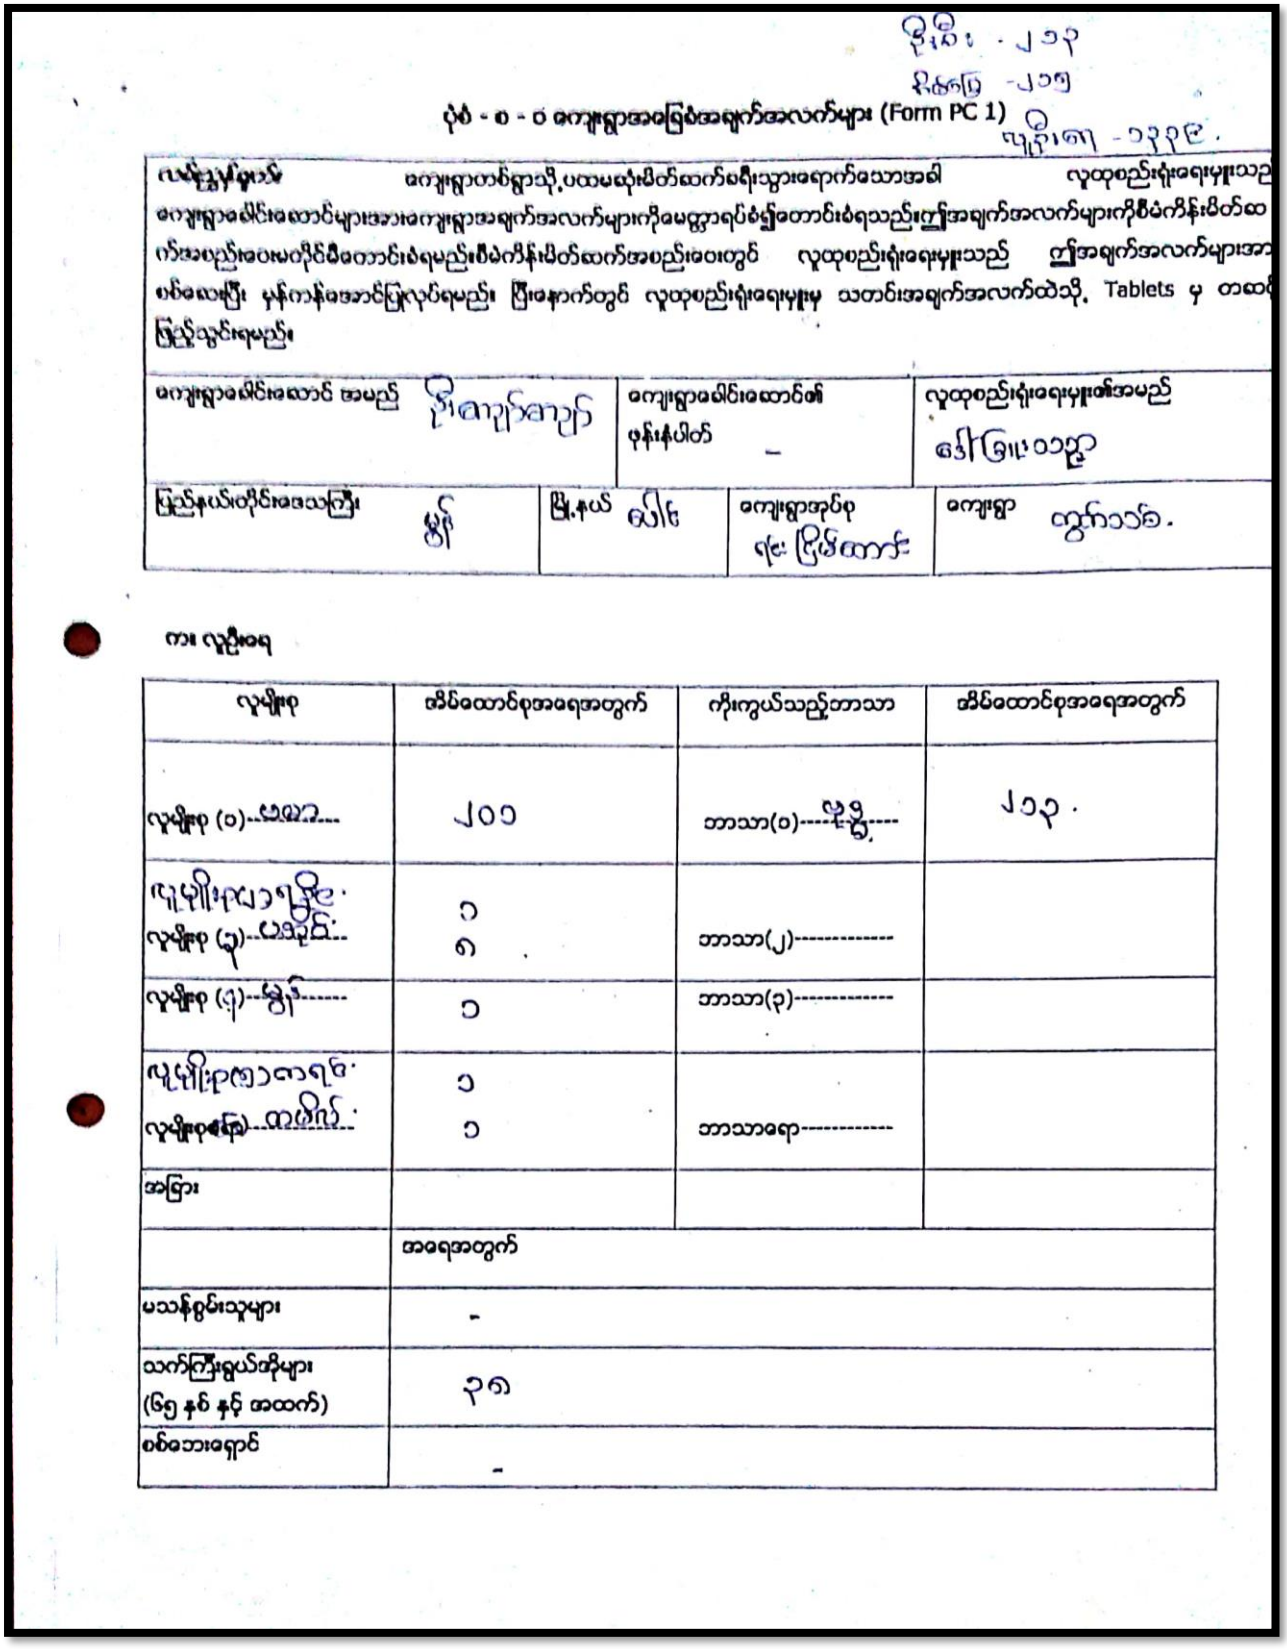

ပုံစံ - ၈ - ၀ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာလမ်းညွှန်မှူးအမည်		ကျေးရွာဖွဲ့စည်းပုံအဆင့်	
ကျေးရွာလေးနက်ရေးအဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်		ကျေးရွာလေးနက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဖုန်းနံပါတ်	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး		မြို့နယ်	
ကျေးရွာအုပ်စု		ကျေးရွာ	

က။ လူဦးဝေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၀)----		ဘာသာ(၀)----	
လူမျိုးစု (၂)----		ဘာသာ(၂)----	
လူမျိုးစု (၃)----		ဘာသာ(၃)----	
လူမျိုးစု(ရောရှိ)----		ဘာသာရော----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အဝေးအတွက်)	အမျိုးသမီး(အဝေးအတွက်)	စုစုပေါင်းအဝေးအတွက်
လူဦးရေ	၆၆၇	၆၇၂	၁၃၃၉
လူမျိုးစု (၁)-မြို	၇	၁၃	၂၀
လူမျိုးစု (၂)-ဗမာ	၆၃၆	၆၃၅	၁၂၇၁
လူမျိုးစု (၃)-ယင်းလေး	၁၆	၁၉	၃၅
ဆရာ/ဆရာမ	၃	၄	၇
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၅၃	၆၀	၂၁၃
လူမျိုး(၅)ဝါးခြင်း	၄	၁	၅
လူမျိုး(၆)ရခိုင်	၁	-	၁

(ခ)အဝေးအထောက်အကူ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ခန်းများ	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	အားသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းခန်းများ	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းခန်းများ	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းခန်းများ	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုခန်းများ	☑	ဆေးခန်းငယ်	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၇)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဝကျူးရွာတွင်ဝန်ထိုင်ဝသော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) ဆေးခန်းကုသမှု			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်ဝန်ထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းဝန်ထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းဝန်ထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလဆန်းကြယ်ဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းကြယ်ဆရာ/မ	☑	☐	လက်ဝဲဆာက် ကျန်းမာရေးမှူး	☑	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းကြယ်ဆရာ/မ	☑	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာဝရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☑	☐
မွေးကြယ်ဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၈) ဝကျူးရွာသို့ဝရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ဝကျူးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်းဒေသကျူးရွာဆုဝရုန်း ဆက်သွယ်ထားဝသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္ထရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခဲလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၉) ဝကျူးရွာပွဲပြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤဝကျူးရွာတွင်ကျူးရွာပွဲပြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) လိုအပ်ကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၄င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိလိုရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၂၃၄/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----------ဈေးလာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ၁၀၂၀၃ မိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----------ဈေးလာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ၁၀၂၀၅ မိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ဒေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☑မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့ပြီးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၁၁၆ ခြင်္သေ့ဘက်.

(၂) UNDP.

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ကျော်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀.၅.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခြိုးဘဉာ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀.၅.၂၀၁၅

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

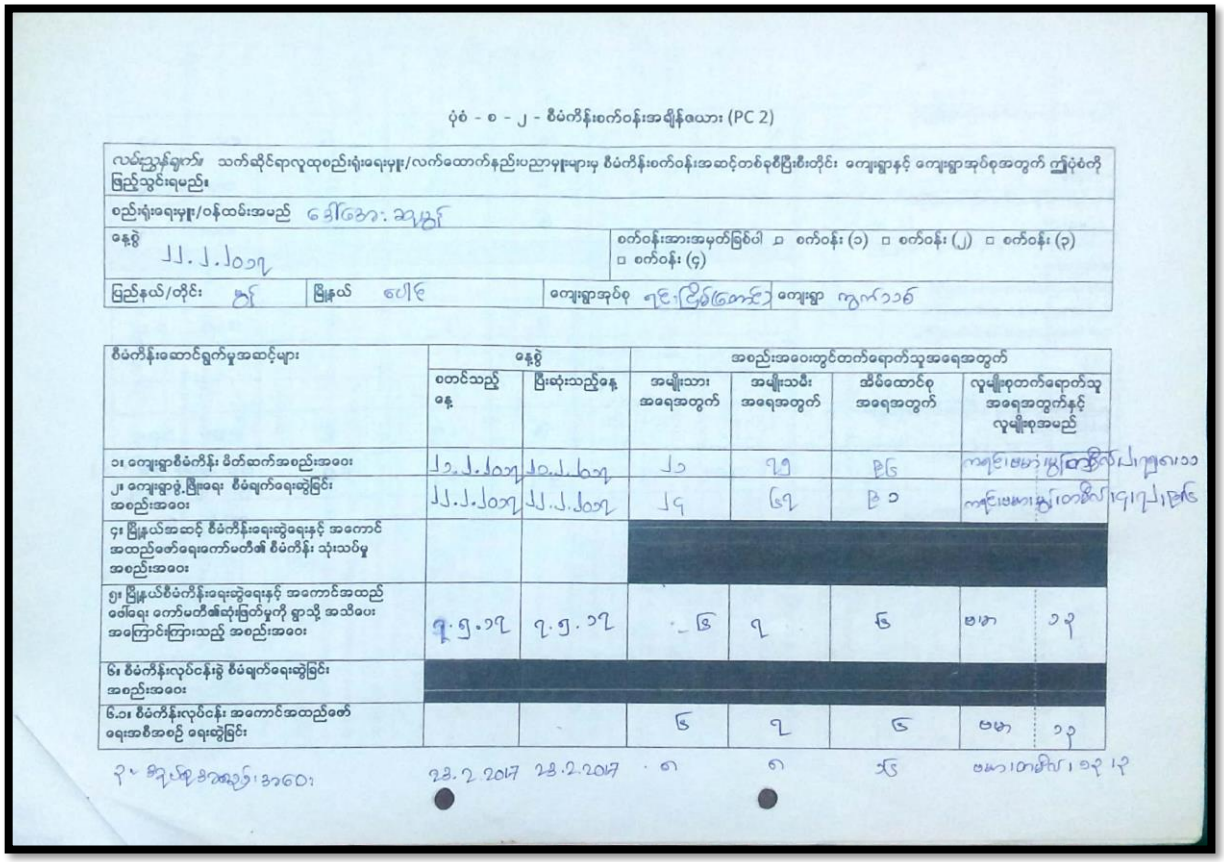

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခေါ: ဆုပွတ်			
ခရိုင် ၂၂.၂.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
မြို့နယ်/တိုင်း ဗွဲ့	မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျင်းပြိမ်(ကောင်း)	ကျေးရွာ ကွက်သစ်


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန့်မှန်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်ခန့်	ပြီးဆုံးသည့်ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၂.၂၀၁၇	၂၁.၂.၂၀၁၇	၂၁	၃၅	၅၆	ကရင်၊ဗမာ၊ပအို(တအိလဲ)၊ကချင်၊ဝ	
၂။ ကျေးရွာခွဲ့ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၂.၂၀၁၇	၂၂.၂.၂၀၁၇	၂၄	၆၇	၈၁	ကရင်၊ဗမာ၊အို(တအိလဲ)၊ကျ၊ကချင်	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းခရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး							
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းခရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၅.၁၇	၇.၅.၁၇	၂၆	၇	၆	ဗမာ	၁၃
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း			၆	၇	၆	ဗမာ	၁၃

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၀		၆	၇	၆	ဗမာ	၁၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း			၆	၇	၆	ဗမာ	၁၃
၆.၄။ မြင်/ထိန်း အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း			၆	၇	၆	ဗမာ	၁၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်			၆	၇	၆	ဗမာ	၁၃
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး			၆	၇	၆	ဗမာ	၁၃
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၆.၇.၁၇	၁၆.၇.၁၇	၅၇	၆၂	၉၀	ဗမာ၊တအို၊ ၁၆၊ ပအို၊ ၁၀၊ ၇	၁၂

ကရင် ၄


ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ရင်းပြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

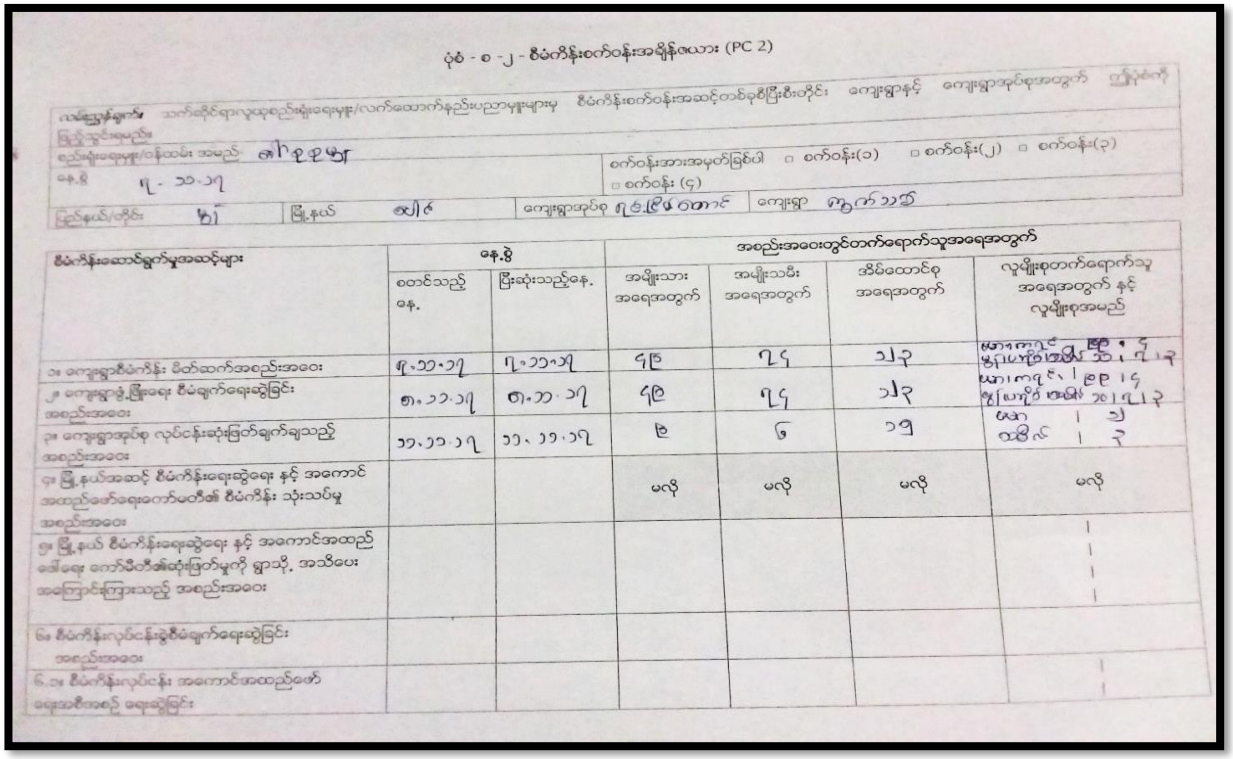


ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ရက်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်ရက်	ပြီးဆုံးသည့်ရက်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်အစည်းအဝေး	၇.၁၁.၁၇	၇.၁၁.၁၇	၅၉	၇၄	၁၂၃	ဖလာကျိုင်း ၁၀၊ ၇၊ ၃ ပအိုဝ်း ၁၀၊ ၇၊ ၃ ဗမာ ၁၀၊ ၇၊ ၃
၂။ ကျေးရွာခွဲဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၁၇	၈.၁၁.၁၇	၅၉	၇၄	၁၂၃	ဖလာကျိုင်း ၁၀၊ ၇၊ ၃ ပအိုဝ်း ၁၀၊ ၇၊ ၃ ဗမာ ၁၀၊ ၇၊ ၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၁၁.၁၇	၁၁.၁၁.၁၇	၉	၆	၁၅	ဖလာ ၁ ၃ ထိုင်း ၁ ၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

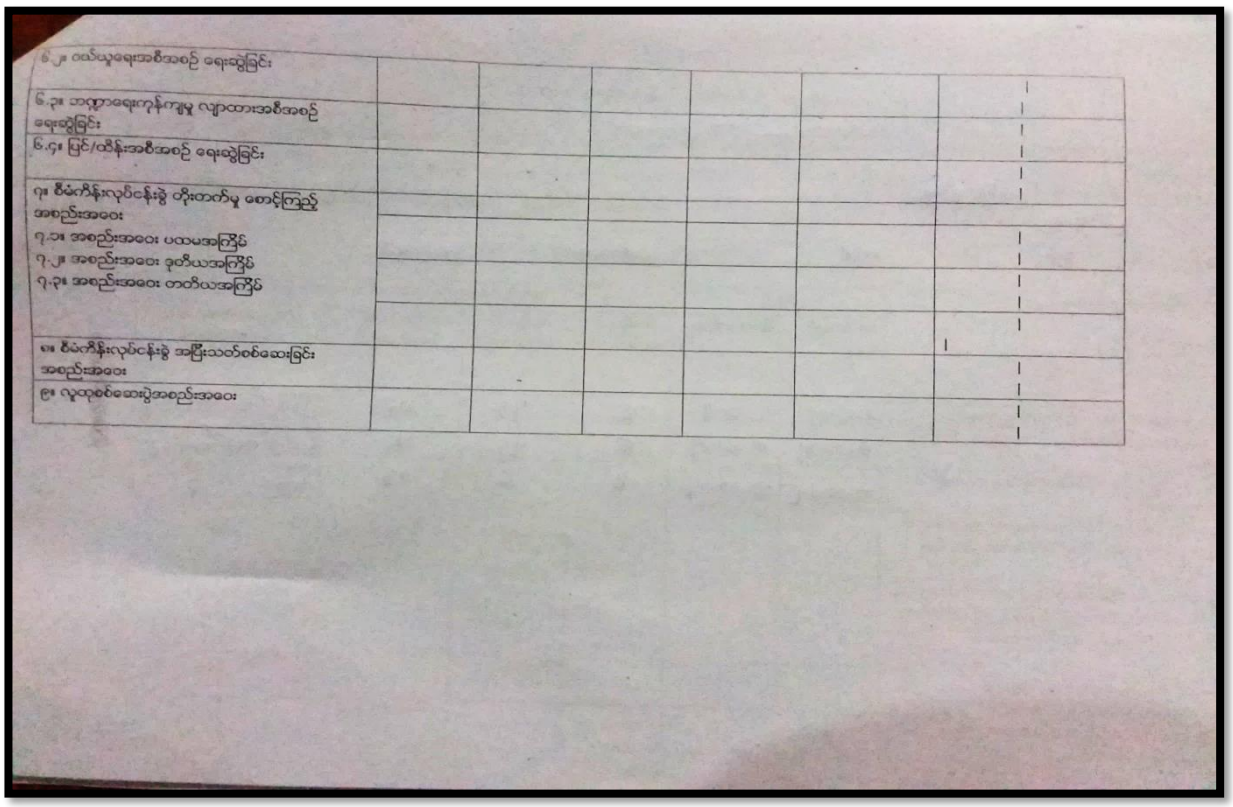

၆.၂။ ဝန်ယမူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

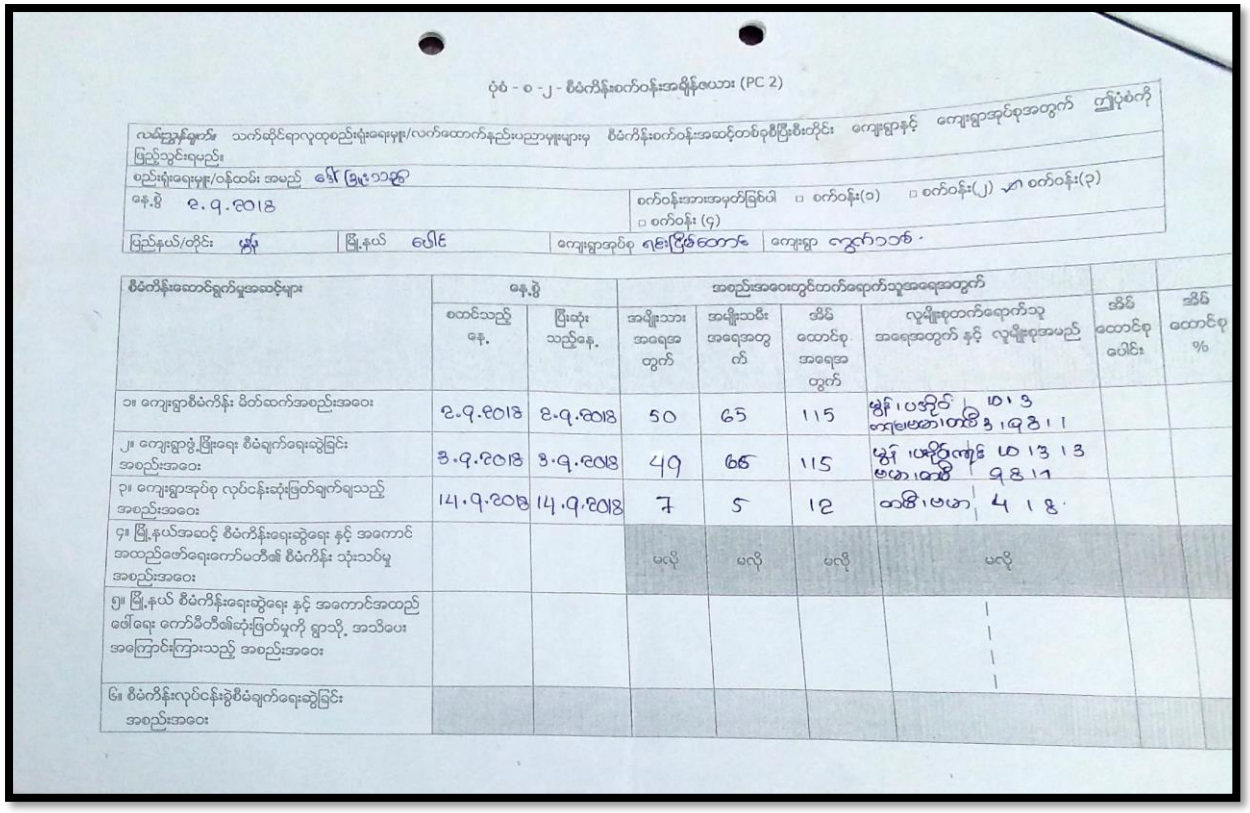

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မှုစာတမ်း သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။


စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် ခြုံသာဆွေ

နေ့စွဲ ၉.၇.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

မြည့်နယ်/တိုင်း ဖွဲ့ မြို့နယ် ပေါင် ကျေးရွာအုပ်စု ရေးပြိတ်တောင် ကျေးရွာ ကွင်းသစ်


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၇.၂၀၁၈	၉.၇.၂၀၁၈	50	65	115	ဖွဲ့၊ ပအိုဝ် ၊ ၁၀၊ ၃ ကရင်မအား၊တအို ၃၊၀၃၊၁		
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၇.၂၀၁၈	၃.၇.၂၀၁၈	49	66	115	ဖွဲ့၊ ပအိုဝ်ကျိုး ၁၀၊၁၃၊၁၃ မအား၊တအို ၉၃၊၇		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၄.၇.၂၀၁၈	၁၄.၇.၂၀၁၈	7	5	12	တအို၊ ဗမာ၊ 4 ၊ 8		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								

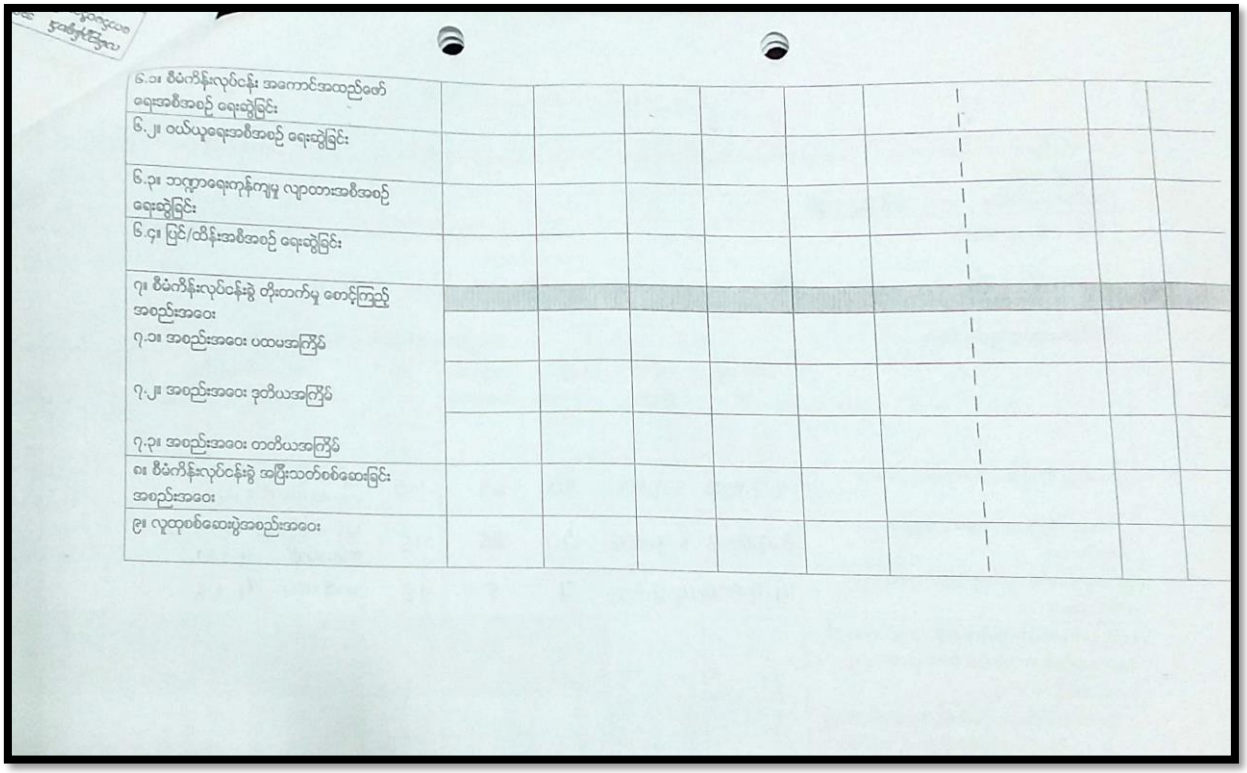

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ရင်းပြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

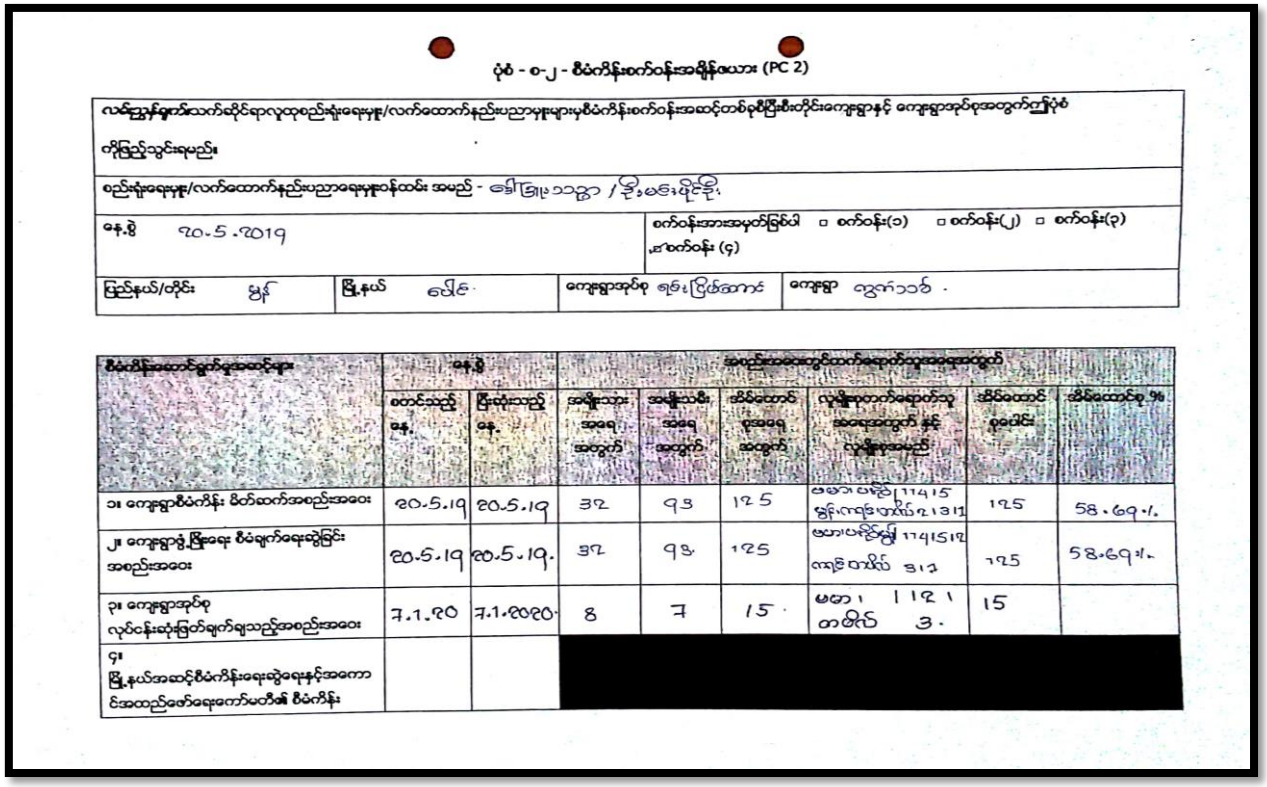

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်မှုကော်သော်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှုန်/လက်ထောက်နည်းပညာမှုများမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးကိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှုန်/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှုစဝန်ထမ်း အမည် - ခြေခြေ(ပုသဏ္ဌာ / ခြိုးစင်းမိုင်ခြိုး


နေ့စွဲ ၃၀.၅.၂၀၁၄	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၃)

မြို့နယ်/တိုင်း မန်	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရစ်းပြိတ်ဆောင်း	ကျေးရွာ ညွှန်ကသစ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အလုပ်အဆင့်ဆင့်အတွက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	ဝိုင်ဖောင် စုစုပေါင်း အရေအတွက်	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ အဖွဲ့အစည်း နှင့် လုပ်ငန်းအမည်	ဝိုင်ဖောင် စုစုပေါင်း	ဝိုင်ဖောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၅.၁၄	၃၀.၅.၁၄	၃၇	၉၃	၁၃၅	ဖဆလ ပမိုင်ခြံ ၁၇၄၁၅ ခြံ့ကရင်းတာလိုင် ၃၊၁၃၊	၁၃၅	၅၈.၆၅.၁.
၂။ ကျေးရွာခွဲဝေရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၅.၁၄	၃၀.၅.၁၄.	၃၇	၉၃	၁၃၅	ဖဆလ ပမိုင်ခြံ ၁၇၄၁၅၊၃ ကရင်တာလိုင် ၃၊၃	၁၃၅	၅၈.၆၅၊၁.
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀	၇.၁.၂၀၂၀.	၈	၇	၁၅.	ဖဆလ ၊ ၁၃၊ ၊ တဝိုင် ၃.	၁၅	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း								

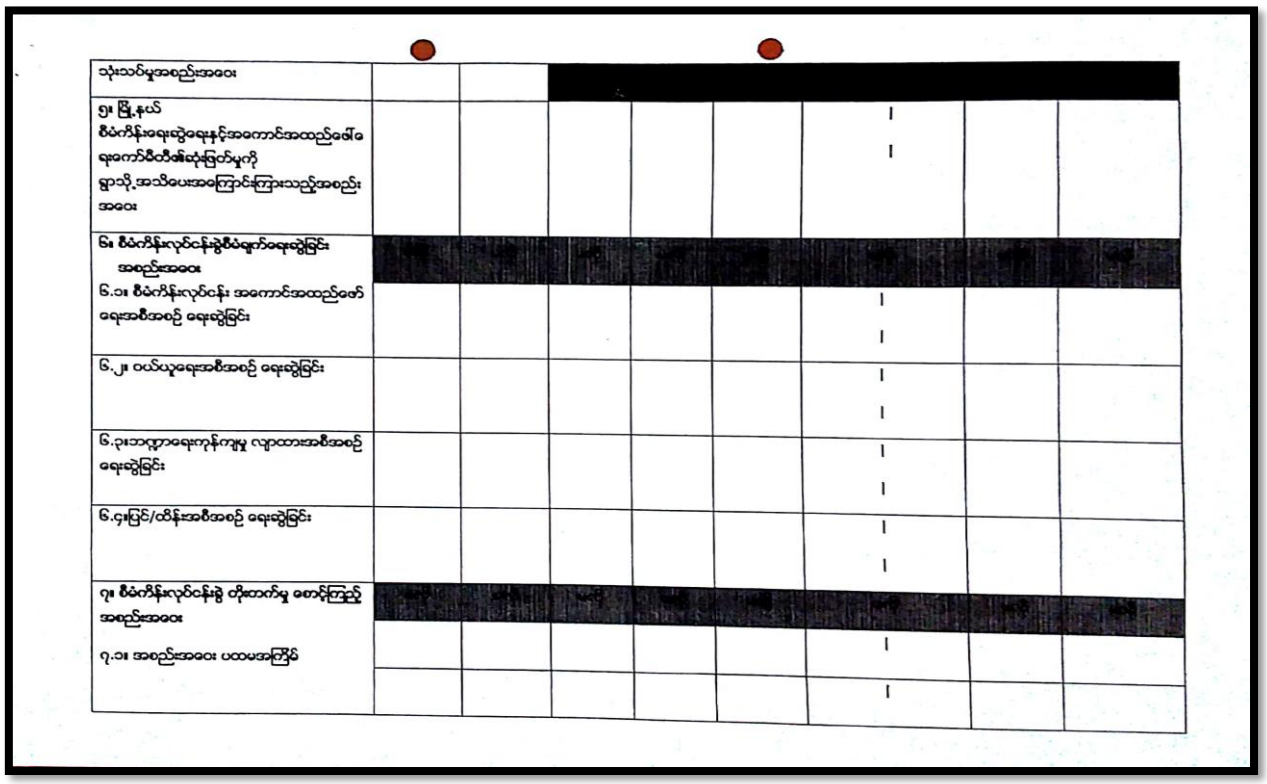


သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်သည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								

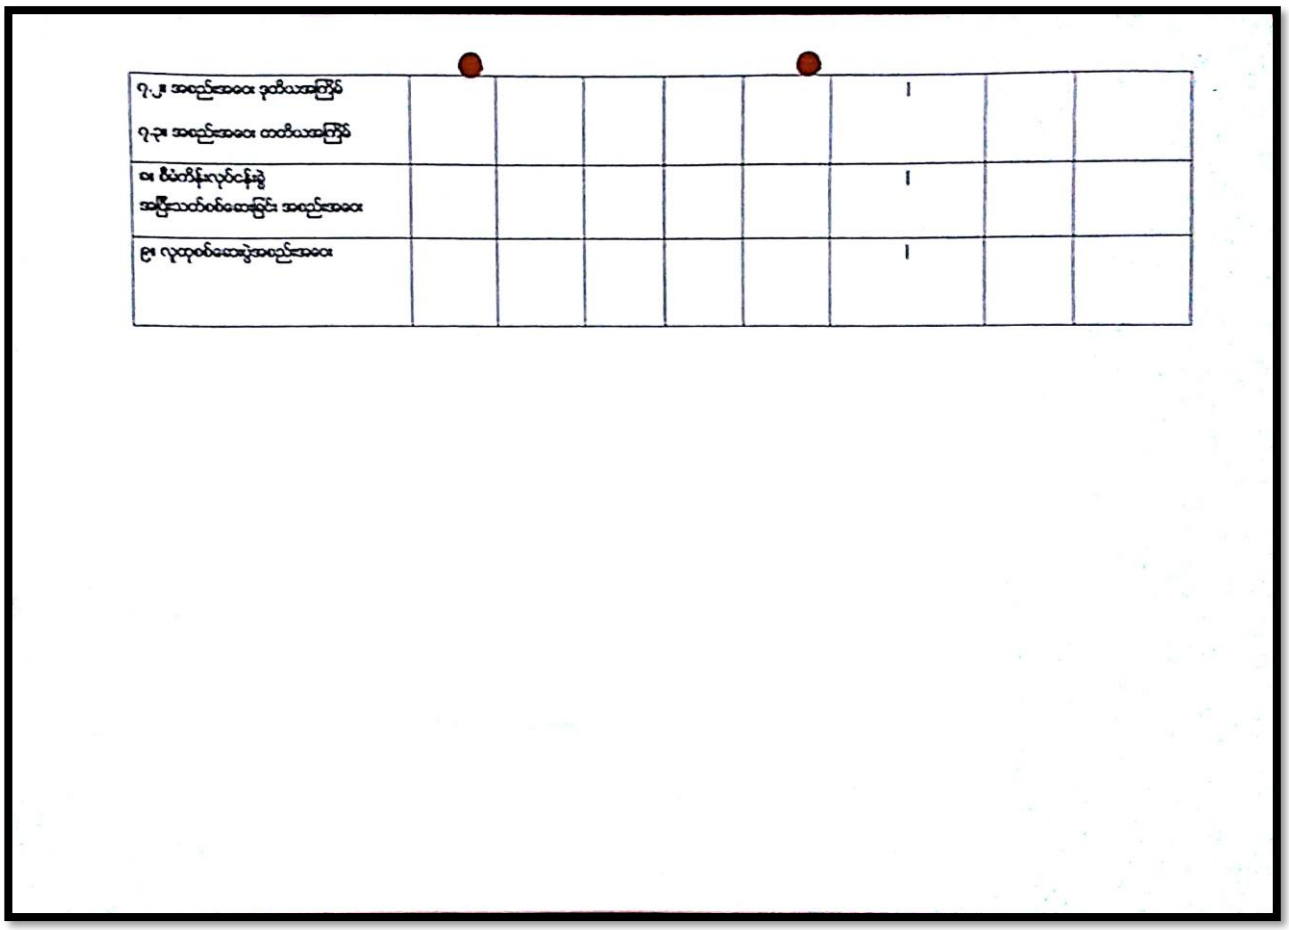

၇.၂။ အရည်အဆင်း ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အရည်အဆင်း တတိယအကြိမ်						၁		
၈။ ပိပံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ အရည်အဆင်း						၁		
၉။ လုပ်ထုံးစံဆေးခွဲအရည်အဆင်း						၁		

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

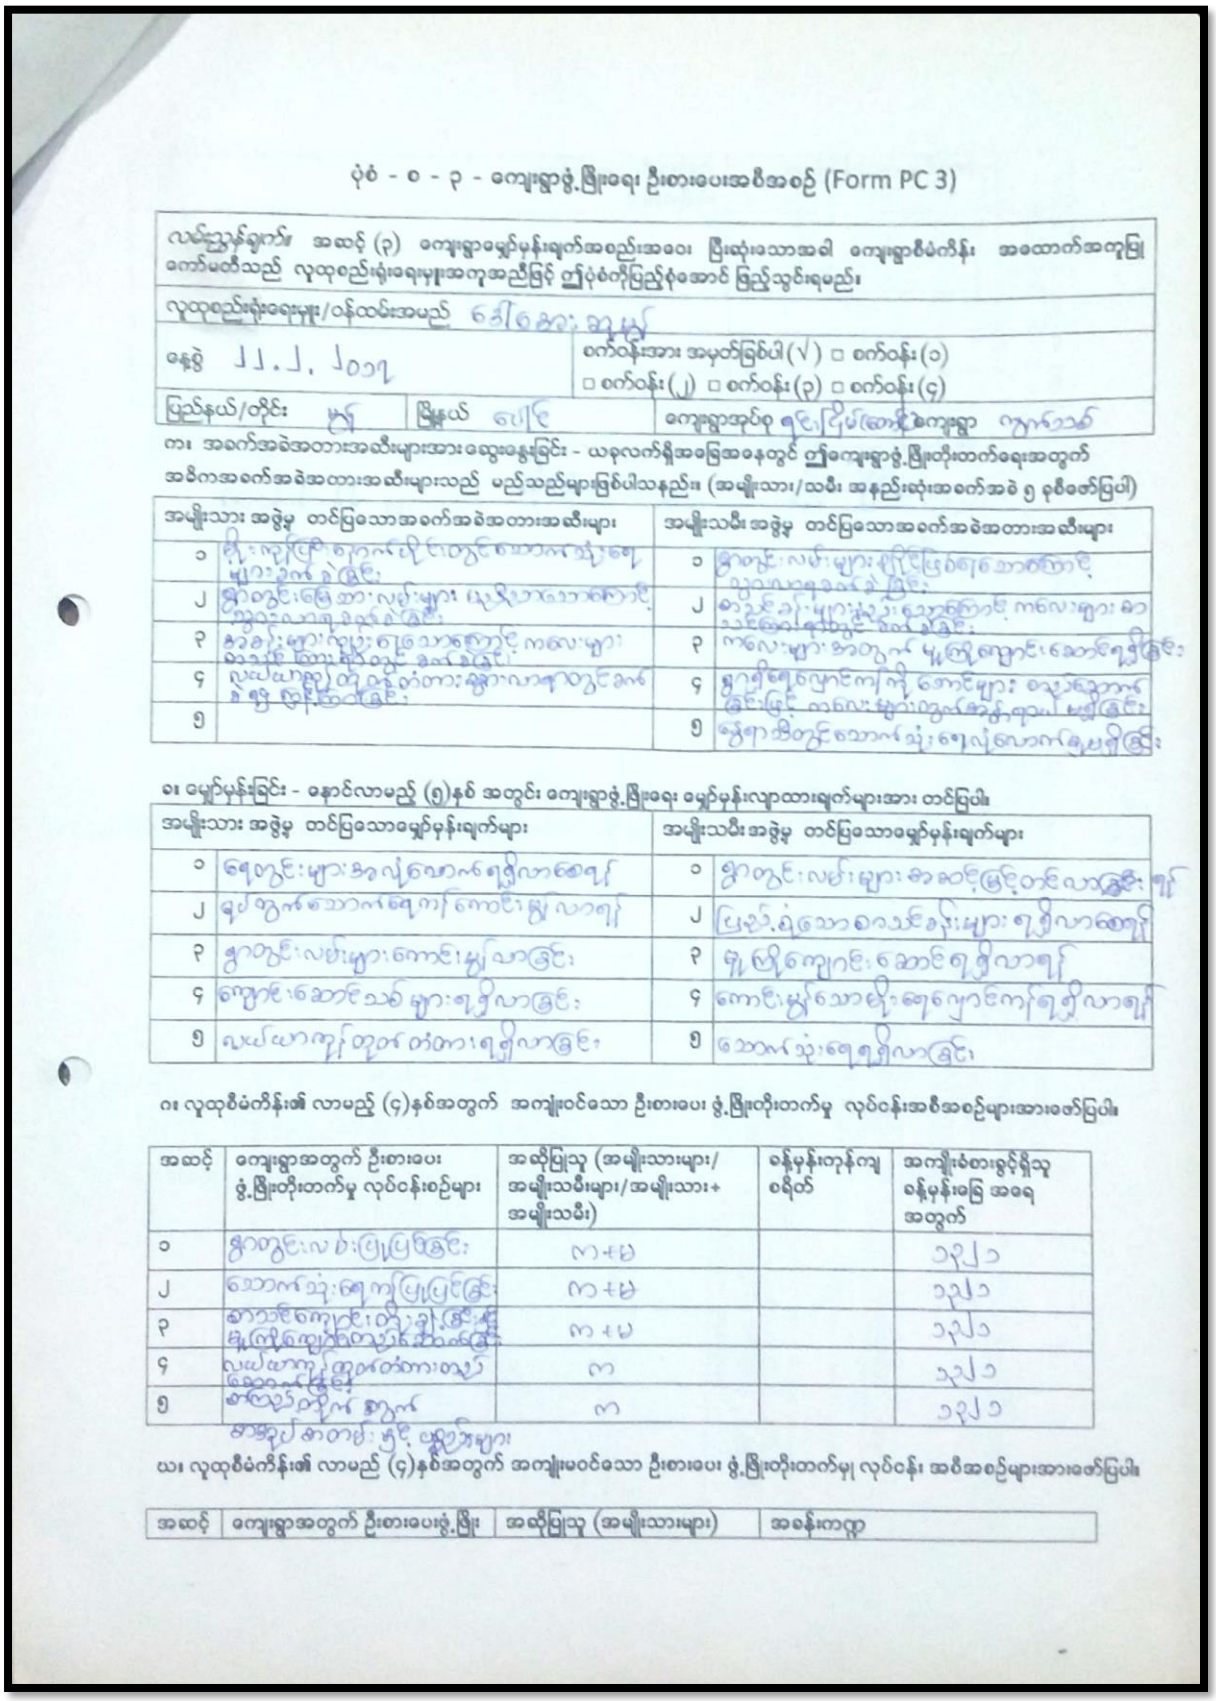

ပုံစံ - ၀ - ၃ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရပုဒ်အကုအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ/ဝန်ထမ်းအမည်		
နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်	မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ရင်းကြိမ်(ဆောင်)ကျေးရွာ ကွာက်သစ်

က။ အဂက်အခဲအတားအဆီးများအား ဖွေးဖန်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအဂက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဂက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အတွဲမှ တင်ပြသောအဂက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အတွဲမှ တင်ပြသောအဂက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာတွင်စားသောက်သုံးစွဲမှုများ ပါဝင်နေခြင်း	၁	ခြံစည်းလုံးမှုများရှိကြပြီးရေစာစားသောက်ရာတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၂	ရွာတွင်းမြေဆီလွှာများ ယုတ်လျော့လာသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၂	စားသုံးရန်များမှုသော သောက်ရေအား ကလေးများ ခေါ်သွားခြင်း ခက်ခဲခြင်း
၃	အခံရန်များ ထုပ်ပေးရောင်းချသောကြောင့် ကလေးများ စားသုံးရန် ခြေးများတွင် ခက်ခဲခြင်း	၃	ကလေးများ အတွက် မူကြိုကျောင်း ခေတ်စားမှုမရှိခြင်း
၄	လူငယ်များတွင် ဝန်ဆောင်မှုတွင် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း	၄	ရွာရှိရေလျှောကို ကောင်များ ချေးသွားကြခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်း
၅		၅	ကွဲပြားမှုတွင် သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - ခနှာင်းလာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသား အတွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အတွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ရေတွင်းများအသုံးပြုလာစေရန်	၁	ရွာတွင်းလမ်းများ အဆင့်မြှင့်တင်လာခြင်း ကျွဲ
၂	မူလတန်းသောက်ရေကျောင်းသွားလာရန်	၂	ပြည့်ဝဆုံသောဓလေ့ခံစားမှုများ ရှိလာစေရန်
၃	ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာခြင်း	၃	ရိုးရိုးကျောင်းခေတ်စားရှိလာရန်
၄	ကျောင်းခေတ်သစ်များရှိလာခြင်း	၄	ကောင်းမွန်သောမိုးရေလျှောကာရှိလာရန်
၅	လူငယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဘား ရှိလာခြင်း	၅	သောက်သုံးရေရရှိလာခြင်း

ဂ။ လုပ်ငန်းစဉ်အကဲဖြတ်ခြင်း - ခနှာင်းလာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းတုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁+၂		၁၃၁၁
၂	သောက်သုံးရေကုန်ပြုပြင်ခြင်း	၁+၂		၁၃၁၁
၃	ကောင်းမွန်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၁+၂		၁၃၁၁
၄	လမ်းများကို တွင်းတစ်ဘားတည်း ဆောက်ခြင်း	၁		၁၃၁၁
၅	စက်လည်ကို တွင်းတွင် ရွာတွင်း အားလုံး အတွက် ဘို့ ပေးခြင်းများ	၁		၁၃၁၁

ဃ။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ လာမည့် (၅)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ)	အခန်းကဏ္ဍ

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်


	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးသိန်း--- လက်မှတ် ---ဦးသိန်း--- နေ့စွဲ ---၁၂-၁-၂၀၂၃---

၁

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

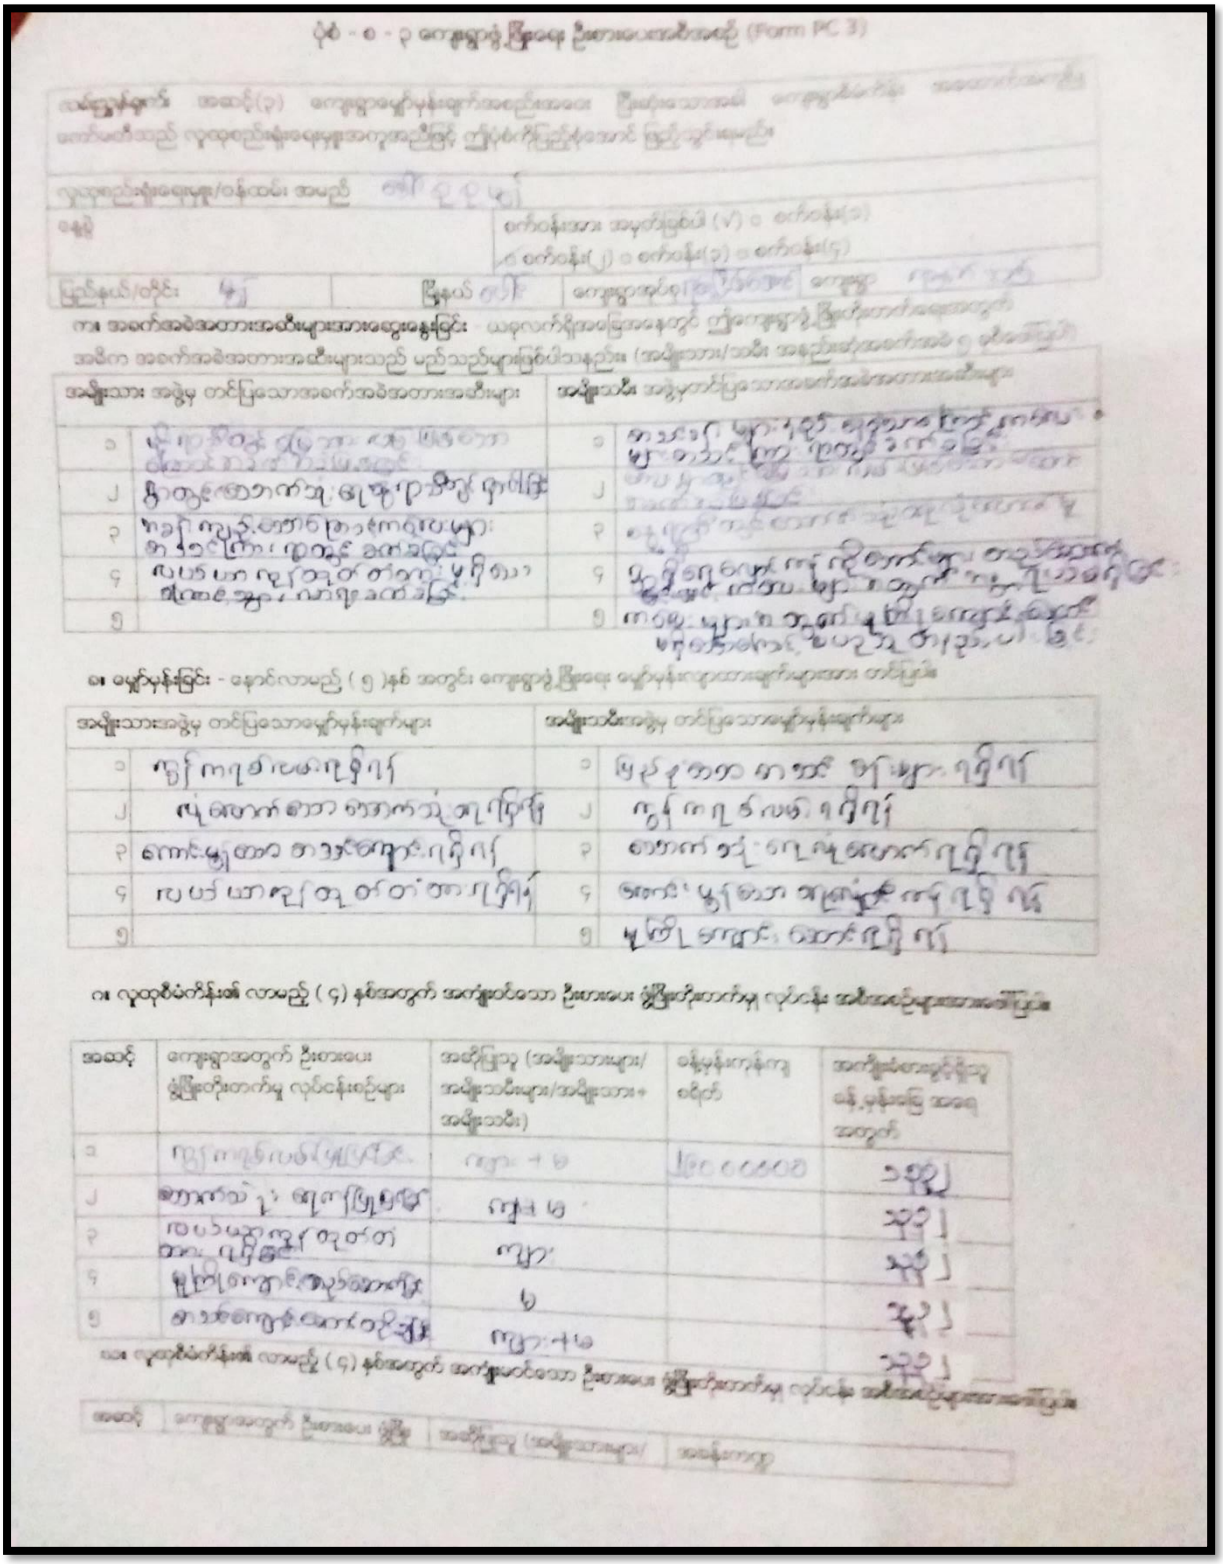


	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ..... လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ ၀၁-၁၁-၁၇

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

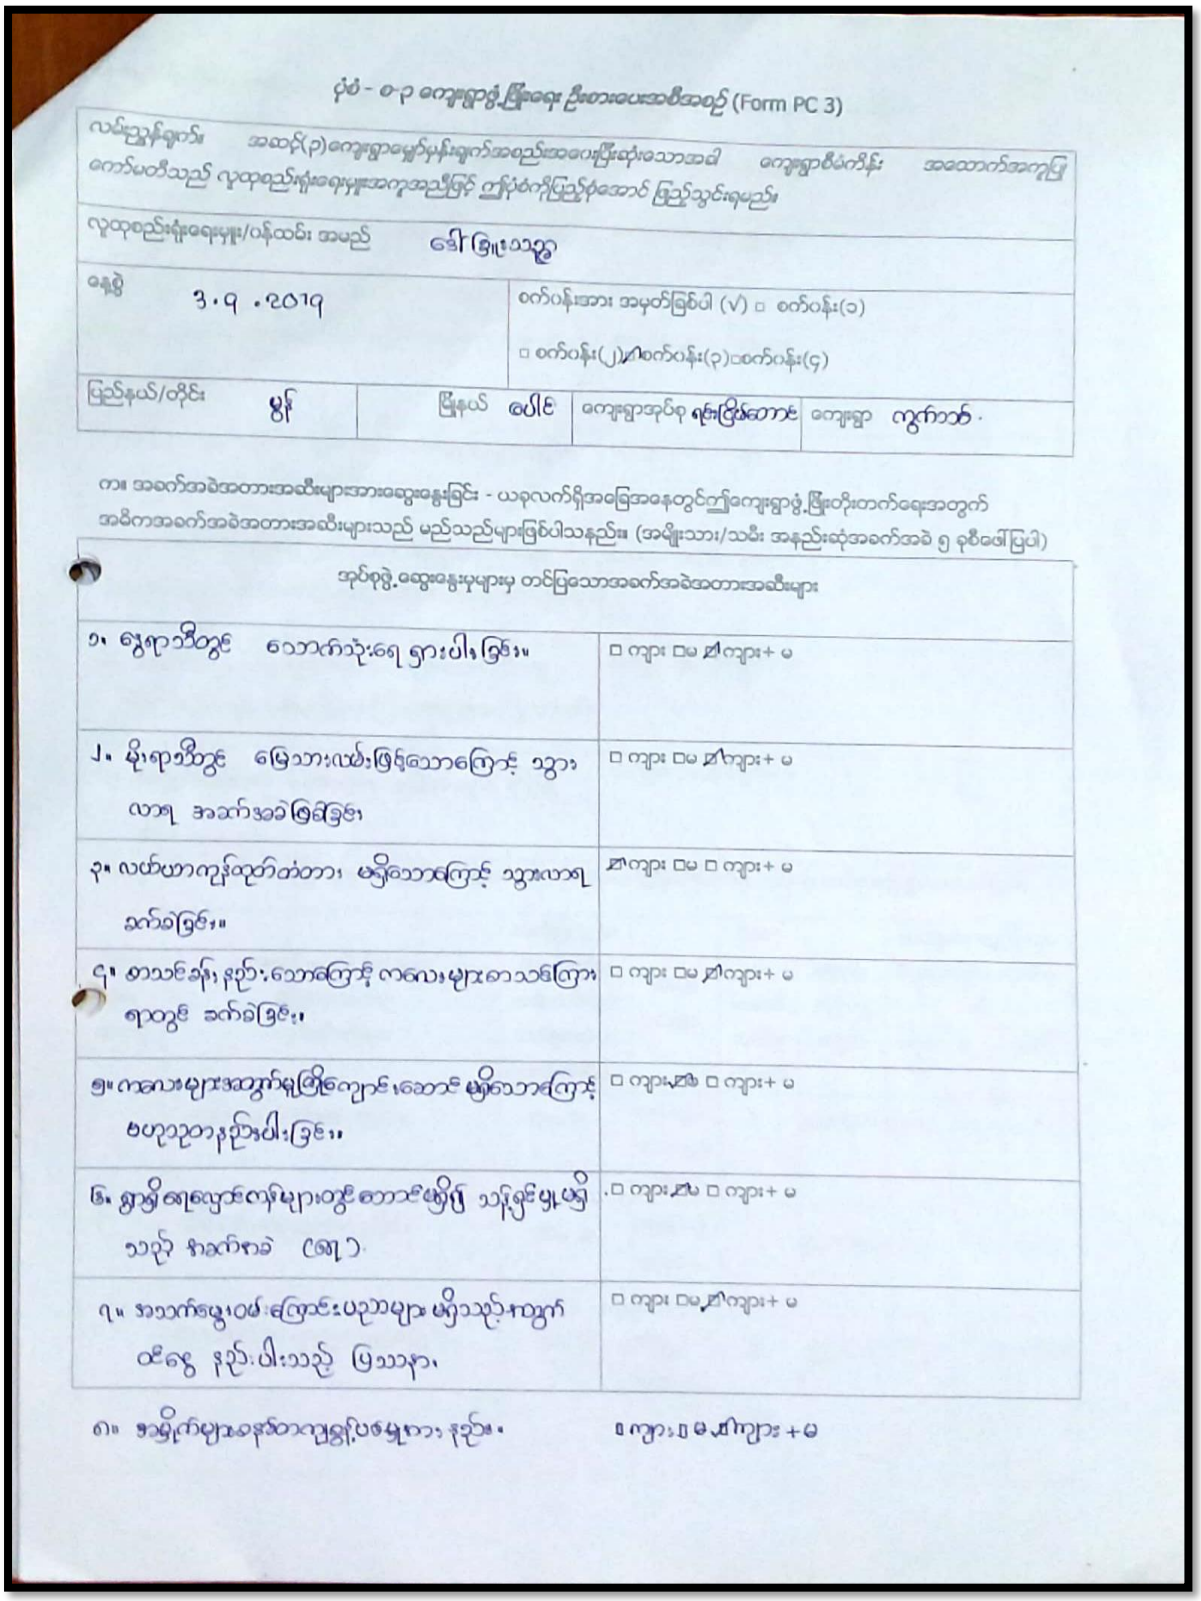

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခေါ်ဖြူးသဏ္ဌာ		
နေ့စွဲ 3.9.2019	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်	ပြည်နယ် ဧရပါဒီ	ကျေးရွာအုပ်စု ရမ်းကြီးအောင်	ကျေးရွာ ကွက်ဘော်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)


အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ရွေ့ရာဒီတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
၂။ မိုးရာဒီတွင် မြေသားလဟာ့ဖြစ်သောကြောင့် ဘွဲ့ဘား လာရာ အခက်အခဲရှိခြင်း၊	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
၃။ လယ်ယာကုန်ထုတ်ဝန်ဘား မရှိသောကြောင့် ဘွဲ့ဘားလာရ ခက်ခဲခြင်း။	☑ကျား □မ □ ကျား+ မ
၄။ စာသင်ခန်း နှစ်၁ သောကြောင့် ကလေးများစာသင်ကြား ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
၅။ ကလေးများအတွက်မူကြိုကျောင်း၊ဆောင် မရှိသောကြောင့် စဟုဘုဝဘုဥာဏ်ပါးခြင်း။	□ ကျား□မ □ ကျား+ မ
၆။ ရွာရှိရေလျှောကန်များတွင် ဘောင်မရှိ၍ သန့်ရှင်းမှုမဖြစ် သည့် နာရောဂါ (၈၂)	□ ကျား□မ □ ကျား+ မ
၇။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများ မရှိသည့်အတွက် ထိုင်ရွေ့ နှဉ်ပါးသည့် ပြဿနာ၊	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
၈။ အခြိုက်များနေခြင်းကြောင့်ပြဿနာ၊ နှဉ်း။	□ ကျား□မ ☑ကျား+ မ

၁။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအရက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ လျှပ်စစ်ဓာတ်မီးသောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုရှိခြင်းမရှိ ၂။ ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိ	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ □ကျား □မ ☑ကျား+မ
၃။ လူနေထုထံတံတားရေတိုးခြင်း၊ပျံ့နှံ့မှုရှိ ရေကြောကြောင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ရှိခြင်း	☑ကျား □မ □ကျား+မ
၄။ မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း၊ကလေးငယ်များ ပညာရေးမဟာဗျူဟာ များမရှိခြင်း	□ ကျား ☑မ □ ကျား+မ
၅။ ရွာလယ်ခန်းတိုးချဲ့ကျောင်းခြောင်များရှိခြင်း၊ ကျောင်းသူ/သား များပျော်ရွှင်စွာသင်ကြားမှုအားနည်းခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
၆။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများထက်လာဘ် အားသိပ်ဖိစီးခွင့်လစ်းရှိခြင်း၊ဝင်ငွေများတိုးပွားခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
၇။ အမှိုက်များကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ခြင်းမရှိ ပိုမိုရှင်းလင်းခြင်းမရှိခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းဖြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	က+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၂၀၀,၀၀,၀၀၀	၆၆၇	၆၇၂	၁၃၃၉
၂	စိမ့်ရေစီးရေဓာတ်ပလုံခြင်း	က+မ	ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး	၂	၉၀,၀၀,၀၀၀	၆၆၇	၆၇၂	၁၃၃၉
၃	သောက်သုံးရေကန်ဖြူပြာခြင်း	က+မ	ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး	၃	၂၅၀,၀၀,၀၀၀	၆၆၇	၆၇၂	၁၃၃၉

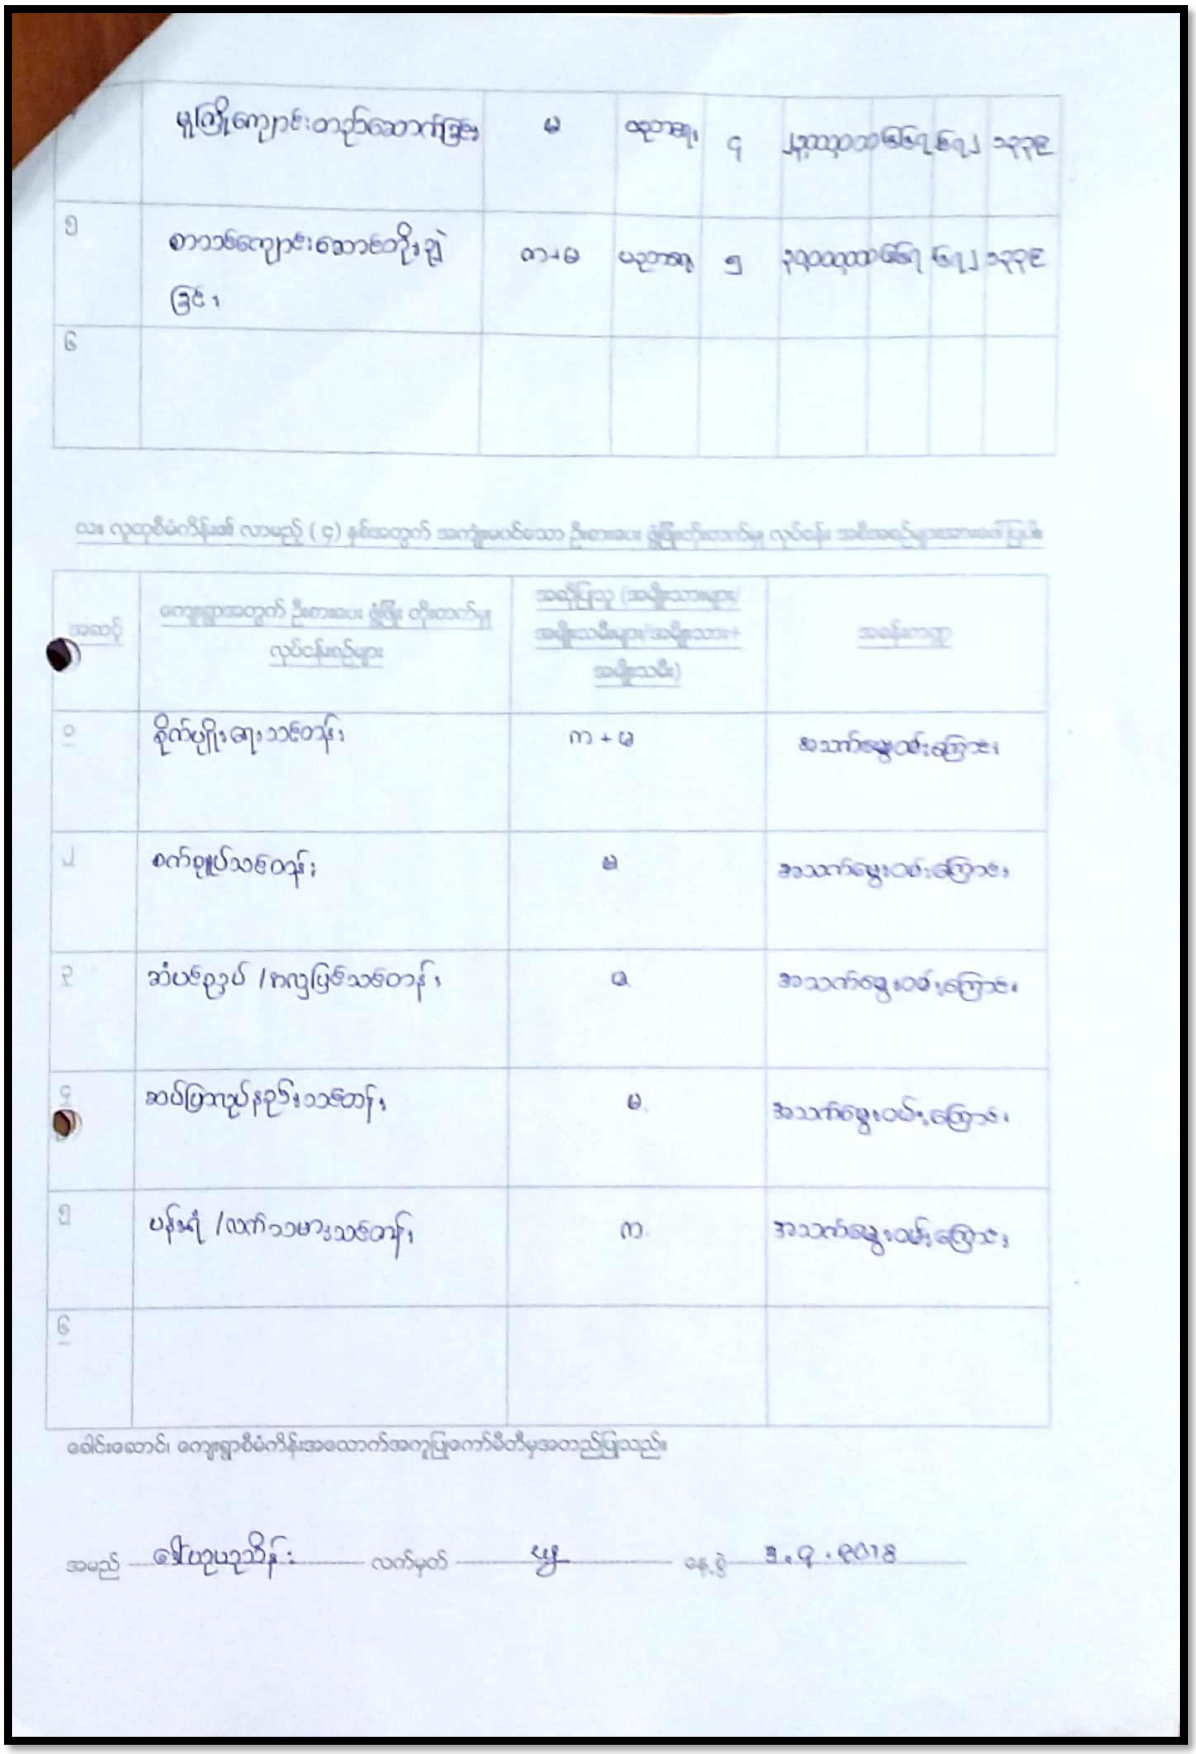

	မှုခင်္ဂိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	မ	ထုတ်ဒါန်း	၎	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
၅	စာသင်ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း	က+မ	မဟာဒါန	၅	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
၆								

လေး လှူဒါန်းမဲ့ကိန်းဆိုး လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း အဆင့်မြှင့်တင်သော ဦးစားပေး ပုံမြိုင်ငံတော်မှ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပုံမြိုင် ငံတော်မှ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အသေးစိတ်
၁	ခိုက်ပျိုးခြံ၊ သင်တန်း	က + မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	စက်ဝှေ့ပြသင်တန်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၃	အံ့ဖွယ်ဝှေ့ / အလှပြင်သင်တန်း	ဏ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၄	အမဲပြားဟင်းနည်းသင်တန်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၅	ပန်းချီ / လက်ဝေမာ့သင်တန်း	က	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၆			

ဖော်ပြခဲ့သော၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအသေးစိတ်အကျဉ်းချုပ်မှာ မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဟုပဉ်သိန်း လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ ၃၀.၄.၂၀၁၉

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အဖွဲ့ကအကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းဝေးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းဝေးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခြံ့ဟာဌာ	
ရက်စွဲ ၃၀.၅.၂၀၁၇.	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်	မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ရင်း- ငြိမ်းတောင်	ကျေးရွာ ကွက်သစ်.

က။ အစက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအစက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအစက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ မိုးရာသီတွင် မြေသားလမ်းဖြင့်သောကြောင့် ဘွားလာရ အဆက်အခဲဖြစ်ခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
၂။ မိုးရာသီတွင် ရေစွေးများ၊ ရေကျော်၍ ကုလားမှ ကျိုခြင်း၊ အဆက်အခဲ။	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
၃။ နွားရှိ၊ ဆရာကောင်းများတွင် တောထမရှိ၍ ဘုန်းကြီးမှုမရှိသည့်အဆက်အခဲ (၄ရွာ)	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
၄။ နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
၅။ စားဝတ်နေရေးနည်းဆောင်ကြောင့် ကလေးများ အာဟာရကြောင့်ဖြစ်သောအဆက်အခဲ။ ☑ကျား □မ ☑ကျား+မ	
၆။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာမရှိသည့်အတွက် တခြားနည်းပါးသည့်ပြဿနာ။	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
၇။ အမျိုးကောင်းများ စုစုစည်းလျက် ရွှေ့ပြောင်းမှုအားနည်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
၈။ ကျော်ပဘာ ကျွန်တုတ်တံကား မရှိသောကြောင့် ဘွားလာရ အဆက်အခဲရှိခြင်း။	☑ကျား □မ □ ကျား+မ

၈။ ဖမ်းမှုနှုန်းခြင်း- ဇနာင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖမ်းမှုနှုန်းလျော်ထားရွက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဝင်များမှ တင်ပြသောအဓိကအဝဲအတားအဆီးများ	
၁။ ရွာတွင်း လမ်းများကောင်းမွန်လာမည်။ ၂။ ရေကြီးရေလျှံမှုများလျော့နည်းလာမည်။	□ များ □ အနည်းငယ်များ + မ □ များ □ အနည်းငယ်များ + မ
၃။ ကုန်ထုတ်ထုတ်ကုန်များရှင်းလင်းပြီး ဈေးပေါ်း ရောင်းချနိုင်လာမည်။	□ များ □ အနည်းငယ်များ + မ
၄။ ကျေးရွာသားဖြစ်ရေးကိုးများ သန့်ရှင်း ဘယ်ရပ်ရွာကြီး မွန်လာပြီး ရန်ပဟက်တိုးရေများလုံလောက်လာမည်။	□ များ □ အနည်းငယ်များ + မ
၅။ အသက်ဆွေးဝမ်းကြောင်း ပညာများလွယ်ကူလာ၍ အရည်အသွေးအဆင့်မြင့်မားလာမည်ဖြစ်ပြီး ထင်ရှားတိုးတက်လာမည်။	□ များ □ အနည်းငယ်များ + မ
၆။ အမျိုးသမီးများခေတ်နှင့်တစ်လျှောပြိုင်ဆိုင်နိုင်ရေး မဟာဗျူဟာတို့ ရရှိလာမည်။	□ များ □ အနည်းငယ်များ + မ
၇။ မူလတန်း တိုးတက်ကျောင်းသားဦးရေများလာ၍ အခြေခံကျောင်းသား /သူများဆုံးရှုံးရခြင်းမှာ ပညာဘာသာကြောင့်ဖြစ်ပါ	□ များ □ အနည်းငယ်များ + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်းအရ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်ခံသော ဦးစားပေး ရွှေ့ပြောင်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဇယားပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ရွှေ့ပြောင်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အထိုက်သြသူ(အ မျိုးသား များ/ အမျိုးသမီး များ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ရန်ပုံနှုန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဦးရေ အမှန်အခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊	၈ + ၈	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊	၁		၆၆၇	၆၇၂	၁၃၃၉
၂	သောက်သုံးအိုးကန်ပြုပြင်ခြင်း	၈ + ၈	ရေနှုံသန့်ရှင်းရေး	၂		၆၆၇	၆၇၂	၁၃၃၉
၃	လယ်ယာကုန်ထုတ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း၊	၈.	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၃		၆၆၇	၆၇၂	၁၃၃၉

၄	ခြံမြစ်ခဏ်းရေသွယ်ယူခြင်း	က+ဗ	ရှေးဦးသို့ကြွေးချေး	၎		၆၄၇	၆၇၂	၁၃၃၉
၅	ကောင်းစေ့ကျောင်းခေါင်းတိုင်းတိုးချဲ့ခြင်း	က+ဗ	ပဉ္ဇာချေး	၅		၆၄၇	၆၇၂	၁၃၃၉
၆	ဒိုးမြောင်ရောင်းခံမြေကွက်သွယ်ပေးခြင်း	ဂ+ဃ	ရှေ့ဦးသို့ကြွေးချေး	၆		၆၄၇	၆၇၂	၁၃၃၉


သေး လူထုစီမံကိန်းအဆိုလာရသည့် (၄) နှစ်အထက် အတန်းမပင်သော ဦးစားပေး ပြဿနာတိုထောက်ရှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအထွက် ဦးစားပေး ပြဿနာ တိုးထောက်ရှု လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းများ	အကျိုးခံသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက်သွယ်သင်တန်း	ဗ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	ဆံပင်ညှပ် / အလှပြင်သင်တန်း	ဗ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၃	ဆည်ကြာဟုပ်နှည်းသင်တန်း	ဗ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၄	ပန်းရံ / လက်သမား သင်တန်း	က	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၅			
၆			

ဖော်ပြအဆောင်း ကျေးရွာစီမံကိန်းအတောက်အကူပြုတော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ခေါ်ပဉ္ဇာဦးဦးနိုင် လက်မှတ် ပြ ရက် ၁၀.၅.၂၀၁၇

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

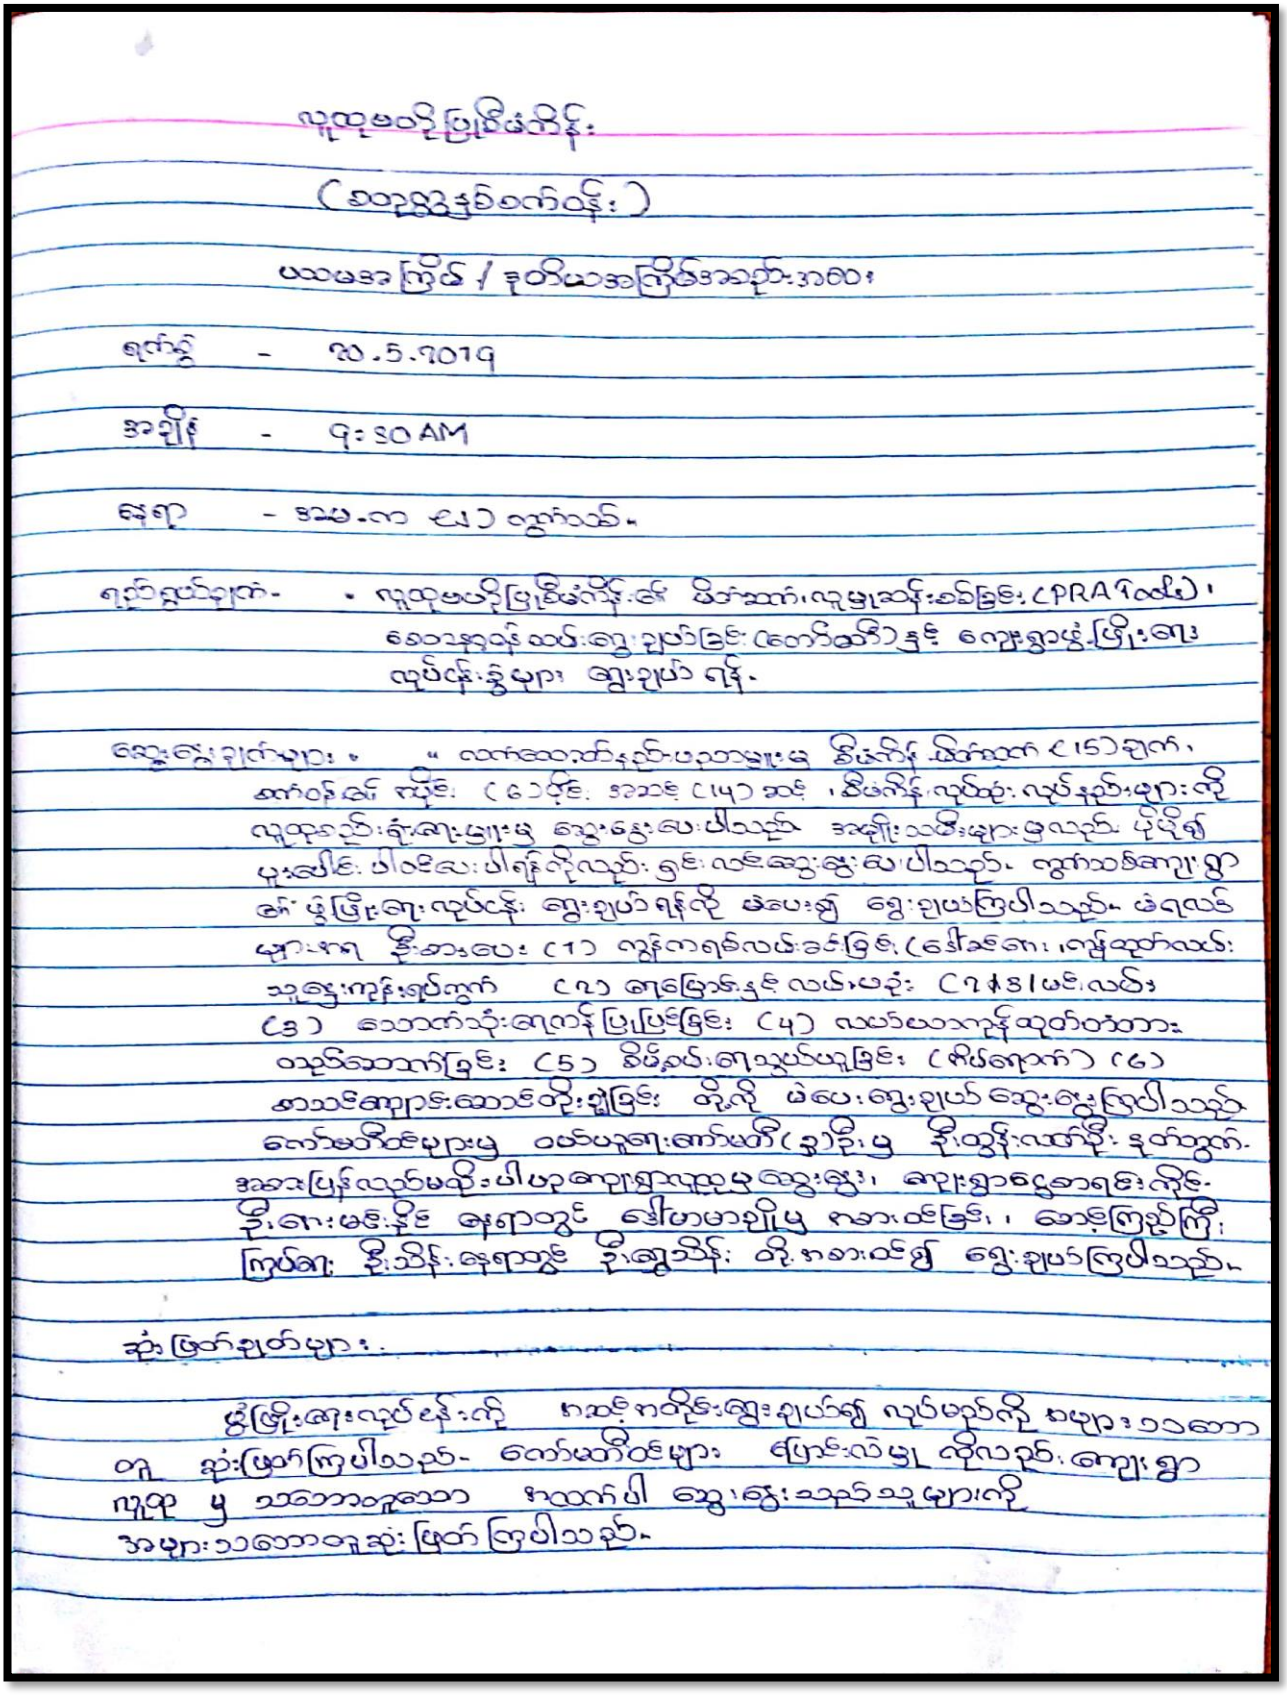

လူထုစုဝေးပြုလုပ်ခဲ့ရန်း

(ဆောင်ရွက်ခဲ့ရက်ဝန်း)

ယယမခ ကြီးပင် / နုတိယအကြိမ်မြောက်အသုတ်း အဝေ၊

ရက်စွဲ - ၃၁.၅.၇၀၁၄

အချိန် - ၇း၃၀ AM

နေရာ - ၃၂၈-က၊ ၎၂) လွှက်သစ်။

ရည်ရွယ်ချက်- • လူထုစုဝေးပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း၏ ဖိတ်ကြား၊ လူမှုဆက်ဆံရေး (PRA ၇ ထပ်)၊ ဒေသခံတွင်းသန်းထပ်း ချွေးချွေးခြင်း (တောင်ကြီး) နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ချွေးချွေးရန်။

ဆွေးနွေးချက်များ။ " လက်ဆောင်းနှင်းပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ကြောင်း ဖိတ်ကြား ၎၁၅) ဦးက၊ ဆက်ဝန်းရေး ကြိုးစား ၎၆) ဦး၊ အသက် ၎၄၅) အထိ၊ ဆိုးကြိုးလူငယ်များ၊ လယ်နှင်းများကို လူထုဥပဒေရဲ့အရေးပြုမှုများ မည်းနွေးလေးပါသည်။ အရွယ်ကြီးသမီးများဖြစ်သည်။ ပိုပိုမို ပူးပေါင်း ပါဝင်လေးပါရန်ကိုလည်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးလေးပါသည်။ ကွက်သစ်အကျိုးရှိ အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ချွေးချွေးရန်ကို ဖဲပေးခဲ့ ချွေးချွေးကြပါသည်။ ဖဲရလဒ်များမှာ ၁) ဦးစားပေး ၎၇) ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း ၎ဒေါ်ခင်ရေး၊ ကျွန်ုပ်တို့လမ်း သူ့ရွေးကွန်းရပ်ကွက် ၎၇) ရာခြောက်နှင်းလမ်းမဆုံး ၎၇၀၀/ပေ/လမ်း ၎၃) သောက်သုံးရေကန်ပြုပြင်ခြင်း ၎၄) လမ်းမသာကွန်ဆုတ်တံတားဝန်းသောက်ခြင်း ၎၅) ဆိုးဆမ်းရေသွယ်ယူခြင်း ၎ကိုယ်ရောက်) ၎၆) အာသင်ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း တို့ကို ဖဲပေးချွေးချွေးကြပါသည်။ ကော်မတီဝင်များမှ ဝတ်ပန်ရေးကော်မတီ ၎၃) ဦး မှ ဦးတွန်းထက်ဦး နုတ်ထွက်။ အစားပြန်လည်မဆိုးပါဟု ကျေးရွာလူထုမှ ဆွေးနွေး၊ ရွေးချယ်ခဲ့ရန်ကိုဦး ဦးရောမင်းနိုင် နေရာတွင် ဒေါ်ဟာမာစုပြုမှ စာရေးဝင်ခြင်း၊ ဆောင်ကြဉ်ကြိုးကြပ်ရေး ဦးသိန်းနေရာတွင် ဦးချွေသိန်း တို့ စာရေးဝင်ခြင့် ချွေးချွေးကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို စာဆင့်ကဒိုင်းချွေးချယ်၏ လုပ်မည်ကို စဖျာ၊ ၁၁ တောတို့ ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ ရပြောင်းလဲမှု ထိုလည်ခြင့်၊ ကျေးရွာလူထု မှ သဘောတူသော အသက်ပါ ချွေးချွေးသည့်သူများကို အဖျာ၊ ၁၁ တောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများမှ အမျိုးသား - ၃၇ ဦး၊
အမျိုးသမီး - ၅၃ ဦး တို့ တက်ရောက်ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးကို နှုတ်ခွန်း - 3:50 PM တွင် အောင်မြင်စွာ ရုတ်သိမ်းပါ
သည်။

နှင့်

မှတ်တမ်းတင်သူ


ဒေါ်ခင်လေးနွယ်

ဆောက်ခန်ထမီး

ဖိုင်ကူးကို ကြော်ငြာသင်္ကေတ

ကော်မတီဝင်မှ လက်ခံ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

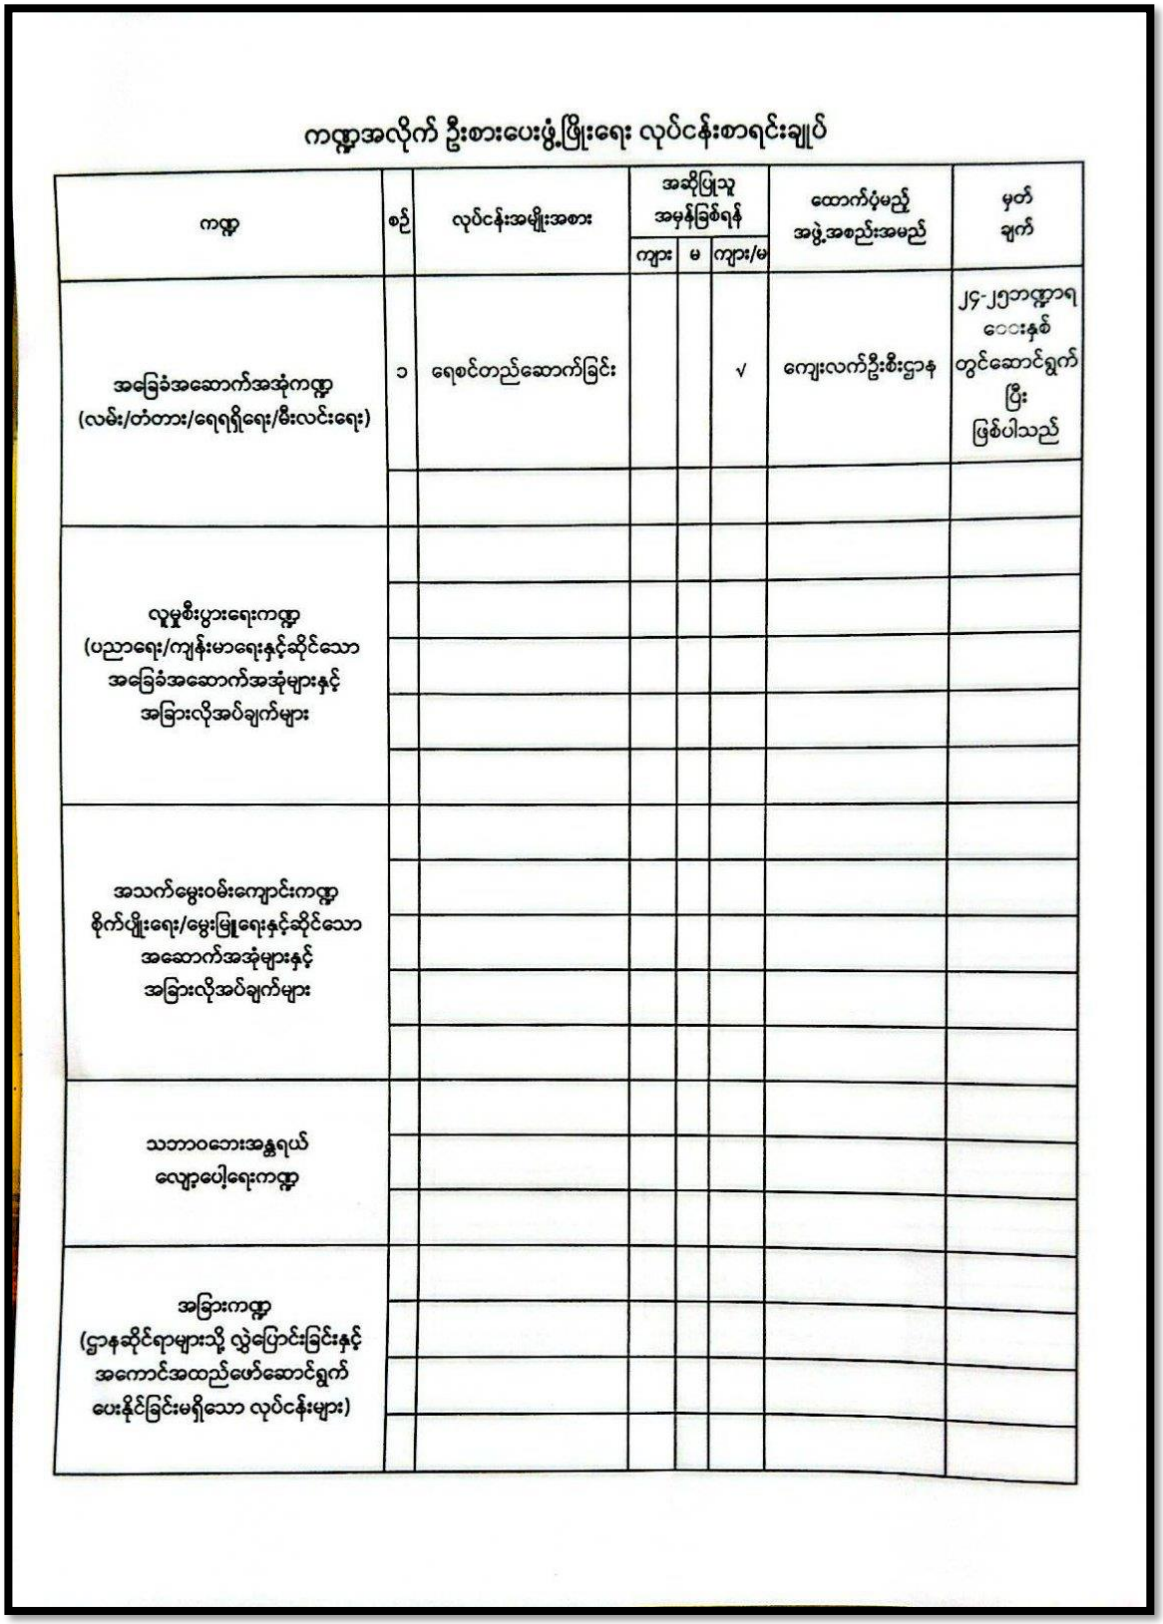

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစာရင်းချုပ်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ အမှန်ခြစ်ရန်			ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်းအမည်	မှတ် ချက်
			ကျား	မ	ကျား/မ		
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း			√	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၄-၂၅ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တွင်ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်
လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ							
သဘာဝဘေးအန္တရယ် လျော့ပေါ့ရေးကဏ္ဍ							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)							
